



Factura

SERIE:

FOLIO: 322

FECHA: 6/12/2017 13:35:30

Documento Válido

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

EAGJ660918713 25 No. 7105 AEROPUERTO,
CHIHUAHUA 31380
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: 25 7105, AEROPUERTO, 31380, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Concepto / Descripción
ESTIMACION No 5

Valor Unitario

Importe

OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA
DELNORTE A SUR A PARTIR DE LA AV GUILLERMO PRIETO LUJAN 0+000-
0+712.
CONTRATO 110/2017

DESCUENTOS
0.2% I.C.I.C \$ 2,586.20
0.2% D.I.F \$ 2,586.20
SUMA DESCUENTOS \$ 5172.40

RESUMEN
SUMA DE ESTA ESTIMACION \$ 1,293,102.34
AMORTIZACION ANTICIPO \$ 387,930.70
DESCUENTOS \$ 5172.40
SUBTOTAL \$ 899,999.24
IVA \$ 144,827.46
SALDO NETO PARA PAGO \$ 1,044,826.70
CON LETRA (UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS OCHOCIENTOS
VEINTISEIS PESOS 70
/100 M.N)

905,171.64

905,171.64

Importe con letra

UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 10/100 M.N.

Método de pago: Cheque nominativo

Cuenta de pago: NO IDENTIFICADO

SUBTOTAL: 905,171.64
I.V.A.: 144,827.46
TOTAL: 1,049,999.10



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de Emisión: 25 7105, AEROPUERTO, 31380, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO
Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Serie del Certificado del emisor: 00001000000403506616
Folio fiscal: 4B53CF21-9BE6-42CA-A84F-1FCCA772414D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 6 2017 14:35:35

Sello digital del CFDI

kwGJhLDIRSeJIGnSkL12fb8qR/dkFJ5CVFSDVjDC+o3pdFzH1s1cYBx5KYm1C0ig60hr50+Doe4ryN1Pg4
6/90HJeVeQ2erVazyr5Tos18aGYWOa6vtRdMNgblZkELvbGVuYJIQpJse2wnk/5rvis0+Hdn1jFSHa9uStx0o
BwMvrl1ETf/dhegrpuH2K2PhY0R3aA7Z013d2aSBt/twhEdFYrsnH30VvV6x6-8HNaAJzo000j5F0GzHfP0XNCUa
JsB2nR9EgJXSPWQnsDKto91VomPockys0IExSLi3inbj8Ere87hKzSTZdqCwuanUuDr8f327R0wS16SSQ==

Sello del SAT

FaouZHD4HT08nhgX+mzUaQnicmEvd/foijAg20IAZipr7sahUxtA16yk48J00Qag6a4ryb9Ay7UOEh2
f3gCKfE1f6K2J5X2SHKbJ2CHbcUHebQNm:Or+239+YmH4HW3ssom2dU143nK76v21+c1nsSwJeeEvWos
ANT1qn0i54eDnx:zakQy80T2c78eJQJN31S6KJ/PEf19vqrCdrG5N2S1TGMegrT+EqQAY3936C3QJfY

mSpLjNqccqd3eLTFP+KSYfzC5H6a8ccwFf28ee8sKcc69cj2NNE6CxlzaY9HoIXA0zIcPskEtrRg3FUI
/eUp0ALl2n2n1kDhuXQGSv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E53CF21-9EE6-12CA-A54F-1FCCA772414D|2017-12-06T11:35:35|kW53BLDIR8eJI0p3K
L12fb8qbE/di:FJ5CVF5DVJEC+c2pdPzh1sio7Bdx5KYmuk1Cc1g6ohz5O+DooJkyNIFg46/30HJzVeQ2
erVazyr5Tce18agYWOa6vtRdMNgnl3RDLwb6VuYJlQxpJe2wnKc5rwiSo+Hdn1jFSNa8Su8tx0cBwMvr
1ETP/dheqipuMAE2FHYOPmNA72015d2aWbt/twhEdPYrsN3CVuV6x6+8HWaA7z0600jS20OzXPpXNCU
sdsE2nR9FgJXSPRQnsDKfo9iVumPockys0IEXSLFSinbj8Ere87hKzST2dgc4WuaHUuDr8I317R3Msws
1qS5Q==|00001000000404486074||

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor

EAGJ660918T13

Folio fiscal

4B53CF21-9BE6-42CA-A84F-
1FCCA772414D

Total del CFDI

\$1,049,999.10

Nombre o razón social del
emisor

JOEL OSCAR ESPARZA
GONZALEZ

Fecha de expedición

2017-12-06T13:35:30

Efecto del comprobante

ingreso

RFC del receptor

MCI651010V22

Fecha certificación
SAT

2017-12-06T14:35:35

Estado CFDI

Vigente

Nombre o razón social del
receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

MXS0810247C0

Verificar CFDI

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 110/2017	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712 .	ESTIMACIÓN No. 5	\$ 6,435,024.11 CON IVA
REFERENCIA: LATITUD 28° 44' 12.30" N LONGITUD 106° 9' 18.71" O	PERÍODO EJEC. 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017	
UBICACIÓN: CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712 .	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,499,998.71 CON IVA
CONTRATISTA: ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 2,808,873.93 CON IVA
RFC EAGJ-660918-TI3	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 4,308,872.64 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
EXTRAORDINARIOS	\$ 1,293,102.34	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 1,293,102.34	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$ 2,586.20
0.2% D.I.F.	\$ 2,586.20
SUMA DESCUENTOS	\$ 5,172.40




RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 1,293,102.34
AMORT ANTICIPO	\$ 387,930.70
SUB-TOTAL	\$ 905,171.64
I.V.A.	\$ 144,827.46
TOTAL	\$ 1,049,999.10

(CON LETRA)

(UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 5,172.40
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 1,044,826.70

 AUTORIZO ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS RESIDENTE D.O.P.M	 ELABORO ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ CONTRATISTA
Vo. Bo.  ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	REVISO  ING. EDNA LIZETTE DEL RÍO SIGALA JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.  ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

30 de noviembre de 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ **1,044,826.70**
 (UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 70/100 M.N.) COMO PAGO A LA
 ESTIMACIÓN NUM. 5 CONTRATO No. 110/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ **6,435,024.11**
 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
 CONTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMÉRICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO
 LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712 .

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ **1,293,102.34**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ **387,930.70**

SUBTOTAL	\$	905,171.64
IVA	\$	144,827.46
TOTAL	\$	1,049,999.10

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	2,586.20
D.I.F. DEL 0.2%	2,586.20
SUMA	5,172.40

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 6,435,024.11
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 2,808,873.93
ESTA ESTIMACION	\$ 1,499,998.71
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 4,308,872.64
POR EJERCER	\$ 2,126,151.47

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,930,507.23
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 842,662.19
ESTA ESTIMACION	\$ 449,999.61
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,292,661.80
POR AMORTIZAR	\$ 637,845.43

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 4,842.88	\$ 4,842.88
ESTA ESTIMACION	\$ 2,586.20	\$ 2,586.20
ACUMULADO ACTUAL	\$ 7,429.08	\$ 7,429.08

R E C I B I M O S

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ.
 EAGJ-660918-TI3


OBRA: CONTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMÉRICANA UBICACIÓN CARR. PANAMÉRICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR No. CONTRATO: 110/2017 DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO ESTIMACIÓN No. 5 LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712 .


CONTRATIST. ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ. PERÍODO: 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

EXTRAORDINARIOS **1,293,102.34**

SUBTOTAL	1,293,102.34
I.V.A.	206,896.37
TOTAL	1,499,998.71


POR EL CONTRATISTA
ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ


POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV.
GUILLERMO PRIETO LUJÁN. 0 + 000 - 0 + 712.

UBICACIÓN CARR. PANAMÉI No. CONTRATO: 110/2017

ESTIMACIÓN No. 5

CONTRATISTA:

ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ.

PERIODO: 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

No.	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO			VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA EXTRAORDINARIA

EXT-09	Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 8 cms. a base de asfalto grado PG 76-22 modificado de espesor, compactada al 95% de su P.V.M.M. y T.M.A. de ¾". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	0.00	5,746.10	0.00	5746.10	\$225.04	1,293,102.34
								1,293,102.34

POR EL CONTRATISTA

ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA /

CONTRATO: 110/2017		TRAMO:	
OBRA: CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA		ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	
No DE ESTIMACION: 5		PERIODO: NOVIEMBRE DE 2017	

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		
EXT-09	PIEZAS	LONG	ANCHO	SUBTOTAL
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 8 cms. A base de asfalto grado PG 76-22 modificado de espesor, compactado al 95% de su PVMM y TMA DE 3/4". Incluye: materiales, mano de obra herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
A	0+152.84 A 0+247.18	94.34	7	660.38
B	0+247.18 A 0+290.00	42.82	7.93379	339.72
C	0+290.00 A 0+629.00	339	14	4746.00
D				
E				
F				
TOTAL =				5746.10


CROQUIS

SE ANEXA CROQUIS

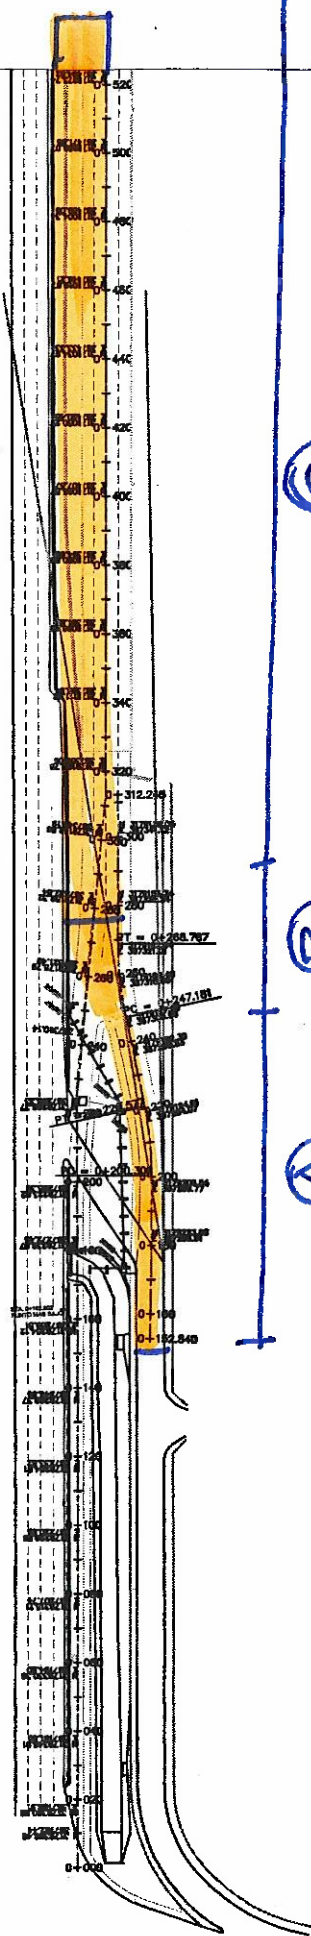
VOLUMEN A PAGAR

5746.10


 RESIDENTE D.O.P.M.
 ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS


 ING. JOEL OSCAR ESPARZA
 CONTRATISTA

CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA
DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA A. GUILLERMO PRIETO LUJAN 0+000-0+720

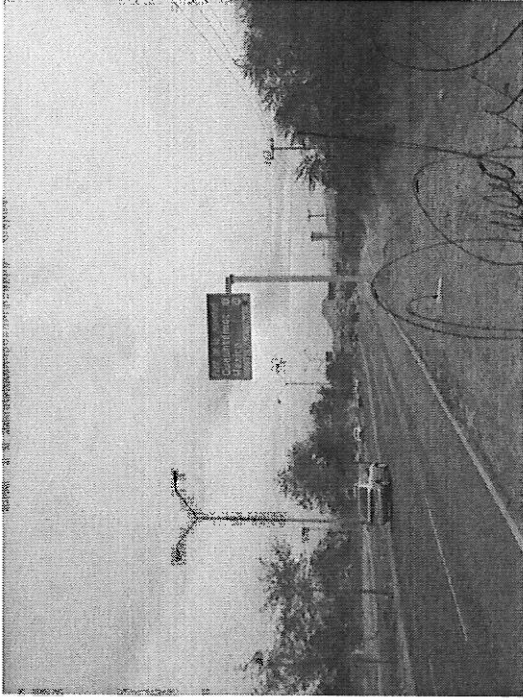
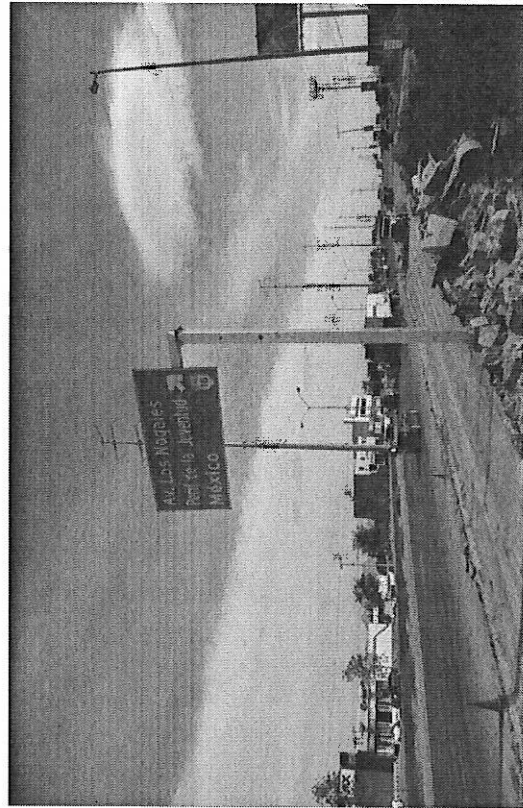


Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN 0+000-0+712





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

OFICIO No. D-4080/2017

28 de noviembre de 2017

**ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZÁLEZ
P R E S E N T E.-**

Con relación a su Escrito S/N de fecha 27 de noviembre del presente, en el que solicita la reconsideración del precio extraordinarios No. EXT-09 de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARRETERA PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJAN 0+000-0+712 DE ESTA CIUDAD", que al amparo del contrato No. 110/2017, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisado, analizado y conciliado con su representada, se autoriza el precio unitario reconsiderado y que se especifica a continuación:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-09	Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 8 cms, a base de asfalto grado PG 76-22 modificado de espesor, compactada al 95% de su PVMM y T.M.A. de 3/4". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	7200	M2	\$225.04

Quedando sin efecto el precio extraordinario autorizado mediante mi similar No. D-3925 de fecha 16 de noviembre de 2017.

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$1'620,288.00 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edna Lizette Del Rio Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Arq. Jorge Palacios Ceballos.-Residente de Obra.
C.c.p.- Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gcn*

28-11-2017
