



CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CDE100810UF7
Privada de García Valdéz #1311
Colonia San Felipe IV Tel. (614) 414-1415
Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31203
construcciones_eco@hotmail.com

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.

Factura

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: MCI651010V22

Fecha

13/11/2017

Folio

FE85

Condiciones

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESC LAVITUD Y AV. LOS NOGALES ESTIMACION NUMERO 1 (UNO) SEGUN CONTRATO NUM. 135/2017		1	178,947.52		178,947.52

FIRMA DEL CONTRATISTA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$255,639.32
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$76,691.80

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

0.2% C.M.I.C \$511.28

0.2% D.I.F. \$511.28

SUMA \$1,022.56

NETO A RECIBIR \$206,556.57

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|324330F1-4516-1242-9B67-91D41398949B|2017-11-13T14:03:52|LMKISLSVUN4YKEvRy2d14DE4AgTmnpEU6dqpX5/WilzC5gZp4nTgzAOKx5npaOnH7vGjxTFzpcukma2FY2yEw2MXJJKWYCaqFDRZfKVOBOAbGzngFa8oZdIn6WRieS00GFV0rAVjQOrdixE4hiGzss7sDCbZMzrkkyES5+MRIPsGfB0KW8yVEbt/BO74d+wwwvskDIA3ZW8U00xIK//+7GQdOW5tpSXIRPE

Sello digital del CFDI:

LMKISLSVUN4YKEvRy2d14DE4AgTmnpEU6dqpX5/WilzC5gZp4nTgzAOKx5npaOnH7vGjxTFzpcukma2FY2yEw2MXJJKWYCaqFDRZfKVOBOAbGzngFa8oZdIn6WRieS00GFV0rAVjQOrdixE4hiGzss7sDCbZMzrkkyES5+MRIPsGfB0KW8yVEbt/BO74d+wwwvskDIA3ZW8U00xIK//+7GQdOW5tpSXIRPEjKXcWLSahqchFhP647uOPo/SJeQvUtTICJPBgkQ+/cb4f0vqBfmJRd+AVK

Sello digital del SAT:

.B8Loo3Gb6shN5+Ev9kGGnuXK/fn6yCwwRpvMaYmL0ChINQ4jEsR7rHv0pMptNrv9n3nbpcc6CAcvQhn4t007/g2Q5F17jgEWiqAGlhf1YnbCa8pCEfH0kpH0ixchHIGeEy+j6JwM/P5URAZO5sKDBpZtus//hgXHjCz4h+hg5Ey7JbsK1dy8Tn7205Yr4CbxtQE+fm1RaiEHYDN57XDWmMrPJ3VpQvY5GVpCIOTYVxP+VEb13lwTinWRbfkieA5aWdsQTWdzAOxDuUM567v1I+Rx4aHLK+



(Doscientos siete mil quinientos setenta y nueve pesos 12/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No Aplica

Subtotal
IVA 16%

178,947.52
28,631.60

Total

207,579.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 324330F1-4516-1242-9B67-91D41398949B Fecha de certificación: 13/nov./2017 14:03:52

Certificado del emisor: 00001000000406574233 Certificado del SAT: 00001000000401041203

FACTURA ELECTRÓNICA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CDE100810UF7	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
324330F1-4516-1242-9B67- 91D41398949B	2017-11-13T12:50:21	2017-11-13T14:03:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$207,579.12	ingreso	Vigente	





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO

135/2017

IMPORTE CONTRATO

\$2,079,793.56

CON IVA

CONTRATISTA

PERIODO DE EJECUCIÓN

OBRA/SERVICIO

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECO,S.A DEC.V.
28 DE AGOSTO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ,UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA
ESCLAVITUD Y AV. NOGALES

DIFERIMIENTO AUTORIZADO

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO

MONTO CONTRATADO

\$2,079,793.56 CON IVA

MONTO PROGRAMADO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2017

\$302,805.59 SIN IVA

MONTO EJERCIDO ESTIMACIÓN 1

\$256,106.32 SIN IVA

IMPORTE PENDIENTE

\$46,699.27 SIN IVA

CALCULO DE RETENCIÓN/SANCÓN POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE FUERA DE PROGRAMA	SANCÓN / RETENCIÓN DEL 1.0%/MES	NUMERO DE MESES DE RETRASO	IMPORTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE REINTEGRO
INCISO A	\$46,699.27	\$467.00	1.00	\$467.00	

ESTIMACIÓN No.1 (PERIODO 28 AGOSTO AL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2017)

TOTAL \$467.00 SIN I.V.A.

ELABORÓ:

ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ


REVISÓ:

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

Vo.Bo.

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

CHIHUAHUA, CHIH., NOVIEMBRE 2017



CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V.

CHIHUAHUA, CHIH. A 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

FACTURA : FE85

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 (UNO) CON FACTURA N. FE85 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS,UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA
ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$207,579.12 CON IVA INCLUIDO

ACOMPANADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE
ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A DE C.V.

RECIBE

ING GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 135/2017	CONTRATADOS
OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 2,079,793.56 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017	
UBICACIÓN: ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 297,083.33 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC CDE-100810-UF7	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 297,083.33 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 256,106.32	
<u>RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA</u>	\$ (467.00)	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 255,639.32	

DESCUENTOS	
0.2% C.M.I.C	511.28
0.2% D.I.F	\$ 511.28
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,022.56
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 255,639.32
MORT ANTICIPO	\$ 76,691.80
SUB-TOTAL	\$ 178,947.52
I.V.A.	\$ 28,631.60
TOTAL	\$ 207,579.12
(CON LETRA)	
(DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 1,022.56
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 206,556.57

AUTORIZÓ	ELABORÓ:
 <u>ING GLORIA MARTINEZ RGUEZ</u> RESIDENTE D.O.P.M. Vo. Bo.	 <u>CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA REVISÓ <u>ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA</u> JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN.
 <u>ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA</u> SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Vo. Bo.	 <u>ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL</u> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE:
(DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NUM. 1(UNO) CONTRATO No. 135/201 POR LA CANTIDAD DE : \$2,079,793.56
DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	255,639.32
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	76,691.80
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	SUBTOTAL	\$ 178,947.52
	IVA	\$ 28,631.60
0.2% C.M.I.C	TOTAL	\$ 207,579.12
D.I.F.0, 2 %		
SUMA		511.28
		1,022.56

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO	\$	2,079,793.56	CON IVA
	\$	-	CON IVA
	\$	297,083.33	CON IVA
	\$	297,083.33	CON IVA
	\$	1,782,710.23	CON IVA

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO	\$	623,938.07	CON IVA
	\$	-	CON IVA
	\$	88,962.49	CON IVA
	\$	88,962.49	CON IVA
	\$	534,975.58	CON IVA

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

0.2 % C.M.I.C

\$	-
\$	511.28
\$	511.28

0.2% D.I.F

\$	-
\$	511.28
\$	511.28

RECIBIMOS

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO, S.A.DEC.V.
CDE-180810-UF7

OBRA:

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN
DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA
ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES

UBICACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

No. CONTRATO: 135/2017

ESTIMACIÓN No.

1 (UNO)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE C.V

PERÍODO: 28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

1	<u>NORMALES</u>	256,106.32
---	-----------------	------------

SUBTOTAL	256,106.32
I.V.A.	40,977.01
TOTAL	297,083.33

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE.CV

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS,UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. LOS NOGALES

UBICACIÓN ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

No. CONTRATO: 135/2017

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE C.V

PERIODO: 28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL

256,106.32

ALUMBRADO

1.3	E.P.7 SUMINISTRO DE LUMINARIA LEDs. TIPO PZA COBRA,150 W,PARA UNA DISTANCIA INETRPOSTAL DE 50 M,ALTURA DE MONTAJE DE 10 M		38.00	38.00	0.00	38.00	\$ 6,739.64	256,106.32
-----	---	--	-------	-------	------	-------	-------------	------------

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V.

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RDGUEZ.

TESTIGO FOTOGRAFICO


CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE S.V
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS,UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. NOGALES

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PERIODO: 28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 2017

No. CONTRATO: 135 /2017
No. ESTIMACION: 1 (UNO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.3	E.P.7 SUMINISTRO DE LUMINARIA LEDs. TIPO COBRA,150 W,PARA UNA DISTANCIA INETRPOSTAL DE 50 M,ALTURA DE MONTAJE DE 10 M	38.00 PZAS

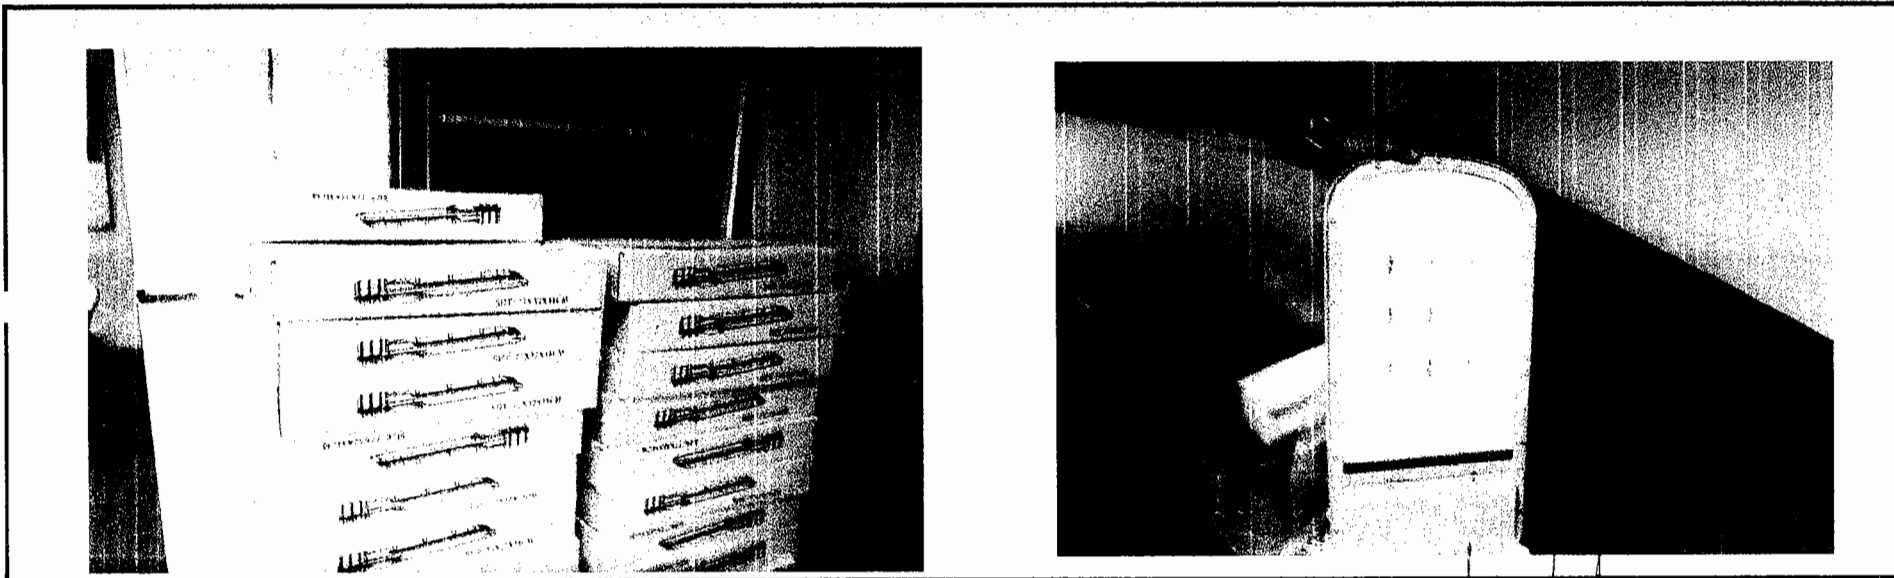

RESIDENTE DE OBRA
ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A.DE C.V.

GENERADOR

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE S.V.
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OBRA:

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, UBICADO EN CALLE ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y AV. NOGALES

FECHA:

11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PERIODO:

28 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE
2017

No. CONTRATO: 135/2017

No. ESTIMACION: 1 (UNO)

CLAVE	CONCEPTO :	VOLUMEN TOTAL DE CONCEPTO
1.3	E.P.7 SUMINISTRO DE LUMINARIA LEDs. TIPO COBRA, 150 W, PARA UNA DISTANCIA INTRAPOSTAL DE 50 M, ALTURA DE MONTAJE DE 10 M	38.00 PZAS

TOTAL DEL PAGO = 38 PIEZAS

SE PAGA SOLO EL SUMINISTRO LA COLOCACIÓN VIENE EN OTRO CONCEPTO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ECO S.A. DE C.V.
