

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**


INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO BOX EN JARDINES DE ORIENTE
CARACTERÍSTICAS:	M2 MURO DE TABLAROCA, 628.78 M2 PINTURA
CONTRATO:	085/2018
MONTO DE CONTRATO:	\$1,250,160.63
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO:	24/09/2018
FECHA DE INICIO REAL:	24/09/2018
FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO:	31/12/2018
FECHA DE TERMINO REAL:	20/12/2018

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

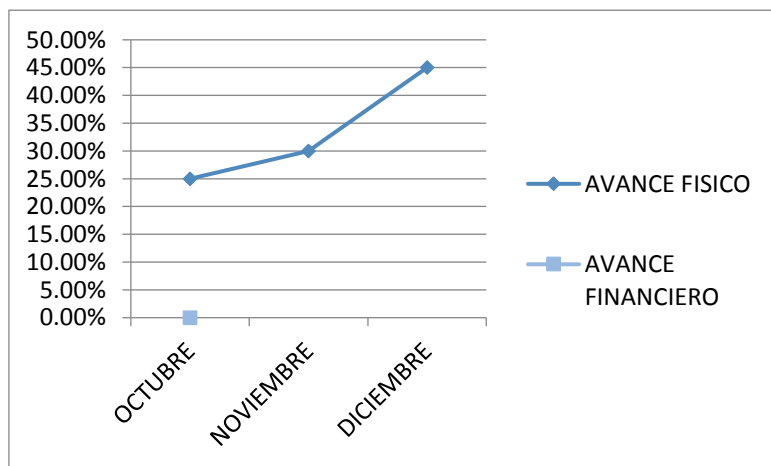

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	25.00%
NOVIEMBRE	30.00%
DICIEMBRE	45.00%
TOTAL:	100.00%



AVANCE FINANCIERO	
	30%
	40%
	30%
	100%
