

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**


INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO #8613**
 CONSISTE EN LO SIGUIENTE. ESTRUCTURA CONFORMADA CON 12 ZAFATAS /
 CARACTERÍSTICAS: DADOS DE CONCRETO ARMADO Y 12 COLUMNAS DE ACERO TIPO IPR DE 8" X 8"
 CONTRATO: 089/2018
 MONTO DE CONTRATO: \$570,845.93
 CONTRATISTA: ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 10/10/2018
 FECHA DE INICIO REAL: 10/10/2018
 FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 23/11/2018
 FECHA DE TERMINO REAL: 23/11/2018

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

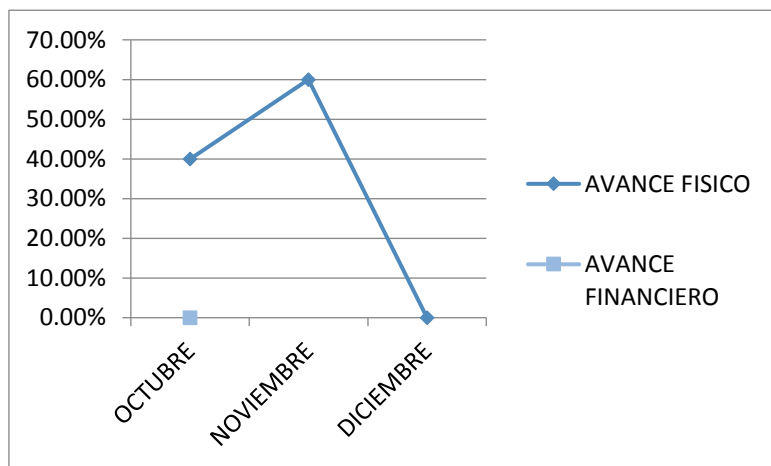

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	40.00%
NOVIEMBRE	60.00%
DICIEMBRE	0.00%
TOTAL:	100.00%



EN LA COLONIA
AISLADAS T 24
4" X 19 40 KG/M



AVANCE FINANCIERO
30%
70%
0%
100%
