

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA


OBRA: **REPARACIÓN DE BARDA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ESCUELA**
 CARACTERÍSTICAS: **REPARACIÓN DE BARDA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO**

CONTRATO: **092/2018**
 MONTO DE CONTRATO: **\$71,465.52**
 CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.**

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: **10/10/2018**
 FECHA DE INICIO REAL: **10/10/2018**
 FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: **08/11/2018**
 FECHA DE TERMINO REAL: **08/11/2018**

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

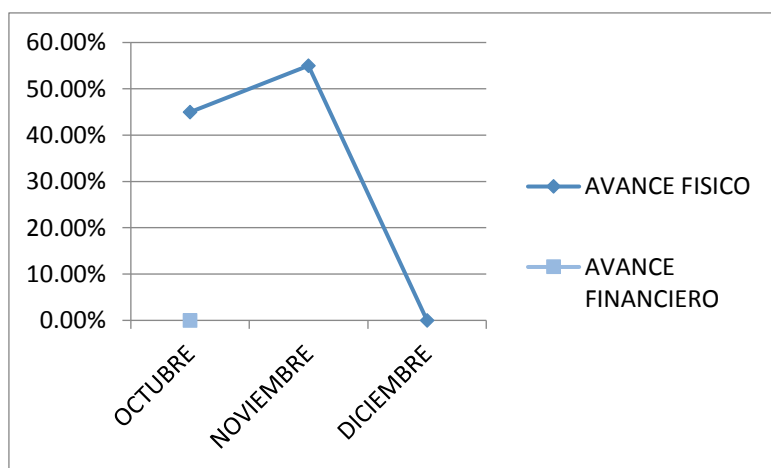

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	45.00%
NOVIEMBRE	55.00%
DICIEMBRE	0.00%
TOTAL:	100.00%



A PREESCOLAR

I ESCUELA



AVANCE FINANCIERO	
	30%
	70%
	0%
	100%
