

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**


**INFORMACIÓN BÁSICA**

OBRA: **JUNTOS UNA MEJOR ESCUELA 2018/ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2018, CON**  
 CARACTERÍSTICAS: **CONSTRUCCION DE DOMIO EN CANCHA DE BASQUETEBOL, A BASE DE 2 EJ**  
**7APATAS AISLADAS Y 36 DADOS DE CONCRETO ARMADO. 18 COLUMNAS DE A**  
 CONTRATO: **114/2018**  
 MONTO DE CONTRATO: **\$1,159,837.07**  
 CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**

**CALENDARIZACIÓN**

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 01/11/2018  
 FECHA DE INICIO REAL: 01/11/2018  
 FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 25/12/2018  
 FECHA DE TERMINO REAL: 17/12/2018

**AVANCE FISICO Y FINANCIERO**

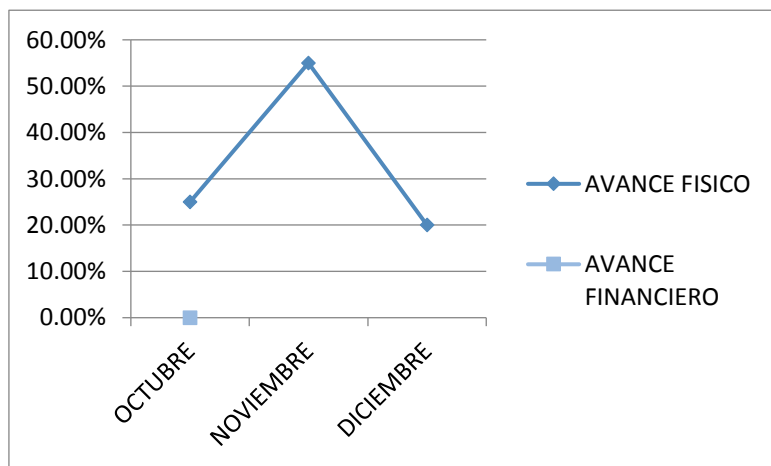

| MES           | AVANCE FISICO  |
|---------------|----------------|
| OCTUBRE       | 25.00%         |
| NOVIEMBRE     | 55.00%         |
| DICIEMBRE     | 20.00%         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>100.00%</b> |



APOYO PARA  
ES, CON 10  
ACERO VIGAS



| AVANCE<br>FINANCIERO |
|----------------------|
| 30%                  |
| 53%                  |
| 17%                  |
| 100%                 |
