



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

**INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA**

FECHA : 27 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y AMPLIACIÓN DE OBRA DE DRENAJE, EN LATERAL
DE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y ARROYO LAS MALVINAS

No CONTRATO: 119/2018

OFICIO DE AUTORIZACION No.: 2018-PDM-PEPD-OP-057

CARACTERÍSTICAS:

CONSISTE EN LA AMPLIACION DE OBRA DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE BANQUETA PARA
PEATONES, ASI COMO REVESTIMIENTO DE CANAL, TALUDES, LAVADEROS Y BARANDAL.

MONTO DE CONTRATO : \$514,146.64 CON IVA

MONTO MODIFICADO :

CONTRATISTA :

LARROC EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO :

07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN :

15 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA :

15 DE DICIEMBRE DEL 2018

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:

NO HAY ANTICIPO


AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$499,889.06 97.23%

REAL: \$515,188.29 100.00%

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

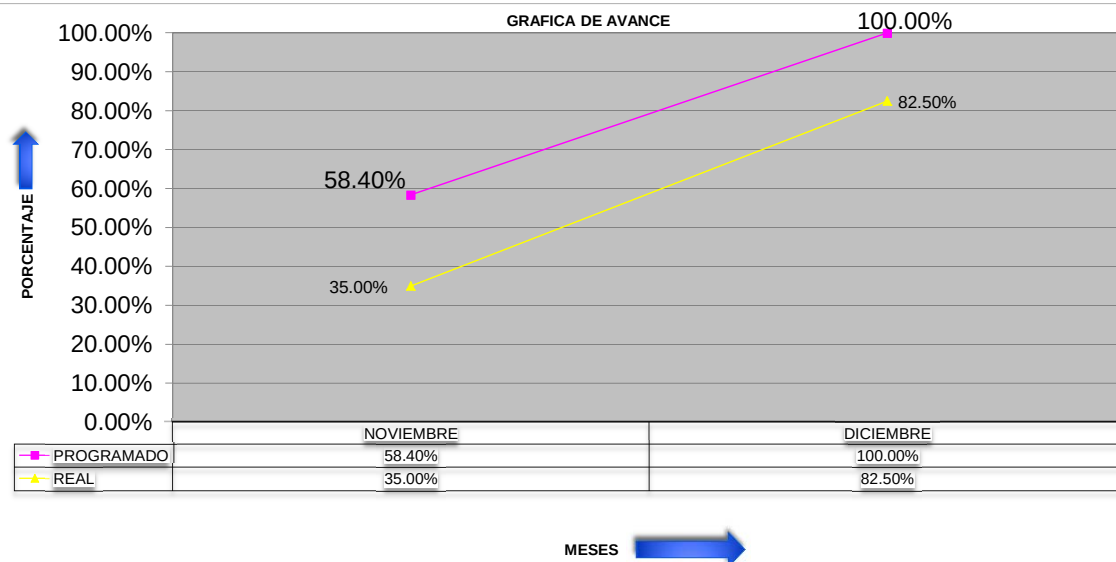

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

NOTAS:

PANORAMICA DE OBRA DE DRENAJE



SESAGUE PLUVIAL



COMPACTACION EN RELLENOS



TRAZO DE BANQUETA

