



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA 27 de diciembre de 2018

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. PRIVADA 5ta ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y TOPE DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE No CONTRATO 122/2018

CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZA 2018-PDM-OP-008
LCANTARILLADO SANITARIO Y DESVARGAS SANITARIAS

MONTO DE CONTRATO: \$507,732.70 CON IVA

CONTRATISTA: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALES.

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR REPROGRAMACION: SUSPENSION

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL


PROGRAMADO: \$ - 100.00%
REAL: \$ - 100.00%
PROGR. REAL

POR PARTIDA

POR PARTIDA

PROGR. REAL

AVANCE DE CONSTRUCCION EN %

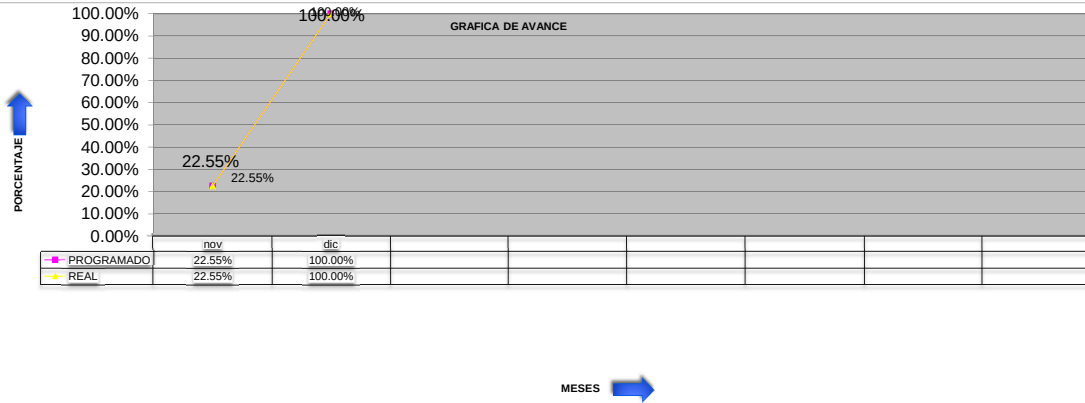

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

