

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **ESCUELA SECUNDARIA N° 72, REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS**
 CARACTERÍSTICAS: REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS CON PISO DE GOMA Y SOBREFRANQUEO DE CONCRETO (1190 M²)
 CONTRATO: 125/2018
 MONTO DE CONTRATO: \$1,642,318.93
 CONTRATISTA: ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 01/12/2018
 FECHA DE INICIO REAL: 01/12/2018
 FECHA DE TÉRMINO, SEGÚN CONTATO: 30/12/2018
 FECHA DE TÉRMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

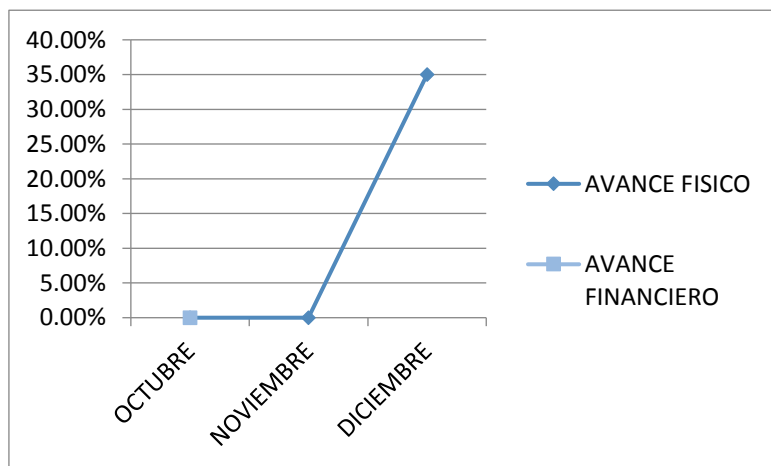

MES	AVANCE FÍSICO
OCTUBRE	0.00%
NOVIEMBRE	0.00%
DICIEMBRE	35.00%
TOTAL:	35.00%



/AS
IVIE DE FISO DE



AVANCE FINANCIERO
0%
0%
45%
45%
