

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA:

PROYECTO EX HACINDAS DE CHIHUAHUA MODIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS:


EL PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR MODIFICACIONES, ADECUACIONES Y
PROYECTO EJECUTIVO EX HACIENDA EL TORREÓN Y EX HACIENDA EL

CONTRATO:	126/2018
MONTO DE CONTRATO:	\$39,304.00
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTRATO:	03/12/2018
FECHA DE INICIO REAL:	15/12/2018
FECHA DE TÉRMINO, SEGÚN CONTRATO:	03/12/2018
FECHA DE TÉRMINO REAL:	15/12/2018

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

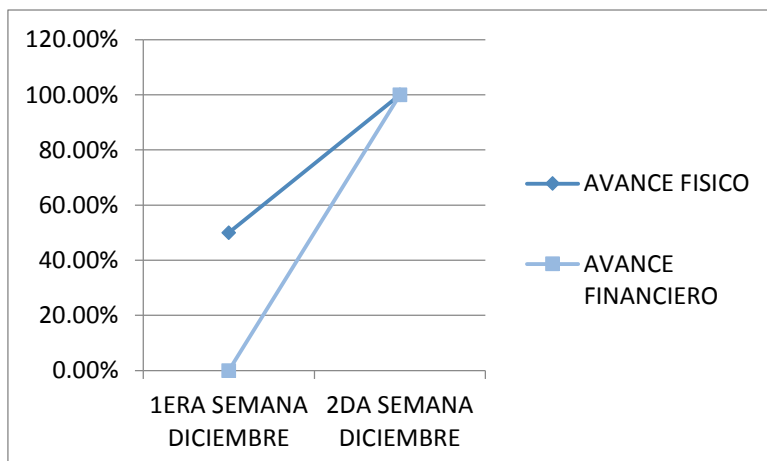

MES	AVANCE FÍSICO
1ERA SEMANA DICIEMBRE	50.00%
2DA SEMANA DICIEMBRE	100.00%
DICIEMBRE	
TOTAL:	100.00%



DETALLES DEL
. SAUZ.



AVANCE FINANCIERO
0%
100%
100%
