



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 008/2015

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 75 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y 177, 186,190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE OBRA PÚBLICA

LUGAR Y FECHA: EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA 07 DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SE PROCEDIÓ AL PRESENTE ACTO.

OBJETO: ENTREGA Y RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DE TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS TRAMO: 8-12 Y TRABAJOS DIVERSOS, EN EL PARQUE EL REJÓN., LOS QUE FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONTRATISTA LARROC EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Y QUE SE RECIBEN POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. DE ACUERDO CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE ESCRITO S/N DE FECHA 06/05/15, EN EL QUE SOLICITA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVIENEN: POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LOS CC. ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y ARQ. GABRIELA FLÓREZ HURTADO EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA EL ING. YAVID ERNESTO CORRAL PÉREZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE LA OBRA. QUIEN ENTREGA.

DATOS BASICOS: CONTRATO NÚMERO: 008/2015 P.D. DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2015

MONTO CONTRATADO: CONTRATO ORIGINAL: \$844,362.53 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


OFICIO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:
MUNICIPAL: 2015-PDM-33FM-OP-020, 2015-PDM33FM-OP-M/28

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

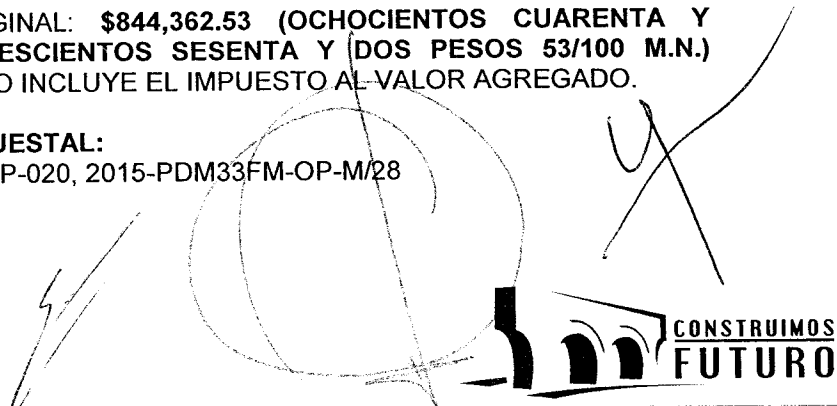

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 008/2015

PERIODO DE
EJECUCION:

CONTRATO ORIGINAL 02 DE MARZO DEL 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2015

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2015

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA	NO. FIANZA	FECHA	IMPORTE
	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.	1595614-0000	30 de abril de 2015	\$97,946.05

BITACORA

FECHA DE INICIO

02/03/15

FECHA DE CIERRE 30/04/15

RELACION DE PAGOS DE ESTIMACIONES:

CONTRATO ORIGINAL

ESTIMACION	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1	757,360.32
ESTIMACIÓN 2	72,724.00
ESTIMACIÓN 3	14,278.21
SUBTOTAL	\$844,363.53
I.V.A	\$135,098.00
TOTAL	\$979,460.53

EN RELACION AL IMPORTE CONTRATADO, MENOS LA CANTIDAD ESTIMADA, QUEDA UN SALDO POR FINIQUITAR DE \$0.00 C/IVA

EN ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, DE LOS PLANOS DEFINITIVOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL, ASI COMO DE LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS.


Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 008/2015

ASI COMO TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA ING. YAVID ERNESTO CORRAL PEREZ HACE ENTREGA DEL ARCHIVO QUE CONTIENE DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, A LA RESIDENTE DE OBRA C. ARQ. GABRIELA FLÓREZ HURTADO.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, SE RESERVA EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR Y EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE

DESPUÉS DE LEÍDA Y RATIFICADA POR LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN Y NO HABIENDO OTRA COSA QUE ASENTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. GABRIELA FLÓREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. YAVID ERNESTO PEREZ CORRAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Finiquito de Obra

TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS TRAMO: 8-12 Y TRABAJOS DIVERSOS, EN EL PARQUE EL REJON

Contratista. LARROC EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: LEM-090421-CU5

Contrato No. 008/2015	Monto con iva \$ 979,460.53	Período Contratado: 02 MARZO A 30 ABRIL DE 2015	Elaborado: febrero 27 del 2015
Anticipo del 30% \$293,838.16	Entregado: RENUNCIA AL ANTICIPO	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
uspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Recursos 2015	2015-PDM-33FM-OP-020 \$ 979,460.53	2015-PDM-33FM-OP-M/28 \$ 979,460.53	TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 979,460.53
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00			

NUMERO	TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO		SANCION		REINTEGRO	AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO	EJERCIDO	FINANC.	PERIODO DE EJECUCION	
	DESCRIPCION	IMPORTE		IMPUESTO	IVA	0.20%	0.20%		0.20%	0.20%	NETO	INICIO				TERMINACION	
Anticipo	ANTICIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimación 1	Normales		Nº 33	757,350.32	12,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.72	1,514.72	373,993.81	376,537.97	mar. 2 del 2015			mar. 15 del 2015
Estimación 2	Normales		Nº 35	72,724.00	1,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	145.44	83,923.62	84,358.84	mar. 16 del 2015			mar. 31 del 2015
Estimación 3	Normales y Exc		Nº 40	14,276.21	2,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28.55	28.55	16,477.07	16,562.72	abr. 1 del 2015			abr. 30 del 2015

COSTO DE OBRA: 979,460.53	SALDOS 2015	844,362.53	135,098.00
POR ESTIMAR: 0.00	AMORTIZACION: 0.00	AMORTIZACION: 0.00	AMORTIZACION: 0.00
	POR EJERCER: 0.00	POR EJERCER: 0.00	POR EJERCER: 0.00
	RESIDENTE D.O.P.M.	RESIDENTE D.O.P.M.	RESIDENTE D.O.P.M.
	ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO	ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO	ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
	ING. GUILLERMO AMADOR MORALES	ING. GUILLERMO AMADOR MORALES	ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN	ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
	JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION	JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION	JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION
	PERIODO REAL: mar. 2 del 2015	PERIODO REAL: mar. 2 del 2015	PERIODO REAL: mar. 2 del 2015
	RET 0.2%	RET 0.2%	RET 0.2%
	1,888.71	1,888.71	1,888.71
	ene. 0 del 1900	ene. 0 del 1900	ene. 0 del 1900

CONTRATISTA

LARROC EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS TRAMO 8.12 Y TRABAJOS DIVERSOS EN EL PARQUE EL RECOR

Presupuesto de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VOLUMENES CONVENIO	PUERTO	IMPORTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VOLUMEN PROYECTADO
8.00	ZONA 8 ANTES DE LLEGAR AL CONCRETO DEL PÓRTON DE CIMA, SENDA PERIMETRAL								
8.10	Terracerías, Concreto Acabados								
8.11	Suministro y colocación de ARCILLA ROJA EN UNA CAPA DE 10CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO Incluye: materiales, equipo, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	m3	46.82			\$10,066.30	46.82	10,066.30	0.00
8.12	SUB-BASES Y BASES Base hidráulica de 10cms de espesor por unidad de obra terminada. Compactada al cien por ciento (100%). Del banco que elija el Contratista, con material cribado, incluye materiales, aceros, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	46.82			\$9,481.05	46.82	9,481.05	0.00
8.13	Suministro y colocación de Tope de hule negro (park it) 1.83m con franjas reflectantes amarillo. Incluye accesorios para fijación mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.00			\$1,908.00	4.00	1,908.00	0.00
						\$21,455.35		\$21,455.35	\$0.00
9.00	ZONA 9 PASANDO EL CONCRETO DEL PÓRTON DE CIMA, SENDA PERIMETRAL								
9.10	Terracerías, Concreto Acabados								
9.11	Suministro y colocación de ARCILLA ROJA EN UNA CAPA DE 10CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO Incluye: materiales, equipo, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	m3	91.89			\$19,756.35	91.89	19,756.35	0.00
9.12	SUB-BASES Y BASES Base hidráulica de 10cms de espesor por unidad de obra terminada. Compactada al cien por ciento (100%). Del banco que elija el Contratista, con material cribado, incluye materiales, aceros, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	90.59			\$18,344.07	90.59	18,344.07	0.00
9.13	Suministro y colocación de Tope de hule negro (park it) 1.83m con franjas reflectantes amarillo. Incluye accesorios para fijación mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4.00			\$1,908.00	4.00	1,908.00	0.00
						\$40,008.42		\$40,008.42	\$0.00
10.00	ZONA 10 RANCHITOS Y LOMA, SENDA PERIMETRAL								
10.10	Terracerías, Concreto Acabados								
10.11	CORTES Excavaciones, por unidad de obra terminada En cortes y adicionales abajo de la subrasante (PLATIFORMAS PATIOS O ESTRUCTURAS) Cuando el material se desperdicia, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye el corte, extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo, libre, descarga y depósito en el banco de desperdicio propuesto por el contratista y la estabilización de taludes en caso de ser necesario.	m3	500			\$37,500.00	528.52	39,639.00	-28.52
10.12	Suministro y colocación de ARCILLA ROJA EN UNA CAPA DE 15CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO Incluye: materiales, equipo, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	M3	9			\$1,935.00	9.00	1,935.00	0.00
10.13	SUB-BASES Y BASES Base hidráulica de 15cms de espesor por unidad de obra terminada. Compactada al cien por ciento (100%). Del banco que elija el Contratista, con material cribado, incluye materiales, aceros, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	9			\$1,822.50	9.00	1,822.50	0.00
10.14	Suministro y colocación de Tope de hule negro (park it) 1.83m con franjas reflectantes amarillo. Incluye accesorios para fijación mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pzas	7			\$3,339.00	7.00	3,339.00	0.00
10.15	Guarnición de concreto ubicada al centro de la senda con un área de 150cm2 (de 10 x 15 cms) de sección de concreto FC-200 KG/CM2, con fibra de polipropileno junta a cada 3.0m. Incluye: materiales, equipo, desperdicio, sellado de juntas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.O.I.	m	12.6			\$2,243.18	12.60	2,243.18	0.00
10.16	Apóche en guarniciones con material de banco. Incluye, todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.5			\$101.25	1.15	232.84	-0.65
10.17	Suministro y colocación de GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN DE 10X30X40CMS TRAPEZOIDAL CON FIBRA DE POLIPROPILENO FC-200KG/CM2, junta a cada 3.0m Incluye: materiales, equipo, desperdicios, sellado de juntas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	ml	46.8			\$5,840.64	46.80	5,840.64	0.00
						\$55,052.16		\$55,052.16	-42,270.59
12.00	ZONA 12 DE LA LLUVIA HASTA EL CONCRETO ENFRETE DEL FORO, SENDA PERIMETRAL								
12.10	Terracerías, Concreto Acabados								
12.11	Suministro y colocación de ARCILLA ROJA EN UNA CAPA DE 10 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO Incluye: materiales, equipo, desperdicios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación por unidad de obra terminada.	m3	57.1			\$12,276.50	57.10	12,276.50	0.00
12.12	SUB-BASES Y BASES Base hidráulica de 10 cm de espesor por unidad de obra terminada. compactada al cien por ciento del banco que elija el contratista, con material triturado al 100%, incluye materiales, aceros, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	58.58			\$11,862.45	58.58	11,862.45	0.00
						\$24,138.95		\$24,138.95	\$0.00
2.00	TRABAJOS ADICIONALES								

TRABAJOS ADICIONALES PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SENDAS TRANSITO 6-12-14 TRABAJOS DIVERSOS EN EL PARQUE REGIONAL

Finiquito de los trabajos

N	CONCEPTOS	UNIDAD	CONTRATO	VOLUMENES CONVENIO	PUNTIARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJECUTADO	POR ENTREGA	VOLUMEN EJECUTADO	VOLUMEN A ENTREGAR
13.1	Demolicion de guarnición existente y reposición de la misma de 10 x 15 cm. concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye excavaciones, retiro de material producido de demolicion fuera de obra, obrado, colado, curado, rellenado compactado producido de la obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m	1380		182.78	\$252,236.40	1,380.00	252,236.40	0.00	0.00
13.2	Demolicion a mano de guarnición trapezoidal (10x30x40 cm). Incluye acarreo local y retiro fuera de obra.	m	66.75		32.25	\$2,152.89	66.75	2,152.89	0.00	0.00
13.3	Señal de identificación de camión peatonal y/o ciclista sobre superficie de carpeta de concreto o asfalto en círculo de 1.00m de diámetro y logotipo de peatón o bicicleta de 60 x 60 cms aprox. dentro del círculo con pintura de esmalte, color definido por supervisión, para su correcta ejecución. p.u.o.i.	Pza	4		167.95	\$671.80	4.00	671.80	0.00	0.00
13.4	Señal de identificación de sentido de flujo en carril de ciclovía sobre superficie de carpeta de concreto o asfalto en flecha de 55 cms de longitud aprox. con pintura de esmalte, color definidos por la supervisión. Incluye trazo, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.i.	Pza	6		100.00	\$600.00	6.00	600.00	0.00	0.00
13.5	Reparación de guarnición a base de concreto f'c=200 kg/cm2 en forma trapezoidal, sección aproximada de 15 x 15 cm. Incluye obrado, retiro y curado.	m	38.89		110.69	\$4,304.73	38.89	4,304.73	0.00	0.00
13.6	Suministro y tendido de piedra bola hasta 4" de diámetro, para habilitar capa compactadora de capilaridad. Incluye materiales, herramienta, mano de obra, equipo, cargas, acarreo, descargas dentro y fuera de obra.	m3	653.78		277.50	\$181,424.64	643.11	178,463.03	10.67	2,961.62
13.7	Suministro y tendido de arena de espesor variable incluye materiales, herramientas, mano de obra, equipo, cargas y acarreo, descargas dentro y fuera de obra.	m3	43.59		242.89	\$10,590.84	56.74	13,786.17	-13.15	-3,195.33
13.8	Excavación en material "B" profundidad hasta 1.5 mts. Promedio incluye: herramienta, mano de obra, equipo, maquinaria, cargas, acarreo, descargas fuera de obra.	m3	1157.74		120.99	\$140,074.77	1,137.04	137,570.47	20.70	2,504.30
						\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						\$589,745.29				\$2,270.59
3.00	DEMOLICIONES EN PLAZA DEL AGUA									
DPA-01	Retiro de salida de sistema de riego incluye retiro de válvula, poliducto y cableado a lugar señalado por supervisión.	Pza	45		167.33	\$7,529.85	45.00	7,529.85	0.00	0.00
DPA-02	Retiro de bote de basura anclada en cepa de concreto incluye excavaciones, recuperación y traslado a lugar determinado por supervisión.	Pza	9		265.58	\$2,570.22	9.00	2,570.22	0.00	0.00
DPA-03	Desmontaje de pérgola ahogada más de la mitad de su altura incluye herramienta, mano de obra, equipo, acarreo dentro y fuera de superficie de agua y retiro a lugar señalado por supervisión.	Kg	7466.53		9.74	\$72,724.00	7,466.53	72,724.00	0.00	0.00
DPA-04	Retiro de asadores anclada en cepa de concreto incluye excavaciones, recuperación y traslado a lugar determinado por supervisión.	Pza	9		265.58	\$2,570.22	9.00	2,570.22	0.00	0.00
DPA-05	Demolicion de base de concreto armado de sección de 3.10 x 3.55 mts. Aproximados y 15 cms. de espesor con demontaje de cubierta metálica y malacombra de sección de 2.9 x 2.7 mts. Aproximados, demolicion de 2 bancas de concreto armado de 2.15x0.40x0.30 mts. y mesa de concreto armado de 0.90x2.15 mts. Incluye el retiro de escombros producido de demolicion, la recuperación del acero de refuerzo y perfiles metálicos para su traslado a lugar señalado por supervisión.	Pza	11		2,486.08	\$27,346.88	11.00	27,346.88	0.00	0.00
DPA-06	Desmontaje de malla sombra por estructura metálica incluye herramienta, mano de obra, equipo, acarreo dentro y fuera de obra, recuperación y traslado a lugar señalado por supervisión.	Kg	128.39		9.20	\$1,161.19	128.39	1,161.19	0.00	0.00
						\$113,922.38				\$0.00

RESUMEN

8.00	ZONA 1 ANTES DE LLEGAR AL CONCRETO DEL PORTÓN DE CIMA, SENDA PERIMETRAL.	
9.00	ZONA 1 PASANDO EL CONCRETO DEL PORTÓN DE CIMA, SENDA PERIMETRAL.	
10.00	ZONA 10 RANCHITOS Y LOMA, SENDA PERIMETRAL.	
12.00	ZONA 12 DE LA LLONA HASTA EL CONCRETO ENFRETE DEL FORO, SENDA PERIMETRAL.	
2.00	TRABAJOS ADICIONALES	
3.00	DEMOLICIONES EN PLAZA DEL AGUA	

\$21,455.35	\$21,455.35
\$40,008.42	\$40,008.42
\$55,052.16	\$55,052.16
\$24,138.85	\$24,138.85
\$589,745.29	\$589,745.29
\$113,922.38	\$113,922.38
SUBTOTAL	\$644,363.53
IVA	\$135,488.00
TOTAL	\$779,851.53

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica 008/2015, resultando sin saldo alguno.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

LARROC ENRIQUE SARMI, S.A. DE C.V.

ARC. CARMEN GABRIELA FLORES HUERTADO

CHIHUAHUA, CHIH. A 07 DE MAYO DE 2015

