

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK EN LA FACULTAD DE ZOOTECNIA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA. No CONTRATO 008/2017
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-031

CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR, TRABAJOS DE EXCAVACIONES, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, RODAPIE DE 15 CMS.

MONTO DE CONTRATO: \$768,350.80 CON IVA MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 27 DE MARZO 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 25 DE MAYO 2017

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ 369,304.09 48.06%
REAL: \$ 320,000.00 41.65%

POR PARTIDA		PROGR.	REAL	POR PARTIDA		PROGR.	REAL
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

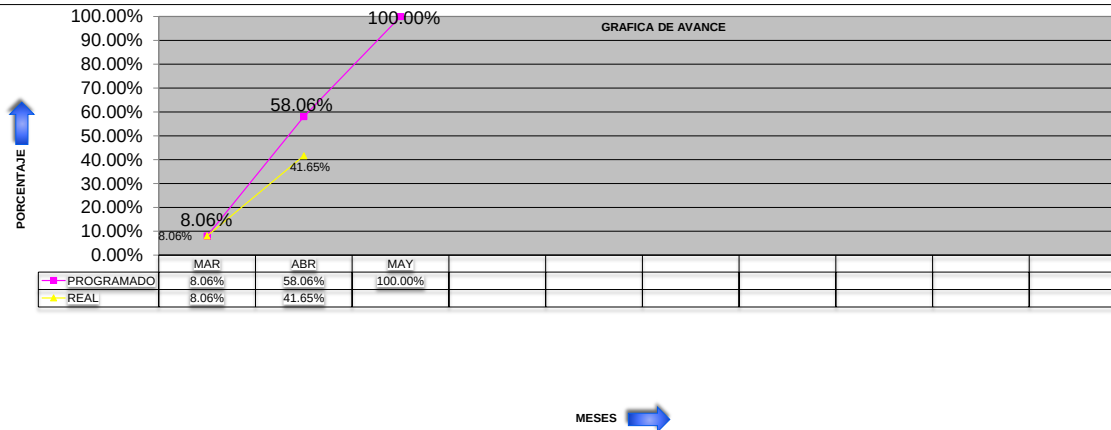

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

EXCAVACION

PLANTILLA

ACERO SE REALIZA LA COLOCACION DE ACERO PARA ZAPATA CORRIDA Y MUROS

ZAPATA SE REALIZA COLADO DE ZAPATA

RODAPIE DE BLOCK SE COLOCA BLOCK PARA RODAPIE

DALA DESPLANTE SE REALIZA COLADO DE DALA DE DESPLANTE

MURO BLOCK SE REALIZA COLOCACION DE BLOCK PARA BARDA

RELLENO BLOCK SE REALIZA COLOCACION DE RELLENO DE BLOCK

DALA DE CERRAMIENTO SE REALIZA COLADO DE DALA DE CERRAMIENTO

NOTAS:



SE REALIZA COLADO DE DALA DE CERRAMIENTO



SE REALIZA COLCACION DE BLOCK



SE MUESTRA BARDA TERMINADA



SE MUESTRA BARDA TERMINADA
