

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: "RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO EN RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE ANGEL TRIAS Y CALLE NOVENA" No CONTRATO 047/2017
CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-055
SE TRABAJARA CON MURO DE MAMPOSTERIA, RETIRO Y COLOCACION DE TUBO DE DRENAJE Y COLADO DE BANQUETAS

MONTO DE CONTRATO: \$227,708.00 CON IVA MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 3 DE MAYO DE 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 11 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 01 DE JULIO DE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO DE TERMINACION POR REPROGRAMACION:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ 225,430.92 99.00%
REAL: \$ - 0.00%

	PROGR.	REAL		PROGR.	REAL
POR PARTIDA			POR PARTIDA		
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8					

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

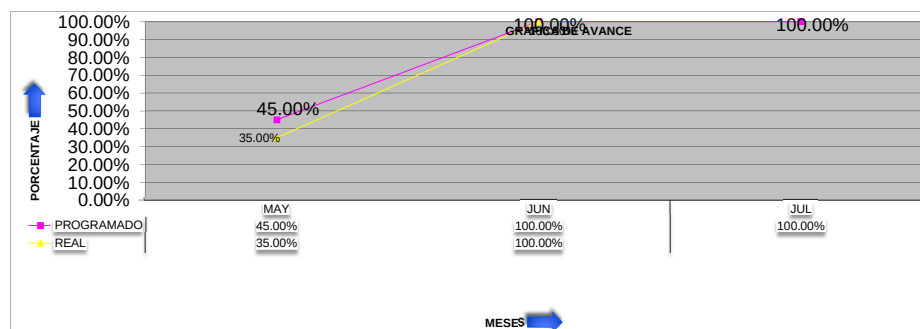

ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA



MURO DE MAMPOSTERIA Y TUBO DE DRENAJE



BANQUETAS Y LIMPIEZA GENERAL



LIMPIEZA GENERAL
