

DATOS BASICOS

PROYECTO: CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD. **No CONTRATO 060/2017**

CARACTERÍSTICAS: CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON-PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD. LONGITUD DE CANALIZACIÓN 235 MTS, ÁREA DE PAVIMENTACIÓN: DE 2,410 M2 DE CONCRETO, 4,700 M2 DE RE-PAVIMENTACIÓN, 450 MTS DE GUARNICIÓN Y 900 M2 DE BANQUETA.

OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-POM-FED-OP-006

CONTRATISTA: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 30 DE MAYO DEL 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 26 DE OCTUBRE 2017

MONTO DE CONTRATO: \$14,531,231.21 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:


AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ 12,139,842.91 83.54%
REAL: \$ 5,806,388.74 39.96%

POR PARTIDA			PROGR.	REAL	POR PARTIDA		
1					9		
2					10		
3					11		
4					12		
5					13		
6					14		
7					15		
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

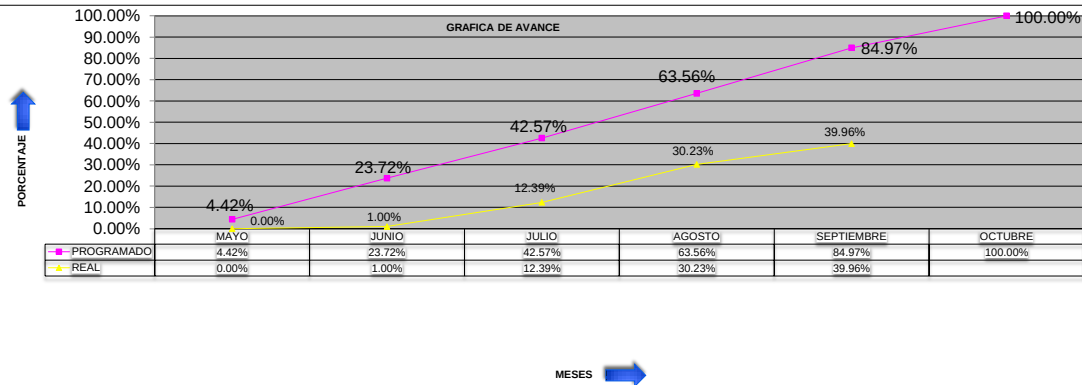

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PRELIMINARES

TERRACERIAS EN VIALIDAD

CANALIZACION SE TIENEN YA REALIZADAS TODAS LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DEL 2+600 AL 2+680 , SE REALIZAN TRABAJOS EN MUROS DEL 2+690 AL 2+700, SE TRABAJA EN LOSA SUPERIOR DEL CANAL DEL 2+760 AL 2+780.

TRABAJOS DIVERSOS

OBRAS DE DRENAJE

PAVIMENTOS

SEÑALAMIENTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INSTALACIONES ELECTRICAS

NOTAS: NO SE HAN PRESENTADO LLUVIAS DURANTE LA SEMANA, LA ESTIMACION No. 3, 4 Y 5 SE REGRESAN POR FORMATO, Y SE ENTREGAN NUEVAMENTE, SE HACE OBSERVACION AL CONTRATISTA DE QUE SE APEGE AL PROGRAMA DE OBRA, SE PIDE QUE META MAS PERSONAL A LA OBRA, SE TRABAJA CON LA LOSA SUPERIOR, Y SE HACE LA OBSERVACION DE QUE SUMINISTREN ACERO Y CIMBRA, NO SE HA PRESENTADO GRAN AVANCE EN MUROS Y LOSA INFERIOR (PISO) EN ESTA SEMANA.



ARROPE Y CIMBRA DE MURO SUR DEL KM 2+680.00 AL 2+700



CIMBRA DE LOSA SUPERIOR DEL KM 2+760.00 AL 2+780.00



COLADO DE LOSA INFERIOR (PISO) DEL KM 2+685.00 AL 2+700.00



COLADO DE MURO NORTE DEL KM 2+688.00 AL 2+700.00
