

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: "PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ- NUEVAS DELICIAS, PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL 1+050" No CONTRATO 063/2017
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-FISMREFI5-OP-003 Y 2017-PDM-OP-082

CARACTERÍSTICAS: SE TRABAJARA CON TERRACERIAS, TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO

MONTO DE CONTRATO: \$3,991,474.73 CON IVA **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 28 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 9 DE OCTUBRE DE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO DE TERMINACION POR REPROGRAMACION: se va ha diferir el tiempo por la entrega del anticipo que se entrega el 22 de septiembre
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL


PROGRAMADO: \$ 3,592,327.26 90.00%
REAL: \$ 1,516,760.40 38.00%

POR PARTIDA		PROGR.	REAL	POR PARTIDA		PROGR.	REAL
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

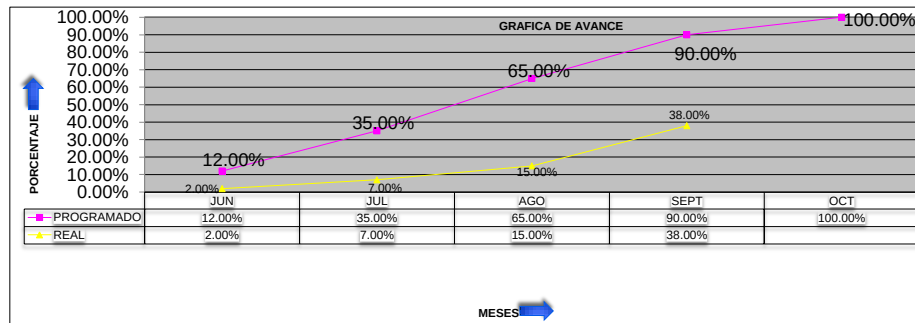

COLADO DE CARPETA HIDRAULICA



IMPREG



COLADO DE CARPETA HIDRAULICA



TENDIDO Y C



NACION DE LA BASE



OMPACTADO DE LA BASE
