

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GAZAS PARA IMPLEMENTAR EL TRÉBOL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO **No CONTRATO 96/2017**

CARACTERÍSTICAS: SE CONSTRUIRÁN CUATRO GAZAS CON UN ANCHO DE 10.00 MTS Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 120.00 METROS PARA INTEGRAR EL TRÉBOL AL PASO SUPERIOR, QUE INCLUYE ADEMÁS LOS SIGUIENTES TRABAJOS, CUBIERTA CON LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES PICACHO, CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES DE 10.00 M DE CLARO Y 11.00 DE ANCHO, MUROS MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS, SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE SID-13 Y SID-15, REUBICACION DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, ÁREAS VERDES, SISTEMA DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, OBRAS INDUCIDAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

MONTO DE CONTRATO: \$27,779,997.18 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA URBEMEX, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 17 DE JULIO 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 11 DE FEBRERO 2018
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTIPO:
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	\$	5,257,221.72	18.92%
REAL:	\$	10,914,397.05	39.29%

POR PARTIDA		PROGR.	REAL	POR PARTIDA		PROGR.	REAL
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

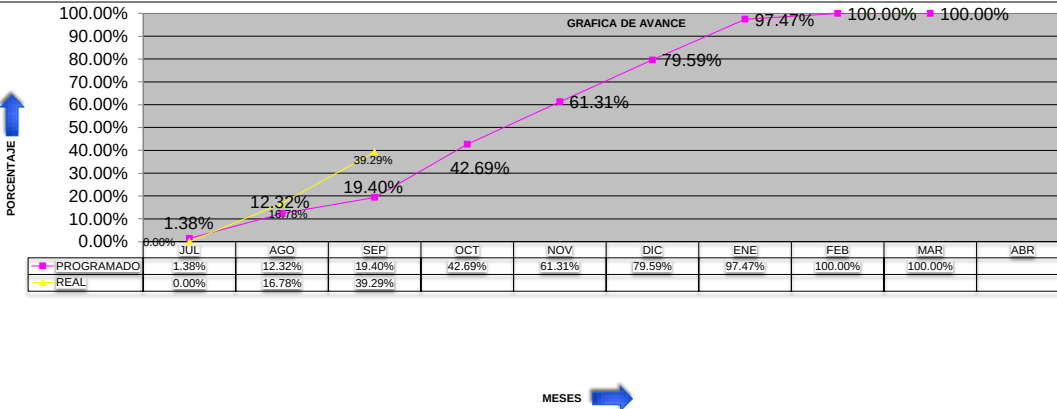

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

OBRAS PRELIMINARES

TERRACERÍAS SE REALIZA EXCAVACION, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y FORMACION DE TERRAPLEN

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE SE REALIZA EXCAVACION, RELLENOS, COLOCACION DE ACERO, COLADO DE MUROS, ESCAMAS EN OBRA

PAVIMENTACIÓN

SEÑALAMIENTO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN SE REALIZA EXCAVACION Y COLOCACION DE POLIDUCTO PARA CABLEADO DE MEDIA TENSION

ÁREAS VERDES

RAMPAS Y PUENTE PEATONAL

EXTRAS

NOTAS: SE SUSPENDIO LOS TRABAJOS EN PUENTE DE GAZA SORIANA Y GAZA EN TERMINAL NORTE PARA MODIFICAR EL PROYECTO CON UN CLARO DE 10.50 Y EL PASO PEATONAL SE MODIFICARA CON UN ANCHO DE 3.0 MTS PARA CRUCE DE PEATONES ASI COMO LA UBICACIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y RAMPAS. SE REALIZO MODIFICACION DEL PRESUPUESTO POR VOLUMENES EXCEDENTES



COLOCACION DE CIMBRA EN GAZA SORIANA



COLOCACION DE ACERO EN LOSA EN GAZA FORD



COLOCACION DE CIMBRA EN GAZA SMART



DEMOLICION DE PARAPETO EN GAZA FORD
