



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CARR.
PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIRDE LA AV.
GUILLERMO PRIETO LUJÁN 0+000-0+0712 No CONTRATO 110/2017

CARACTERISTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No. PI-VIV-16-032
PRELIMINARES, TERRACERÍAS, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD, TRABAJOS DIVERSOS

MONTO DE CONTRATO: \$6,435,024.11 CON IVA


CONTRATISTA: ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 23/08/2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 15/12/2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: PEND.
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	0.00%		
REAL:	1.86%		
	PROGR.	REAL	
POR PARTIDA			
1 PRELIMINARES	0.00%	8.49%	
2 TERRACERÍAS	0.00%	18.89%	
3 OBRAS HIDRÁULICAS	0.00%	0.01%	
4 PAVIMENTACIÓN	0.00%	1.19%	
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00%	0.00%	

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

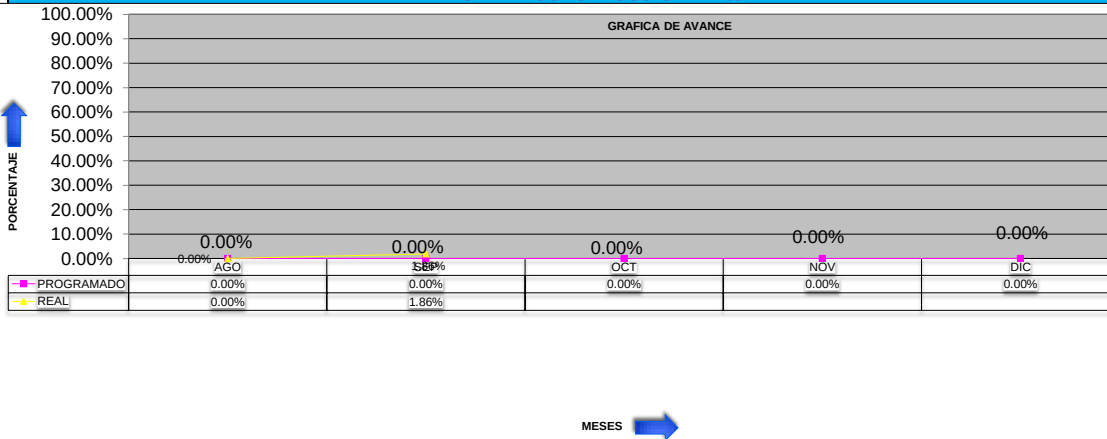

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PRELIMINARES

TERRACERÍAS

TERMINAN EXCAVACIONES PARA FORMAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CARPETA TRAMO 0+180 A 0+240
INICIA SUMINISTRO DE SUBRASANTE EN ESTE MISMO TRAMO

OBRAS HIDRÁULICAS

INICIAN EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ZAPATAS DE MUROS PARA AMPLIAR PUENTE

PAVIMENTO

INICIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN TRAMO 0+380 A 0+500

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SEÑALAMIENTO

EXTRAORDINARIOS

OBSERVACIONES: A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA RECIBIDO EL ANTICIPO

SE SOLICITA PROYECTO PARA RENIVELAR REGISTRO DE TELMEX QUE QUEDARÁ EN ÁREA DE RODAMEN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRÁULICA TRAMO
0+380 A 0+500



SUMINISTRO DE SUBRASANTE TRAMO DE 0+180 A 0+240

CORTE DE TERRENO NATURAL



EXCAVACIÓN PARA CIMEN
SOBRE CARRI



), SE RECIBE TERRENO NATURAL

TO



EN AMPLIACIÓN DE CARRETERA 0+000 A 0+170



TACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PUENTE
TERA PANAMERICANA
