



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA

FECHA

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO: "AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. DE LA CANTERA DEL CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE 0+000 AL KM. 1+220 HACIA EL OESTE" No CONTRATO 136/2017
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDR17-A-0067
CARACTERISTICAS: SE TRABAJARA CON TERRACERIAS, TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTO, RECUBRIMIENTO CON PINTURA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

MONTO DE CONTRATO: \$6,139,947.67 CON IVA MONTO MODIFICADO

CONTRATISTA: ASIEL PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 25 DE AGOSTO DE 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 12 DE DICIEMBRE DE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO DE TERMINACION POR REPROGRAMACION:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ 1,841,984.30 30.00%
REAL: \$ 1,841,984.30 30.00%
PROGR. REAL

POR PARTIDA


1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

POR PARTIDA

PROGR. REAL

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

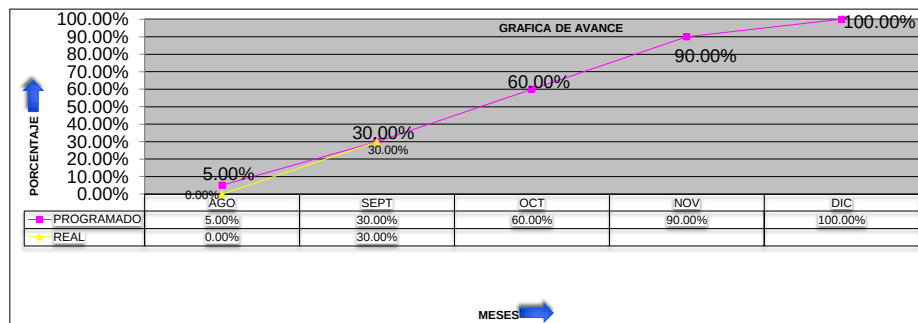

BAJARCUCE DE LINEA ELECTRICA DE C.F.E



NIVELACION DE CAPA DE BASE



TENDI



TRAT



DO DE SUBRASANTE



AMIENTO DE BASE
