



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 074/2022

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 20 de octubre de 2022, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES", los que fueron ejecutados por la empresa contratista MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V., representada Legalmente por el ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ e ING LENINN JESUS AYALA CHAVEZ, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, jefe del Departamento de Construcción Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 2 de mayo de 2022 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2022-PDM-33FM-SE-048 2022-PDM-SE-024.

El día 22 de junio de 2022, se formalizo el Contrato número 074/2022, por un monto de \$903,107.20 (novecientos tres mil ciento siete pesos 20/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 29 de junio de 2022 al 11 de octubre de 2022.

La fecha real de terminación de los trabajos: 11 de octubre de 2022.

Bitácora: fecha de inicio 29 de junio de 2022 y fecha de cierre 11 de octubre de 2022.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 074/2022

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A de C.V.	BKY-0021-0142036	11/10/2022	\$77,853.98

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							225,776.80
ESTIMACIÓN 1	29/06/2022	28/07/2022	94,798.72	23,699.68	25.00%	379.20	82,095.69
ESTIMACIÓN 2	29/07/2022	28/08/2022	165,206.48	41,301.62	25.00%	660.82	143,068.82
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	29/07/2022	28/08/2022	92,994.35	23,248.59	25.00%	371.98	80,533.10
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	29/08/2022	28/09/2022	165,256.65	41,314.16	25.00%	661.02	143,112.27
ESTIMACIÓN 5	29/09/2022	03/10/2022	43,224.78	1,806.20	25.00%	172.90	37,432.65
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	04/10/2022	07/10/2022	186,862.20	46,715.55	25.00%	747.44	161,822.67
ESTIMACIÓN 7	08/10/2022	11/10/2022	25,956.86	6,489.22	25.00%	103.82	22,478.64
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	08/10/2022	11/10/2022	4,239.74	1,060.15	25.01%	16.96	3,671.36
TOTAL			778,539.78	194,635.17		3,114.14	899,992.00

Costo de obra: \$903,106.14 (novecientos tres mil ciento seis pesos 14/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$1.06 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V., representada legalmente por el ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el ING LENINN JESUS AYALA CHAVEZ.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 074/2022**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

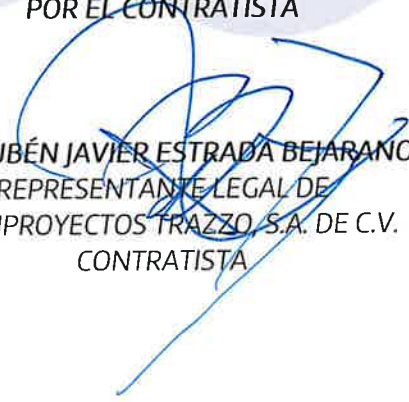

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA


ING LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO
REPRESENTANTE LEGAL DE
MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
