



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 039/2020**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 177, 186, 190 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **2 de septiembre de 2020**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SEMINARIO INTRODUCTORIO SECCIÓN SAN JOSÉ"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **28 de febrero de 2020** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2020-PDM-33FM-AT-020**.
- El día **4 de mayo de 2020**, se formalizo el Contrato número **039/2020**, por un monto de **\$903,491.37** (novecientos tres mil cuatrocientos noventa y un pesos **37/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **4 de mayo de 2020** al **17 de julio de 2020**.
- El **17 de junio de 2020**, se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal de ampliación del recurso **2020-PDM-33FM-AT-AM/004** para dar suficiencia al Convenio Adicional al Contrato.
- El **17 de julio de 2020**, se formalizo el Convenio Adicional al Contrato por un monto de **\$427,690.23** (cuatrocientos veintisiete mil seiscientos noventa pesos **23/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, quedando el importe total contratado por **\$1,331,181.60** (un millón trescientos treinta y un mil ciento ochenta y



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 039/2020

un pesos 60/100 M.N.), debiendo terminar los trabajos a más tardar el **31 de agosto de 2020**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **31 de agosto de 2020**.

Bitácora: fecha de inicio **4 de mayo de 2020** y fecha de cierre **31 de agosto de 2020**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNACIONALES FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0021-0065361	31/08/2020	\$105,181.05

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							361,396.54
ESTIMACIÓN 1	04/05/2020	02/06/2020	233,658.06	93,463.22	40.00%	934.64	161,691.37
ESTIMACIÓN 2	03/06/2020	02/07/2020	513,650.24	205,460.10	40.00%	2,054.60	355,445.96
ESTIMACIÓN 3	03/07/2020	01/08/2020	8,124.77	3,249.91	40.00%	32.50	5,622.34
ESTIMACIÓN 4	02/08/2020	31/08/2020	296,377.47	9,375.50	3.16%	1,185.50	331,736.79
TOTAL			1,051,810.54	311,548.73		4,207.24	1,215,893.00

Costo de obra: \$1,220,100.23 (un millón doscientos veinte mil cien pesos 23/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$111,081.33** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 039/2020**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

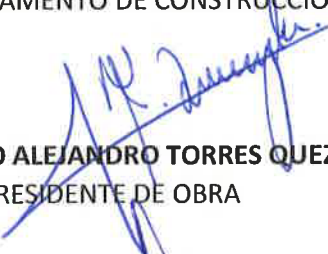
Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ
CONTRATISTA
