

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

INSTALACIÓN DE CISTERNA Y REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA- FOLIO 234- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: AAR-901228-868

AVIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	075/2024	MONTO CON IVA:	973,936.77	ANTICIPO:	25.00%	243,259.19	PERÍODO CONTRATADO:	03/07/2024	31/08/2024	ELABORADO:	26/06/2024
TOTAL CONTRATADO:			973,936.77	PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	FECHA	02/03/2024
	2024-PDM-PCAMREF/23-AT-002	IMPORTE	976,920.00
TOTAL APROBADO:			976,920.00
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:		8,550.56	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF			
ANTICIPO										243,259.19					243,259.19
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	03/07/2024	17/07/2024		307,813.96	-	-	76,953.49	267,798.15	615.63	615.63	-	-	266,566.89
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	18/07/2024	05/08/2024		270,828.15	-	-	67,707.04	235,620.49	541.66	541.66	-	-	234,537.17
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	06/08/2024	27/08/2024		99,687.32	-	-	24,921.83	86,727.97	199.37	199.37	-	-	86,329.23
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	06/08/2024	27/08/2024		85,925.40	-	-	21,481.35	74,755.10	171.85	171.85	-	-	74,411.40
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT		EXT	06/08/2024	27/08/2024		69,205.22	-	-	17,301.31	60,208.54	138.41	138.41	-	-	59,931.72
				TOTAL		833,460.05	-	-	206,365.02	968,369.44	1,666.92	1,666.92	-	-	965,035.60


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	83,346.01	FECHA:	27/08/2024
MONTO:	83,346.01		

COSTO DE LA OBRA:	966,813.66	FACTURADO:	968,369.44	AMORTIZACIÓN:	241,703.42	RET. CMIC	1,666.92	RET. DIF:	1,666.92	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	6,223.11	SALDO:	8,550.56	POR AMORTIZAR:	1,555.77			PERÍODO REAL	03/07/2024		27/08/2024


Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho propiamente le corresponde, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.




ING. JUAN GABINO DURÁN RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE
CONTRATISTA

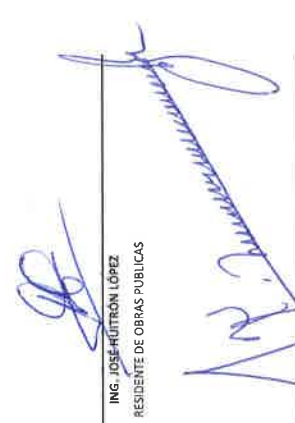


ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
