

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLÍGONO 2).

Proyectos y Construcciones Antares, S. De R.L. De C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: PCA-011019-URZ

CONTRATO:	038/2024	MONTO CON IVA:	5,202,924.65	ANTICIPO:	30.00%	1,560,877.39	PERÍODO CONTRATADO:	08/05/2024	-	04/10/2024	ELABORADO:	03/05/2024
CONVENIO:		MONTO CON IVA:	907,848.19								ELABORADO:	11/09/2024
		TOTAL CONTRATADO:	6,110,772.84									

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
2024-PDM-FAIS-OP-005	6,111,376.84	19/03/2024
2024-PDM-FAIS-OP-C/031	606.01	12/11/2024
TOTAL APROBADO:	6,110,772.83	

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO										1,560,877.39				1,560,877.39
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	08/05/2024	31/05/2024		599,706.33	-	-	179,911.90	486,961.54	1,199.41	1,199.41	-	484,562.72
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/06/2024	15/06/2024		1,283,826.12	-	-	385,147.84	1,042,466.80	2,567.65	2,567.65	-	1,037,331.50
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	16/06/2024	15/07/2024		1,617,243.20	-	-	485,172.96	1,313,201.48	3,234.49	3,234.49	-	1,306,732.50
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC		EXC	16/07/2024	31/07/2024		964,844.47	-	-	295,351.27	776,612.46	1,929.69	1,929.69	-	772,753.08
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	01/08/2024	30/08/2024		19,659.46	-	-	-	22,804.97	39.32	39.32	-	22,726.33
ESTIMACIÓN 6 CONV		CONV	31/08/2024	09/09/2024		748,415.83	-	-	-	868,162.36	1,496.83	1,496.83	-	865,168.70
ESTIMACIÓN 7 CONV		CONV	10/09/2024	27/09/2024		34,211.91	-	-	-	39,685.82	68.42	68.42	-	39,548.98
				TOTAL		5,267,907.62	-	-	1,345,583.97	6,110,772.82	10,535.81	10,535.81	-	6,089,701.20


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	MONTO:	526,790.76	FECHA:	27/09/2024
-----------------------------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	6,110,772.83	FACTURADO:	6,110,772.83	AMORTIZACIÓN:	1,560,877.39	RET. CMIC	10,535.81	RET. DIF:	10,535.81	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	-	SALDO:	-	POR AMORTIZAR:	-			PERÍODO REAL	08/05/2024	-	27/09/2024


Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



Ingeniero José Luis Corral Estrada
SUPERINTENDENTE




Arquitecto Hiram Lizano Hernández
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

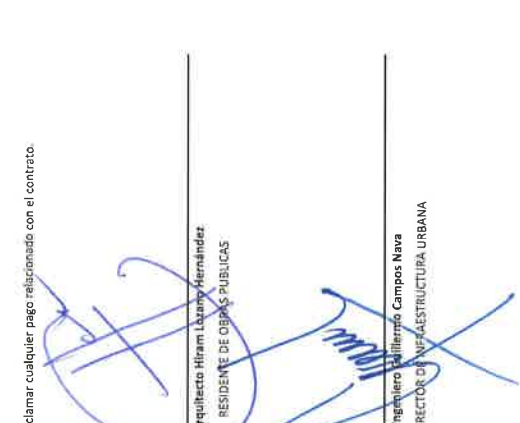

Ingeniero Guillermo Campos Nava
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA



Ingeniero Perla Aguirre Márquez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA



Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Proyectos y Construcciones Antares, S. De R.L. De C.V.
C. Sául Omar Simmental Ortega
CONTRATISTA
