



GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA

GCM971215128
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
FRANCISCO XAVIER MINA, 1000, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua,
Chihuahua, México
Tel. 6144380177

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 31000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
VICTORIA, 14 QUINTO PISO, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua,
México

Factura 394

FOLIO FISCAL (UUID)
F88A070C-9759-44F4-9BEE-3D0E35258811
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506306671
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-14T13:15:12
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-06-14T12:56:40
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31000

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo)

055290D6-C2A2-4FC9-88E1-6CA3105FFB2

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV. OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES ESTIMACION 1 (UNO) SEGUN CONTRATO No. 021/2023 FIRMA DEL CONTRATISTA ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 718,493.98 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 179,623.50 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 1,436.99 D.I.F. DEL 0.2% \$ 1,436.99 SUMA \$ 2,873.98 NETO A RECIBIR \$ 622,215.78 Clave Prod. Serv. - 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 538870.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 86,219.28	\$ 538,870.48	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 538,870.48

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS,
76/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 538,870.48
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 86,219.28
TOTAL \$ 625,089.76



SELLO DIGITAL DEL CFDI

grR0yZnAw+Sv+hYSWLaZoJfE091bEO7ABpe/qjOujg8bxEbqKGiHQzrGlatP5NC21ucwbhloO6NcLM1nFZR3RLDgehl2QWUU4ix1PRkHLXRUpj0WnbvA3vVQFGzaZ
pnWgYtTowvRfX2t+L5yqbnObnPiwplyO1zeSto82j3WYXhSEHUCP4aWhsBZBPoSf9tiOHIZZasLvKosPB7kZW/rDfQYrGVHJXEB1fWxig08DVe8X/DCZ3wtFbauBAXRi
q8v7dUEKZAIvSCVOPJkblmVlcoEIPa2P1eXWUUT7AdYzV9y1hL1Esn9VFEoU9npKee8GMvFFNjVE/wR8S3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MEtlu+Xv5Wp0UYN/EV8QtrZob3p29uRaUxMQzhYVU6HK1q1KtqZBGLki9Q14JAig8NalICZKIWH+niHkUP2Mah3ciBKF3gaxS6ZSE8I7bbKz5Ozvn8r5kTwa/lvzMQrsM
bdZ+VNxmX9hp8IMKy+SDg6ZdHoOAKOZp8f0pNXcuPQXf+IHvntQ5Uk6F0gmLHfr6a544OlimiuGWFiZNN/AyV2FjgQrS+MTbmPDYz++7bsKshTnT3ikH7KN5oLvlug
Dzo5WsfAJHkz9TvrZ+OTq6BtFK6iRi793nVqZ3yUjYVhp+nS18mli9npaCPfSkHuPUHHLby3ctJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F88A070C-9759-44F4-9BEE-3D0E35258811|2023-06-14T13:15:12|STA0903206B9|grR0yZnAw+Sv+hYSWLaZoJfE091bEO7ABpe/qjOujg8bxEbqKGiHQzrGlatP5NC21ucwbhloO6NcLM1nFZR3RLDgehl2QWUU4ix1PRkHLXRUpj0WnbvA3vVQFGzaZpnWgYtTowvRfX2t+L5yqbnObnPiwplyO1zeSto82j3WYXhSEHUCP4aWhsBZBPoSf9tiOHIZZasLvKosPB7kZW/rDfQYrGVHJXEB1fWxig08DVe8X/DCZ3wtFbauBAXRi q8v7dUEKZAIvSCVOPJkblmVlcoEIPa2P1eXWUUT7AdYzV9y1hL1Esn9VFEoU9npKee8GMvFFNjVE/wR8S3w==|00001000000506204896||

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FODESM	CONTRATO No. 021/2023	CONTRATADOS
OBRA: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES	ESTIMACIÓN No. EST. 1 (UNO)	\$ 2,905,532.82 CON IVA
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD	PERÍODO EJEC. DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023	
UBICACIÓN: AV OCAMPO; TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 833,453.02 CON IVA
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC GCM 971215 128	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 833,453.02 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 718,493.98	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 718,493.98	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	1,436.99
0.2% DIF	\$	1,436.99
SUMA DESCUENTOS	\$	2,873.98
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	718,493.98
AMORT ANTICIPO	\$	179,623.50
SUB-TOTAL	\$	538,870.48
I.V.A.	\$	86,219.28
TOTAL	\$	625,089.76
(CON LETRA)		
(SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	2,873.98
SALDO NETO A RECIBIR	\$	622,215.78

AUTORIZO	ELABORO
ING. LENIN JESUS AYALA CHAVEZ	GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ	
JEFA DEL DEPTO DE CONSTRUCCION URBANA	
Vo. Bo.	
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
Vo. Bo.	

CHIHUAHUA, CHIH.,

12 DE JUNIO DEL 2023

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE:
(SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 78/100 M.N.)

\$ 622,215.78
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. EST. 1 (UNO) CONTRATO No. 021/2023 POR LA CANTIDAD DE : \$ 2,905,532.82

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES
MARES

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 718,493.98

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 179,623.50

SUBTOTAL \$ 538,870.48

IVA \$ 86,219.28

TOTAL \$ 625,089.76

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.2%	1,436.99
D.I.F. DEL 0.2%	1,436.99
SUMA	2,873.98

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$	2,905,532.82
\$	-
\$	-
\$	833,453.02
\$	833,453.02
\$	2,072,079.80

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$	726,383.21
\$	-
\$	208,363.26
\$	208,363.26
\$	518,019.95

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

0.2% D.I.F.

0.2% C.M.I.C.

ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	1,436.99
ACUMULADO ACTUAL	\$	1,436.99

\$	-
\$	1,436.99
\$	1,436.99

R E C I B I M O S

GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.
GCM 971215 128

OBRA: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; UBICACIÓN AV OCAMPO; TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA No. CONTRATO: 021/2023
ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES ESTIMACIÓN No. EST. 1 (UNO)
MARES

CONTRATIST GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V. PERÍODO: DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

I	<u>NORMALES</u> REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO	\$ 718,493.98
		\$ 718,493.98

EXCEDENTES

EXTRAS

SUBTOTAL \$	718,493.98
I.V.A. \$	114,959.04
TOTAL \$	833,453.02



POR EL CONTRATISTA



POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS
HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

No. CONTRATO: 021/2023

ESTIMACIÓN No. EST. 1 (UNO)

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.
PERIODO: DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
1	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50 kg/cm2 de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,001.84	360.22	0.00	\$ 1,986.80	\$ 718,493.98
4	Perforación para pasajuntas en juntas de construcción perimetrales a losas existentes con losas nuevas mediante equipo menor (rotomartillo y broca especial para concreto y generador de energía de 500 watts), hasta 2.54 cm de diámetro y hasta 38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1,000.00	8.00	0.00	\$ 99.93	\$ 799.44
5	Reubicación de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: materiales, excavación manual, relleno compactado, retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	23.00	8.00	0.00	\$ 251.18	\$ 2,009.44


POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 021/2023		CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR MONTANA BLANCA S.A. DE C.V.	
OBRA : REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES			
No DE ESTIMACION: EST. 1 (UNO)		PERIDOO : DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023	

CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS				CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	UNIDAD
1		LARGO	ANCHO	AREA				
Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales.		41.80	3.35	140.03	TRIANGULO		360.22	m2
Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por		46.80	3.13	146.48				
reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar		3.80	1.95	3.71				
indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la		5.73	3.86	22.12				
prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50		24.65	3.25	80.11				
kg/cm2 de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		-2.93	11.00	-32.23				
		TOTAL			360.22			



ING. LEANN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA



ING. JAVIER GARFIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO : 021/2023		CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA S.A. DE C.V.	
OBRA : REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES			
No DE ESTIMACION: EST. 1 (UNO)		PERIDOO : DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023	

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS			CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	UNIDAD
4 Perforación para pasajuntas en juntas de construcción perimetrales a losas existentes con losas nuevas mediante equipo menor (rotomartillo y broca especial para concreto y generador de energía de 500 watts), hasta 2.54 cm de diámetro y hasta 38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	LARGO 8.00	ANCHO 1.00	AREA 8.00		8.00	m2
	TOTAL 8.00					

ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAVIER GARFIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO	021/2023	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA S.A. DE C.V.
OBRA :	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES		
No DE ESTIMACION:	EST. 1 (UNO)	PERIDOO :	DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023


CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS	VOLUMEN A PAGAR	UNIDAD
5 Reubicación de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: materiales, excavación manual, relleno compactado, retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ZONA A	LARGO 8.00			m
	TOTAL			8.00	


ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. JAVIER GARFIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO :	021/2023	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA S.A. DE C.V.
OBRA :	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAIMPO, ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES		
No DE ESTIMACION:	EST. 1 (UNO)	PERIODO :	DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023

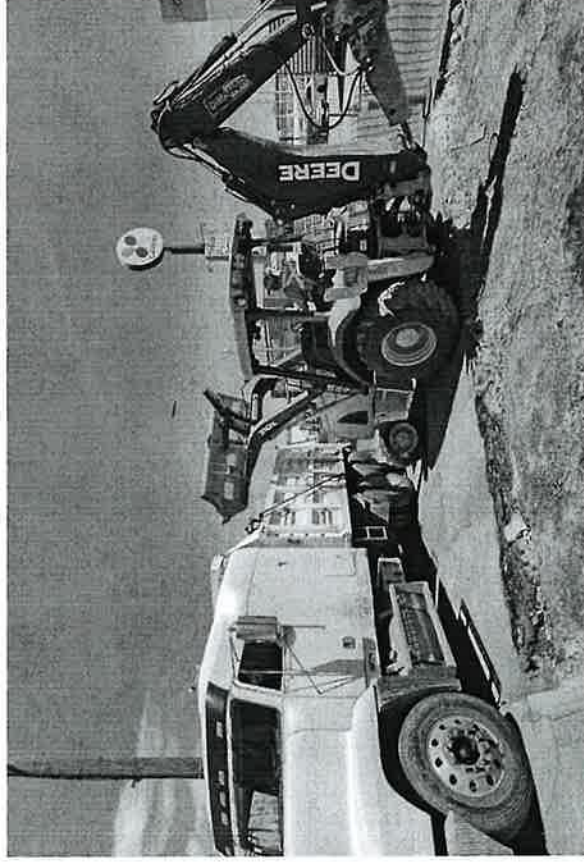




RESIDENTE


CONTRATISTA

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO :	021/2023	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA S.A. DE C.V.
OBRA :	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES		
No DE ESTIMACION:	EST. 1 (UNO)	PERIODO :	DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023

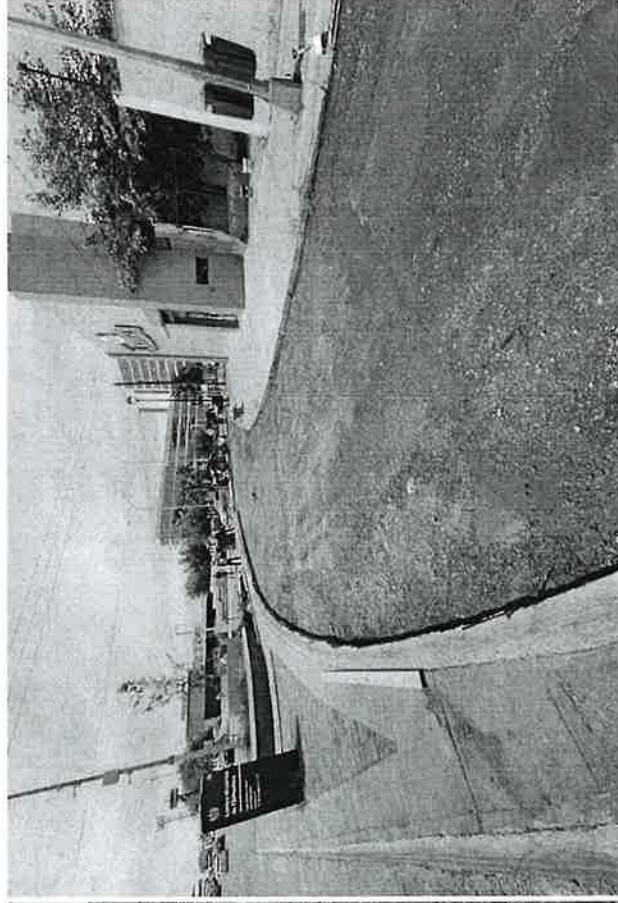




RESIDENTE




CONTRATISTA

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO :	021/2023	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA S.A. DE C.V.
OBRA :	REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO, ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES HASTA BLVD. PUENTES MARES		
No DE ESTIMACION:	EST. 1 (UNO)	PERIODO :	DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023

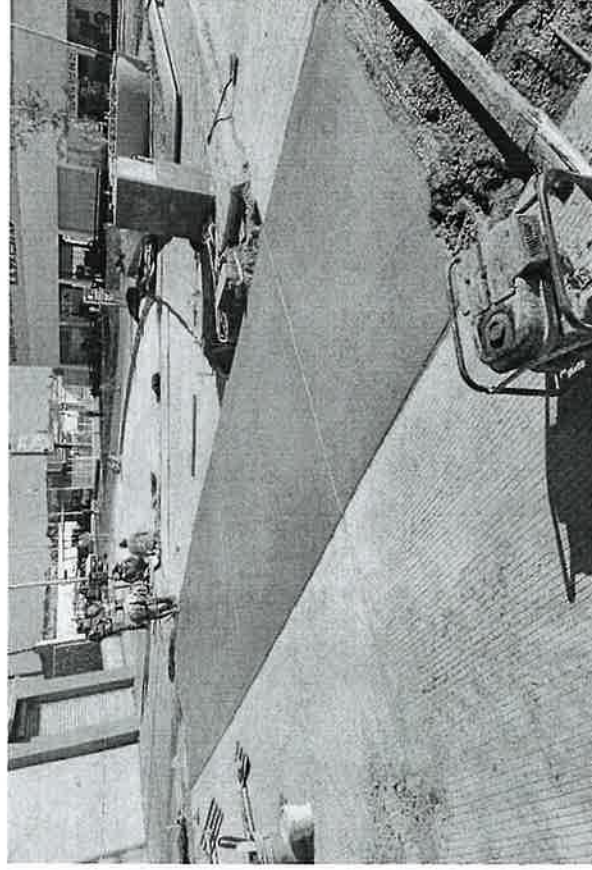




RESIDENTE


CONTRATISTA

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO :	021/2023	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA S.A. DE C.V.
OBRA :	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES		
No DE ESTIMACION:	EST. 1 (UNO)	PERIODO :	DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023

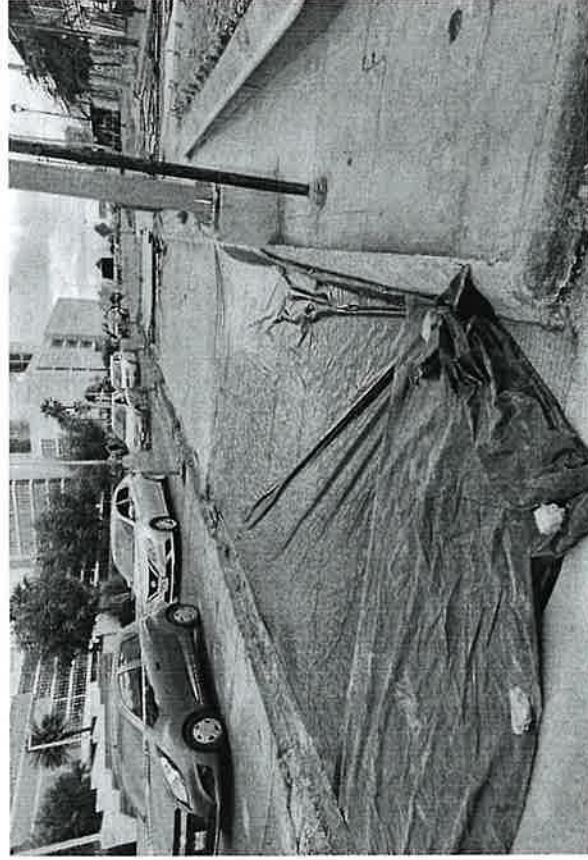




RESIDENTE


CONTRATISTA

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION

CONTRATO :	021/2023	CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR MONTAÑA BLANCA S.A. DE C.V.
OBRA :	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO, ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES		
No DE ESTIMACION:	EST. 1 (UNO)	PERIODO :	DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2023

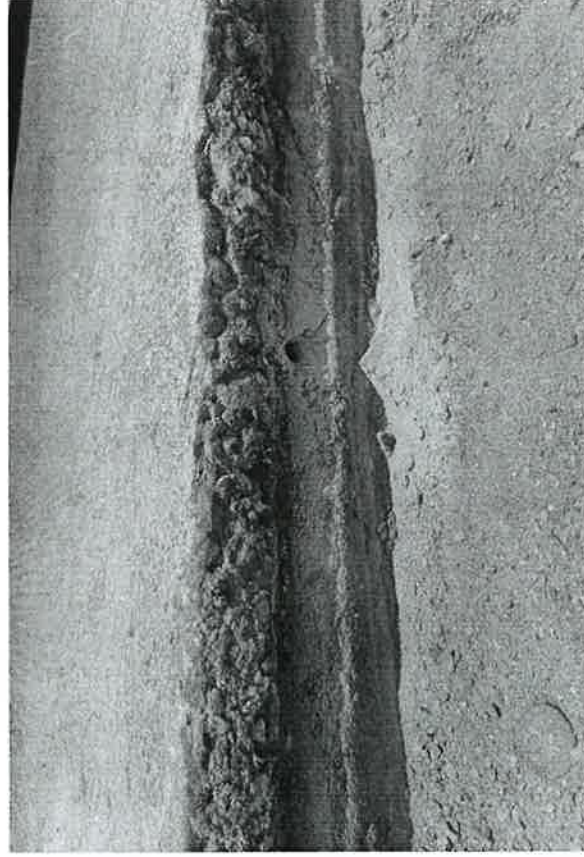


RESIDENTE


CONTRATISTA
