



I - Factura - VERSIÓN 4.0

124

No. de serie del CSD del emisor

00001000000507980675

Fecha y Hora de emisión

2023-09-29T11:25:49

Folio Fiscal

3BE7A1FF-5EED-11EE-BF56-00155D012007

Lugar de expedición: 31184

Tipo de Cambio: 1.00

Emisor

RFC: GCS160311ID6
RAZÓN SOCIAL: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC
RIO MADEIRA 2026
COL. RIBERAS DE SACRAMENTO CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA, MEX CHIHUAHUA 31184
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2023-09-29T11:25:50

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14 QUINTO PISO
COL. CENTRO, CHIHUAHUA C.P.: 31000
ESTADO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEX
TELEFONOS: -

Regimen Fiscal Receptor:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:
31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONTRATO NO. 050/2023-ESTIMACION NO. 2 (DOS) CONSISTE EN: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO. ALCANCE DE LA ESTIMACION: \$352,057.44 AMORTIZACION: \$88,014.36 DESCUENTOS C.M.I.C. (0.2%): \$704.11 D.I.F. (0.2%): \$704.11 SUMA DE LOS DESCUENTOS: \$1,408.22 IMPORTE NETO A RECIBIR: \$304,881.75 ClaveProdServ: 72141000 - Servicios de construcción de autopistas y carreteras Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$264,043.08 Tasa - 0.160000 Importe - \$42,246.89	264,043.08	264,043.08

CFDI Relacion

Tipo Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo
UUID: 1E448468-169C-11EE-9E76-00155D012007

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA

TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 97/100 MXN

Subtotal

264,043.08 MXN

IVAT 0.160000

42,246.89 MXN

Total

306,289.97 MXN

Sello digital del emisor

DmYfmaJ/f0qKUvHTuKoCbhvY9opvUvPAHg8ay0iXEYMCqKrhXG97keS1zlvT3ff0ZJe1cKDrLXW6As89smlzvcyDjCbPN/8JZWmciFYV78xx9ZqSLFp7
IC89pnQ4PQK3fZB3UpRpZQoUOf2DFw2mMtZKCLMEQovlzCUdY34KRt856U9XaoMEFL03Ck/T2jVZ4rHL4mj62wzO9SKItJXJGM/G+HQ3KlVn/Ni7/6nuWq
DLJtU4simQBDfZLM5xcYF+ieJCIEFTPhnEY1sx6EYvN5AZLo8ORBmAt5RdWfHlXqN4wBWRBB/vgWQ3wgUhsCXyJkrk+8eP4PVHTnRwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3BE7A1FF-5EED-11EE-BF56-00155D012007|2023-09-

29T11:25:50|TBN040609RKA|DmYfmaJ/f0qKUvHTuKoCbhvY9opvUvPAHg8ay0iXEYMCqKrhXG97keS1zlvT3ff0ZJe1cKDrLXW6As89smlzvcyDjCbPN/
8JZWmciFYV78xx9ZqSLFp7IC89pnQ4PQK3fZB3UpRpZQoUOf2DFw2mMtZKCLMEQovlzCUdY34KRt856U9XaoMEFL03Ck/T2jVZ4rHL4mj62wzO9SKItJ
XJGM/G+HQ3KlVn/Ni7/6nuWqDLJtU4simQBDfZLM5xcYF+ieJCIEFTPhnEY1sx6EYvN5AZLo8ORBmAt5RdWfHlXqN4wBWRBB/vgWQ3wgUhsCXyJkrk
+8eP4PVHTnRwQ==|00001000000504587508||

Sello digital del SAT

nf2xuvKX7RI1kuOMG955234cUa2nBZ9HA64F1bGuoB3B4PF8CjHS1K1w9h5PFyKhamULa8ka0epP93RtkLHKfRX78ZNxtp0VcCwazkTX3iBDRpFW6/Zu
j3JoPbOLUfeehb9lx1gN9Vf+8pPKnoWpPm5YCYr1R/dP3vzTg6xN0nU+ZQUynMYeJGr/3lqyZL2TaZZb/yRn+a3E05mSF626MqfKofEcKJX/Xml5FYtkNu
yrpnsPOK/g2iXtMSBJ83KVCfrcQIPz9I07VP0JQQUorhceYrI60ZLUmpqoYxJL4uVnJmlXsAiqSJPZg4rHSivgUUBJD/bxakt+vkww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.comprobantes-fiscales.com.mx

Página 1 de

1



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cdf:Comprobante
  Sello="DmYfmaJ/f0qKUvHTuKoChbvY9opUvPAHq8ay0iXEYMCqKrhjXG97keS1zIV3ff0ZJe1cKDrLXW6As89smIzvcyzDjCbPN/8JZWmciFVW78xx9ZqSLFp67IC89pnQ4PQK3fZB3JpRpZ0oUOf2DFw2mMtzr
  LugarExpedicion="31184" Total="306289.97" SubTotal="264043.08" FormaPago="99" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" Exportacion="01"
  Certificado="MITGETCA/mgAwIbAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDC5ODAzNzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDDBdVVRPUKIEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVDk
  NoCertificado="00001000000507980675" Fecha="2023-09-29T11:25:49" Folio="124" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/cfd/4/cfdv40.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="1E448468-169C-11EE-9E76-00155D012007"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC" Rfc="GCS160311ID6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" Rfc="MC1651010V22" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="31000" UsoCFDI="T01">
    - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="264043.08" ValorUnitario="264043.08" Description="CONTRATO NO. 050/2073 ESTIMACION NO. 2 (DOS) CONSISTE EN: ACONDICIONAMIENTO Y/O
        REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO. ALCANCE DE LA ESTIMACION: $352,057.44 AMORTIZACION: $88,014.36 DESCUENTOS C.M.I.C. (0.2%): $704.11 D.I.F. (0.2%):
        $704.11 SUMA DE LOS DESCUENTOS: $1,408.22 IMPORTE NETO A RECIBIR: $304,881.75" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141000">
          - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="42246.89" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="264043.08"/>
            </cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="42246.89" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="264043.08"/>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Conceptos TotalImpuestosTrasladados="42246.89">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="42246.89" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="264043.08"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1" UUID="38E7A1FF-5EED-11EE-BF56-00155D012007"
        SelloSAT="nl2xuvKXX/Rl1ku0MG955234cUa2nBZ9HA64F1bGuoB384PF8CJHS1tK1w9h5PFyKHamlUa8ka0epP93RtkLHKFRX78ZNXtp0VCwazkTX3iBDBRpFW6/Zuj3JpPb0LUfeehb91x1gN9Vf+8t
        NoCertificadoSAT="00001000000504587508"
        SelloCFD="DmYfmaJ/f0qKUvHTuKoChbvY9opUvPAHq8ay0iXEYMCqKrhjXG97keS1zIV3ff0ZJe1cKDrLXW6As89smIzvcyzDjCbPN/8JZWmciFVW78xx9ZqSLFp67IC89pnQ4PQK3fZB3JpRpZ0oU
        RfcProvCertif="TBN040609RKA" FechaTimbrado="2023-09-29T11:25:50" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  </cfdi:Comprobante>
</cdf:Comprobante>
```



040609RKA" Fecha Imbra



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FAFM			CONTRATO: 050/2023	
OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO			ESTIMACIÓN: 2 (DOS)	
			PERIODO DE EJECUCIÓN: 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
			ESTADO FINANCIERO CON IVA	
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD	IMPORTE CONTRATADO:	\$ 567,859.85
	28.1936491 N	108.3671516 O	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 110,995.68
UBICACIÓN COLONIA OCAMPO			IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 408,386.63
CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.			IMPORTE ACUMULADO:	\$ 519,382.31
RFC: GCS-160311-ID6			IMPORTE POR ESTIMAR:	\$ 48,477.54

TIPO DE OBRA	IMPORTES S/IVA	OBSERVACIONES:
CONCEPTOS NORMALES:	\$ 352,057.44	
CONCEPTOS EXCEDENTES:	\$ -	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ -	
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	\$ -	
REINTEGRO DE LA RETENCIÓN ANTERIOR:	\$ -	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN S/IVA	\$ 352,057.44	

DESCUENTOS	
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES)	\$ -
C.M.I.C. (0.2%)	\$ 704.11
D.I.F. (0.2%)	\$ 704.11
S.I.V.C. (0.5%)	\$ -
SUMA DE LOS DESCUENTOS	\$ 1,408.22
RESUMEN	
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN	\$ 352,057.44
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 88,014.36
SUBTOTAL	\$ 264,043.08
I.V.A.	\$ 42,246.89
TOTAL (IMPORTE FACTURADO)	\$ 306,289.97
TOTAL CON LETRA	
(TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 1,408.22
IMPORTE NETO A RECIBIR	\$ 304,881.75

ELABORÓ

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.

CONTRATISTA

REVISÓ

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AUTORIZÓ

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$304,881.75 (TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 (DOS), DEL CONTRATO 050/2023, POR EL TRABAJO DENOMINADO: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO.

1 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN (IMPORTES SIN IVA)

SUMA DE LOS TRABAJOS:	352,057.44
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	-
REINTEGRO:	-
ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:	352,057.44
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	88,014.36
SUBTOTAL:	264,043.08
IVA (16%):	42,246.89
IMPORTE DE LA FACTURA:	306,289.97
IMPORTE NETO A RECIBIR:	304,881.75

2 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO (LOS IMPORTES NO LLEVAN IVA)

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):	-
C.M.I.C. (0.2%):	704.11
D.I.F. (0.2%):	704.11
S.I.V.C. (0.5%):	-
SUMA DE DESCUENTOS:	1,408.22

3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO:	567,859.85
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:	-
ACUMULADO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN:	110,995.68
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN:	408,386.63
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	519,382.31
IMPORTE POR ESTIMAR:	48,477.54

4 RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO (SEGÚN FACTURA):	141,964.96
ACUMULADO AMORTIZADO ANTERIOR:	27,748.92
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	102,096.66
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	129,845.58
IMPORTE POR AMORTIZAR:	12,119.38

5 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO

	C.M.I.C. (0.2%):	D.I.F. (0.2%):	S.I.V.C. (0.5%):
ACUMULADO ANTERIOR:	191.37	191.37	-
ESTA ESTIMACIÓN:	704.11	704.11	-
ACUMULADO ACTUAL:	895.48	895.48	-

RECIBIMOS

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
GCS-160311-ID6

HOJA DE PARTIDAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
TIPO DE TRABAJOS	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE
NORMALES			352,057.44
	I	PRELIMINARES	
	II	KIOSKO	149,135.81
	III	HERRERIA	25,082.94
	IV	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
		OBRA CIVIL	11,571.00
EXCEDENTES	V	KIOSKO	52,512.65
		OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO	113,755.04
			-
EXTRAORDINARIOS	I	PRELIMINARES	
	II	KIOSKO	
SUBTOTAL:			352,057.44
IVA:			56,329.19
TOTAL:			408,386.63

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
CONTRATISTA


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA DE CONCEPTOS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO									
ESTIMACIÓN 2 [DOS]											
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023											
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMENES				PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
			PROYECTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ESTIMADO					
NORMAL											
II											
KIOSKO											
2.5	Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Ced. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	KG	216.70	216.70	-	216.70	88.51		19,180.12		
2.6	Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	KG	351.90	345.71	-	345.71	90.78		31,383.55		
2.7	Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: pñjado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación P.U.O.T.	M2	39.47	39.47	-	39.47	2,307.00		91,057.29		
2.8	Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbrea, pñjado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M	21.00	21.00	-	21.00	357.85		7,514.85		
III											
HERRERIA											
3.1	Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M	8.68	8.68	-	8.68	2,889.74		25,082.94		
IV											
INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
OBRA CIVIL											
4.1	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	60.00	37.50	-	37.50	308.56		11,571.00		
KIOSKO											
4.2	Suministro e instalación de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soporteria, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza	4.00	4.00	-	4.00	5,335.89		21,343.56		



GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
CONTRATISTA



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA DE CONCEPTOS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO									
ESTIMACIÓN 2 (DOS)											
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023											
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PROYECTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ESTIMADO					
4.3	Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" Incluye copies de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	40.00	31.00		31.00	131.15	4,065.65			
4.4	Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	50.00	37.50		37.50	306.97	11,511.38			
4.5	Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	2.00		2.00	3,781.12	7,562.24			
4.6	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "I" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	3.00	3.00		3.00	108.85	326.55			
4.7	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	2.00		2.00	92.99	185.98			
4.8	Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xhhw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	60.00	44.50		44.50	69.00	3,070.50			
4.9	Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	300.00	142.80		142.80	31.14	4,446.79			
5.3	OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	1.00		1.00	31,401.65	31,401.65			
5.4	Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	1.00		1.00	26,194.01	26,194.01			
5.6	Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	7.00	7.00		7.00	2,917.42	20,421.94			



GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
CONTRATISTA



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA DE CONCEPTOS[illegible]


GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE
CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

[PÁGINA 3/3]

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

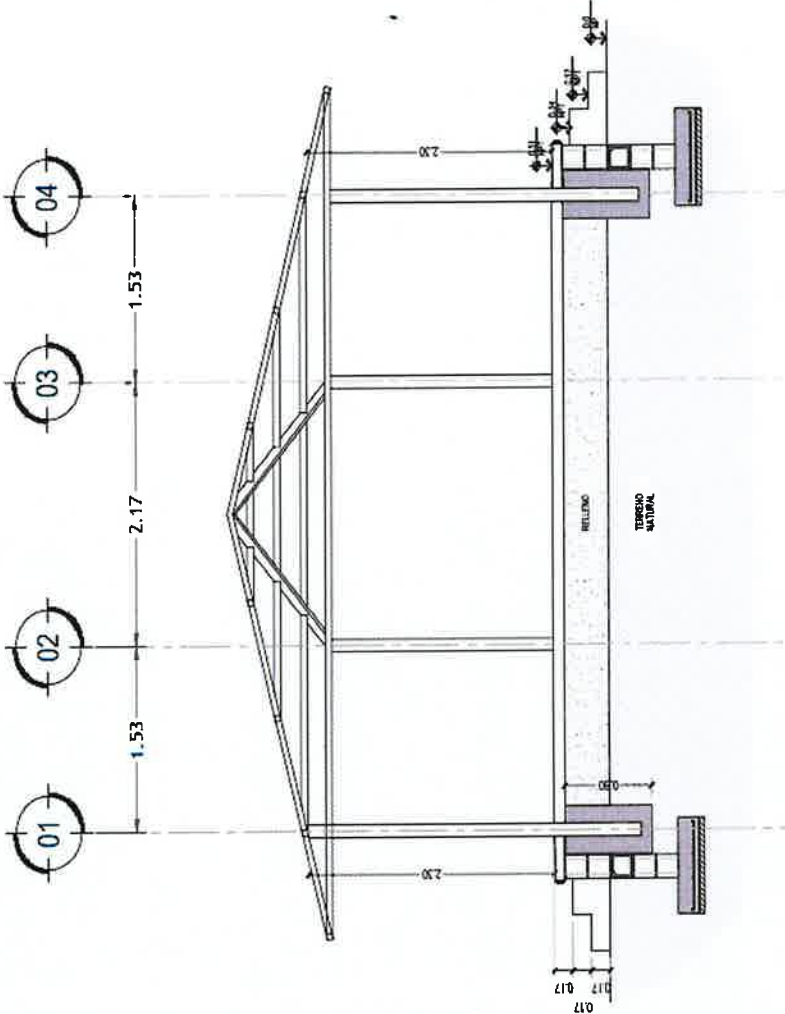
GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO			
ESTIMACIÓN 2 (DOS)					
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO			
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS			
II. KIOSKO					
2.5	Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Ced. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	# COLUMNAS	ALTO	KG/M LINEAL	TOTAL UNIDAD
		8	x 3	x 9.03 =	216.70
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		216.70			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		216.70			
POR EJERCER:		-			
EXCEDENTE:					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		216.70			
		SUMA DEL VOLUMEN:		216.70	KG

ING. JORGE ROSALVO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
II. KIOSKO			
2.5			
Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Ced. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		216.70	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		216.70	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		216.70	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO														
ESTIMACIÓN 2 (DOS)																
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023																
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.																
II. KIOSKO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA														
2.5	Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Ced. 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>216.70</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>216.70</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>216.70</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	216.70	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	216.70	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	216.70	
RESUMEN DE VOLUMEN																
PROYECTO:	216.70															
ACUMULADO ANTERIOR:	-															
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	216.70															
POR EJERCER:	-															
EXCEDENTE:	-															
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	216.70															

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
II. KIOSKO			
2.6	Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquídica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta evocación P.U.O.T	PESO POR PZA	UNIDAD
		4.05 x	345.71
		85.36	=
			345.71
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	351.90		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	345.71		
POR EJERCER:	6.19		
EXCEDENTE:			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	345.71		
SUMA DEL VOLUMEN:		345.71	KG

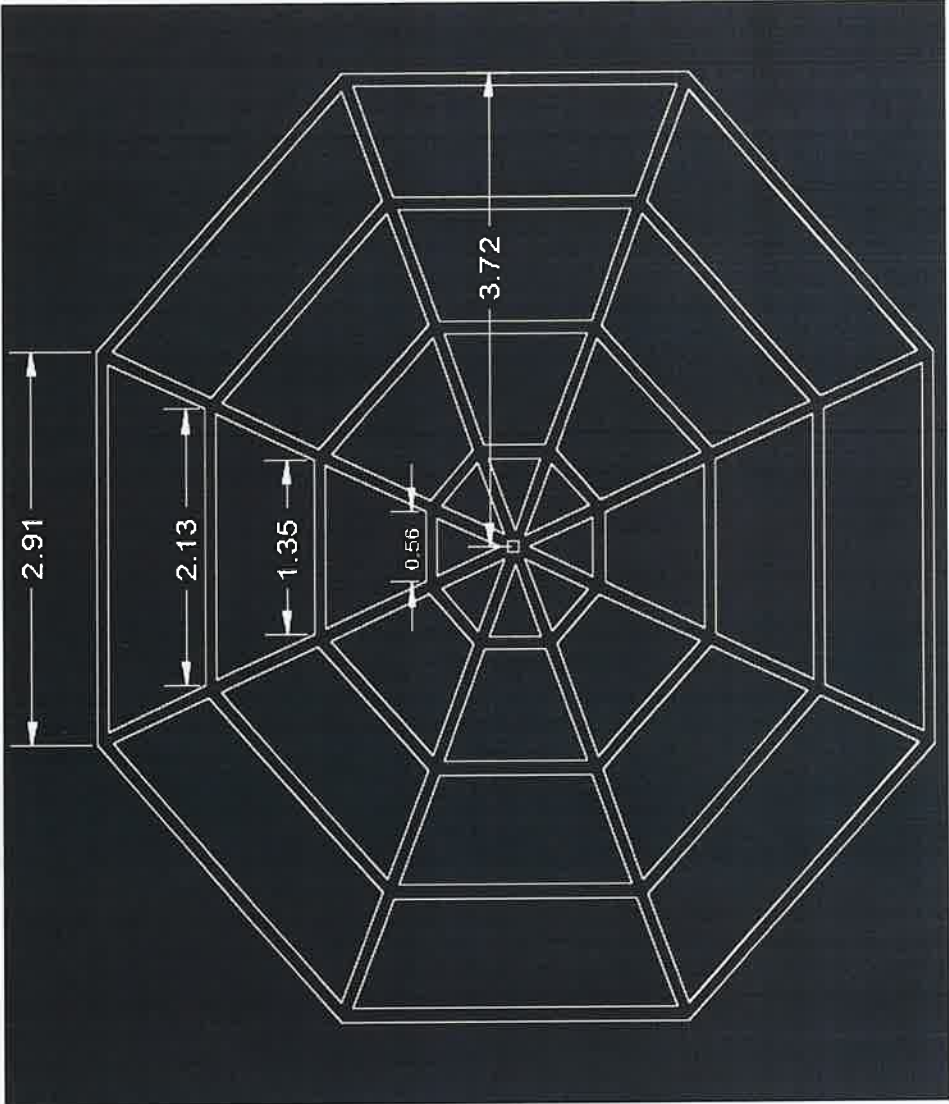
**ROSAUO A
ENDENTE**

ING. JORGE ROSARIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

Paul Brubaker

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO															
ESTIMACIÓN 2 (DOS)																	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023																	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO															
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS															
II. KIOSKO																	
2.6	Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta evocación P.U.O.T																
		<table><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>351.90</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>-</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>345.71</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>6.19</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>345.71</td></tr></table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	351.90	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	345.71	POR EJERCER:	6.19	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	345.71
RESUMEN DE VOLUMEN																	
PROYECTO:	351.90																
ACUMULADO ANTERIOR:	-																
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	345.71																
POR EJERCER:	6.19																
EXCEDENTE:	-																
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	345.71																



ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
II. KIOSKO			
2.6			
Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2 "x 2 " Blanco. Incluye: habilitado, acabado con de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta evocación P.U.O.T			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		351.90	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		345.71	
POR EJERCER:		6.19	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		345.71	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO																
ESTIMACIÓN 2 (DOS)																		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023																		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO																
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS																
II. KIOSKO																		
2.7	Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: pñjado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación P.U.O.T.	LARGO	ANCHO	# PZAS	TOTAL	UNIDAD												
		3.72	x 1.3	x 8	= 39.47													
RESUMEN DE VOLUMEN <table><tr><td>PROYECTO:</td><td>39.47</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>-</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>39.47</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td></td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td></td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>39.47</td></tr></table>							PROYECTO:	39.47	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47	POR EJERCER:		EXCEDENTE:		A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47
PROYECTO:	39.47																	
ACUMULADO ANTERIOR:	-																	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47																	
POR EJERCER:																		
EXCEDENTE:																		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47																	
SUMA DEL VOLUMEN:					39.47	M2												

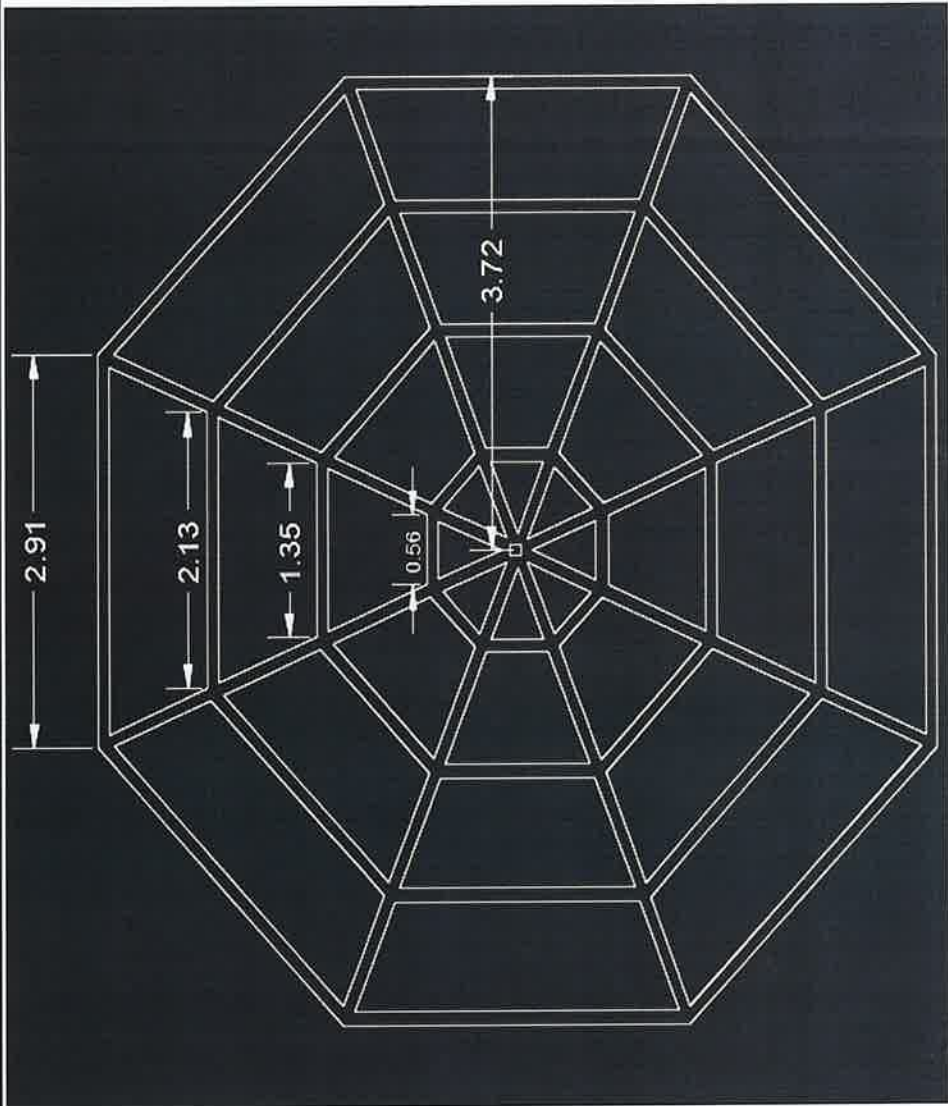
GE ROSALIO AG
TENDENTE

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

Shane Evans

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO															
ESTIMACIÓN 2 (DOS)																	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023																	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO															
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS															
II. KIOSKO																	
2.7	Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su óptima colocación P.U.O.T.																
		<table><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>39.47</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>-</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>39.47</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>39.47</td></tr></table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	39.47	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47
RESUMEN DE VOLUMEN																	
PROYECTO:	39.47																
ACUMULADO ANTERIOR:	-																
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47																
POR EJERCER:	-																
EXCEDENTE:	-																
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47																



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JORGE ROSALÍO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO													
ESTIMACIÓN 2 (DOS)															
PERIODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023															
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.															
UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA													
II. KIOSKO															
2.7	Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: pñjado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ónea colocación P.U.O.T.														
<table><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>39.47</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>-</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>39.47</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>-</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>39.47</td></tr></table>			RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	39.47	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:
RESUMEN DE VOLUMEN															
PROYECTO:	39.47														
ACUMULADO ANTERIOR:	-														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	39.47														

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
II. KIOSKO			
2.8	Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATE/A Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbraera, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	LARGO 3.72 x	# PZAS 8 = TOTAL 29.76
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		21.00 /	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		29.76 /	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		8.76 /	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		21.00 /	
		SUMA DEL VOLUMEN:	29.76 M

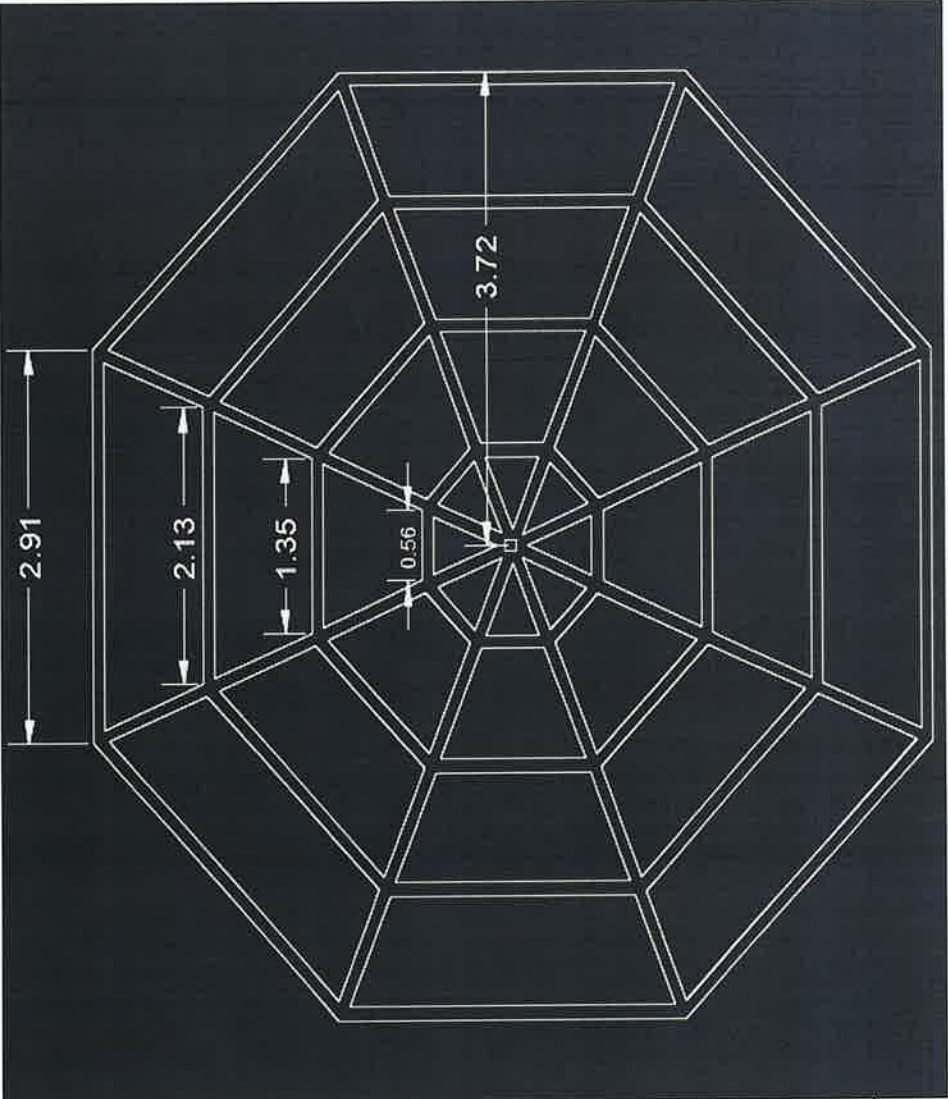
ING. JORGE ROSARIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	Q.BRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS
II. KIOSKO	

2.8 Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbreira, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.															
<table><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>21.00</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>-</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>29.76</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>8.76</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>21.00</td></tr></table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	21.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	29.76	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	8.76	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.00
RESUMEN DE VOLUMEN															
PROYECTO:	21.00														
ACUMULADO ANTERIOR:	-														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	29.76														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	8.76														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	21.00														


ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
II. KIOSKO			
2.8 Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbreira, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		21.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		29.76	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		8.76	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		21.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

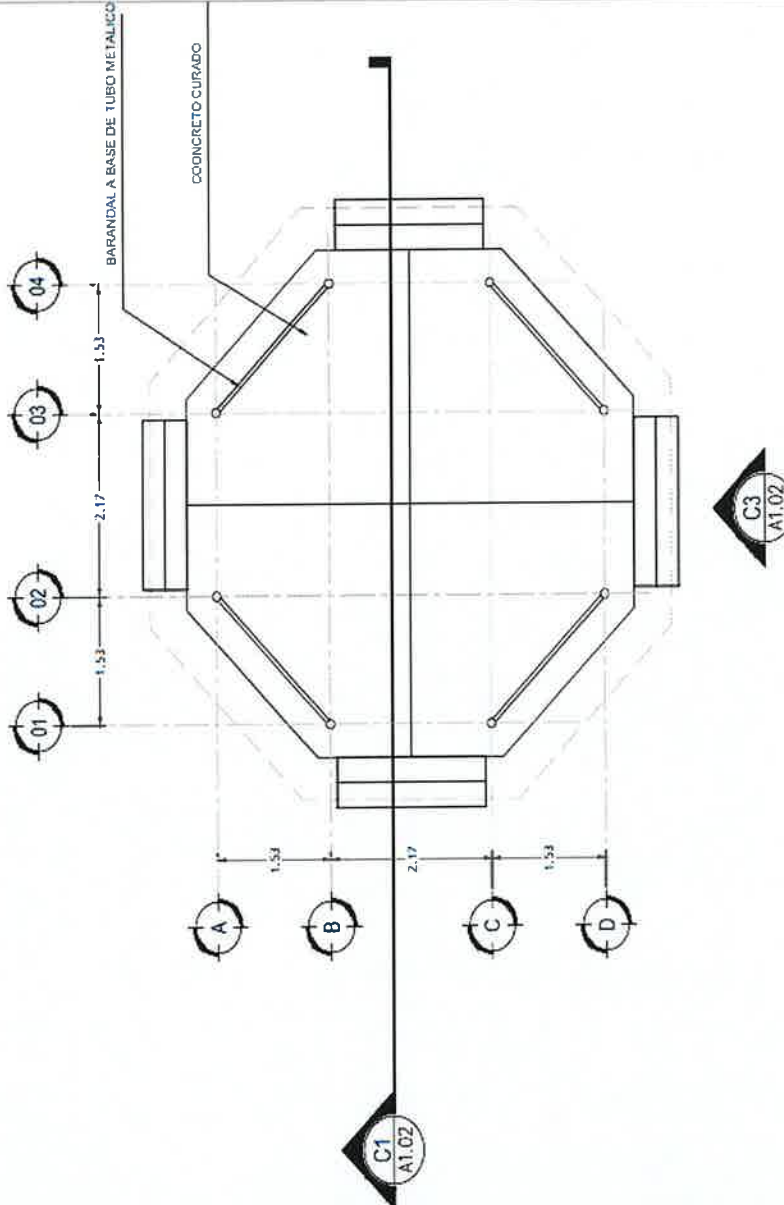
[illegible]

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

Handwritten signature: *Handwritten signature*

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.			
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
III. HERRERIA			
3.1			
Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T			
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:		8.68	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		8.68	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		8.68	

ING. JORGE ROSARIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
III. HERRERIA			
3.1			
Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T			
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:			8.68
ACUMULADO ANTERIOR:			-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:			8.68
POR EJERCER:			-
EXCEDENTE:			-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:			8.68

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO			
ESTIMACIÓN 2 (DOS)					
PERIODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO			
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS			
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
OBRA CIVIL					
4.1	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombro, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación	KIOSKO AL 37.5 m	POSTE 37.5	TOTAL 37.5	UNIDAD M
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		60.00			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50			
POR EJERCER:		22.50			
EXCEDENTE:					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50			

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO													
ESTIMACIÓN 2 (DOS)															
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023															
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO													
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS													
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		OBRA CIVIL													
4.1	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación														
		SIMBOLOGIA ○ Poste existente conectar aconelida a la red de alumbrado — Tubería pad rd 17 — Tubería pared delgada galvanizada ☒ Reflector led marca lithonia o similar ☒ Registro 40x40x60 cms													
		CODIGO DE CABLEADO <table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-21MM</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>2+1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19</td> </tr> </table>		①	1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-21MM	②	2+1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19								
①	1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-21MM														
②	2+1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19														
		RESUMEN DE VOLUMEN <table border="1"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>37.50</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>37.50</td> </tr> </table>		PROYECTO:	60.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	37.50	POR EJERCER:	22.50	EXCEDENTE:		A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	37.50
PROYECTO:	60.00														
ACUMULADO ANTERIOR:	-														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	37.50														
POR EJERCER:	22.50														
EXCEDENTE:															
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	37.50														

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRIGUEZ
SUPERINTENDENTE



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		OBRA CIVIL
4.1	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación	
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:		60.00
ACUMULADO ANTERIOR:		-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50
POR EJERCER:		22.50
EXCEDENTE:		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

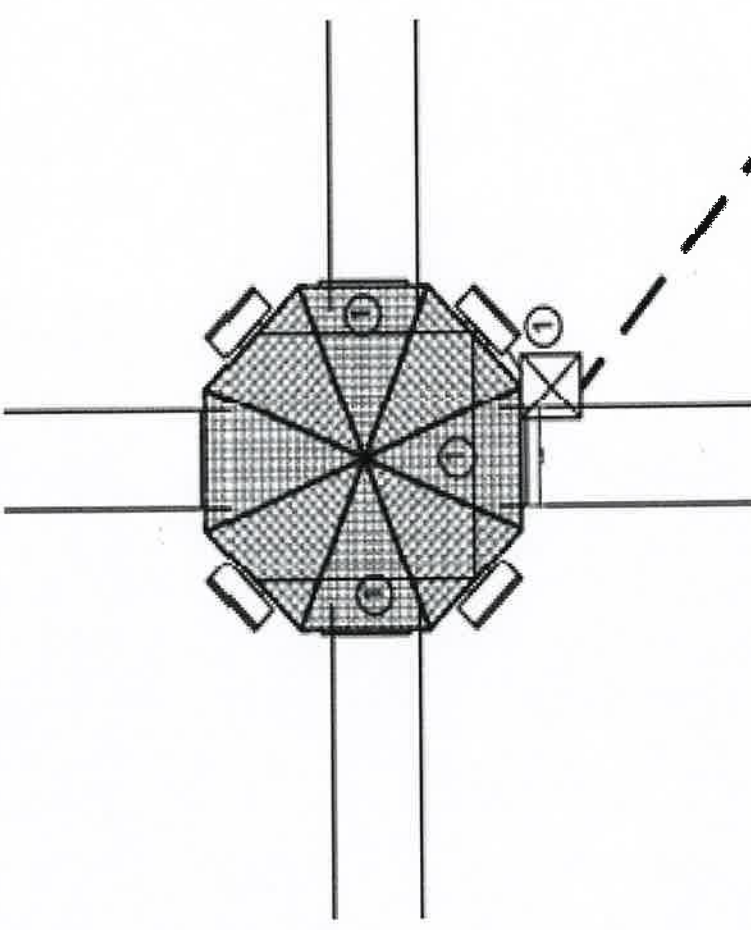
GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIOSKO			
4.2		TOTAL	
Suministro e instalación de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soportería, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		Cable 3 X 10 Conector tipo Grandula de 3/4" Numero de reflectores led= 4	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		4.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00	
		SUMA DEL VOLUMEN: 4.00 PZA	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO
CROQUIS / PLANOS		
CONCEPTO		
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO		
4.2	Suministro e instalación de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soportería, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:		4.00
ACUMULADO ANTERIOR:		-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00
POR EJERCER:		-
EXCEDENTE:		-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
CONCEPTO		
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO		
4.2	Suministro e instalación de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar, incluye: material, soportería, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:	4.00	
ACUMULADO ANTERIOR:	-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00	
POR EJERCER:	-	
EXCEDENTE:	-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

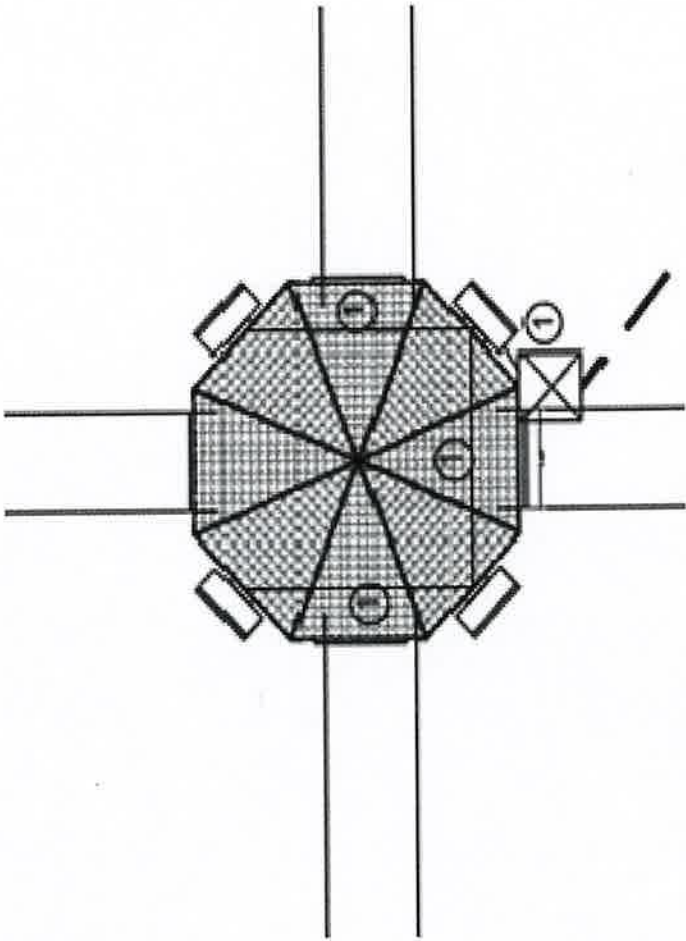
GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAIPI	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAIPI	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIOSKO			
4.3			
Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye copies de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		DE REGISTRO	UNIDAD
		AL	
		3 m	3.00
		PERIMETRO KIOSKO	
		26.4 m	26.40
		CONEXIÓN A LAMPARÁ	
		0.4 x 4	1.6
		SUMA DEL VOLUMEN: 31.00 M	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		40.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		31.00	
POR EJERCER:		9.00	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		31.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIOSKO			
4.3			
Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye copies de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	40.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	31.00		
POR EJERCER:	9.00		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	31.00		

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
CONCEPTO		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO		
4.3	Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye copies de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:		40.00
ACUMULADO ANTERIOR:		-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		31.00
POR EJERCER:		9.00
EXCEDENTE:		-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		31.00

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

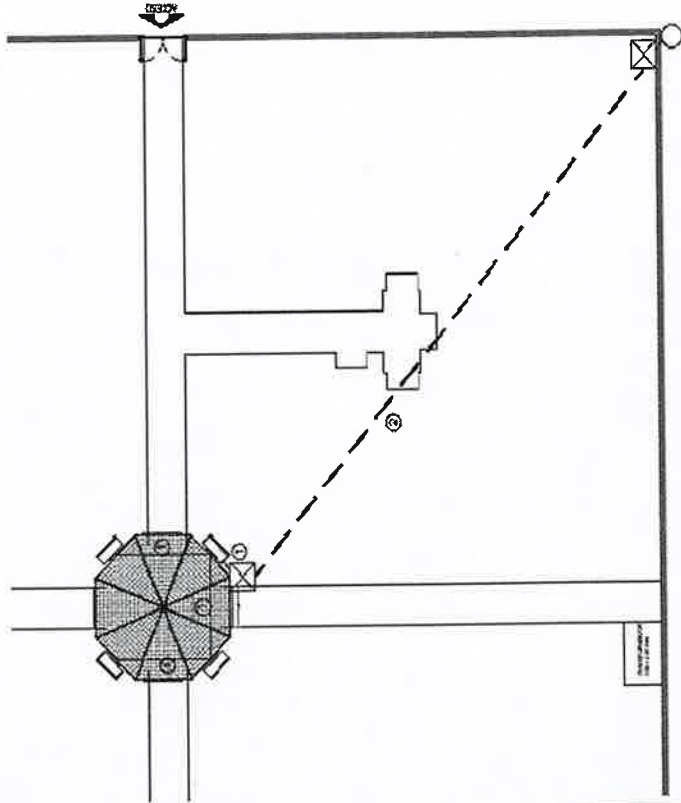
GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO				
ESTIMACIÓN 2 (DOS)						
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO				
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS				
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
KIOSKO		KIOSKO	AL	POSTE	TOTAL	UNIDAD
4.4	Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	37.5 m			37.5	
RESUMEN DE VOLUMEN						
PROYECTO:		50.00				
ACUMULADO ANTERIOR:		-				
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50				
POR EJERCER:		12.50				
EXCEDENTE:		d				
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50				
SUMA DEL VOLUMEN:					37.50	M

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO					
ESTIMACIÓN 2 (DOS)							
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023							
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO					
CROQUIS / PLANOS							
CONCEPTO							
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
KIOSKO							
4.4							
Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación							
		SIMBOLOGIA ○ Poste existente conectado a la red de alumbrado --- Tubo rd 1" --- Tubería perforada perforada □ Reflectores marca liboria o similar ⊗ Registro 40x40x60 cms					
		CODIGO DE CABLEADO <table><tr><td>①</td><td>1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-21MM</td></tr><tr><td>②</td><td>2+1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19</td></tr></table>		①	1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-21MM	②	2+1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19
①	1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-21MM						
②	2+1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19						
RESUMEN DE VOLUMEN							
PROYECTO:		50.00					
ACUMULADO ANTERIOR:		-					
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50					
POR EJERCER:		12.50					
EXCEDENTE:		-					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50					



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
CONCEPTO		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO	Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	
4.4		
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:		50.00
ACUMULADO ANTERIOR:		-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50
POR EJERCER:		12.50
EXCEDENTE:		-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		37.50

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIOSKO			
4.5	Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura dé' zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de 1 doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		
		UBICACIÓN	# PZAS
		PIE DE KIOSKO	1
		PIE DE POSTE	1
		TOTAL	2.00
		UNIDAD	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	2.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00		
SUMA DEL VOLUMEN:		2.00	PZA

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIOSKO			
4.5			
Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura de zanja, retiro de escombro, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de1 doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación			
SIMBOLOGIA		○ Puesta existente conectar acumulada a la red de alumbrado --- Tubería 17 — Tubería pared de gruta galvanizada □ Reflector led marca Ithoria o similar ⊠ Registro 40x40x60 cms	
CODIGO DE CABLEADO		① 1-10, 1-10, 1-12 T.F., 1-21MM ② 2x1 cal. 6 T-35 mm P'AD Rd 19	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		2.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
CONCEPTO		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO		
4.5		
Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura dé' zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de 1 doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:	2.00	
ACUMULADO ANTERIOR:	-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00	
POR EJERCER:	-	
EXCEDENTE:	-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO		
ESTIMACIÓN 2 (DOS)				
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO		
OPERACIONES ARITMÉTICAS				
CONCEPTO				
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
KIOSKO				
4.6				
Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		MEDIDAS	# PZAS	TOTAL
		Registro TIPO Condulet tipo "T"	1	3.00
		Registro TIPO Condulet tipo "T"	1	
		Registro TIPO Condulet tipo "T"	1	



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
CONCEPTO		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO		CROQUIS / PLANOS
4.6	Suministro e instalación de registro tipo condelet tipo "T" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:	3.00	
ACUMULADO ANTERIOR:	-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00	
POR EJERCER:	-	
EXCEDENTE:	-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
CONCEPTO		
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO		
4.6	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:	3.00	
ACUMULADO ANTERIOR:	-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00	
POR EJERCER:	-	
EXCEDENTE:	-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

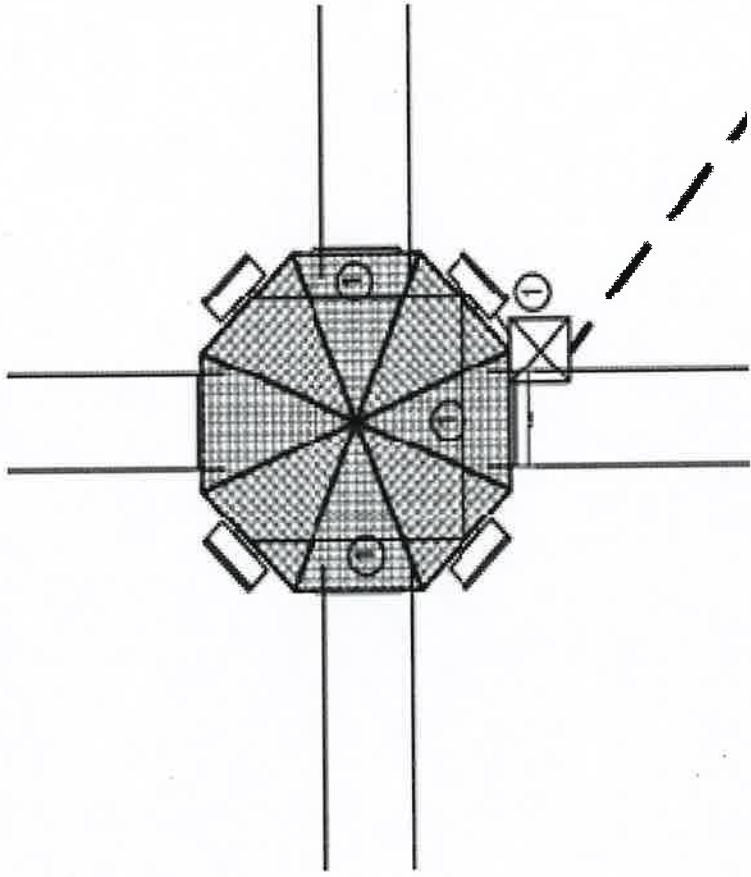
GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO					
ESTIMACIÓN 2 (DOS)							
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023							
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS					
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
KIOSKO							
4.7	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	UBICACIÓN	# PZAS	TOTAL	UNIDAD		
		PIE DE REGISTRO	1	2.00			
		CUARTA LUMINARIA	1				
RESUMEN DE VOLUMEN							
PROYECTO:							
ACUMULADO ANTERIOR:							
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:							
POR EJERCER:							
EXCEDENTE:							
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:							
SUMA DEL VOLUMEN:						2.00	PZA

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIOSKO			
4.7			
Suministro e instalación de registro tipo condeulet tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		2.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO												
ESTIMACIÓN 2 (DOS)														
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023														
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.														
UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO														
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA														
CONCEPTO IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA KIOSKO 4.7 Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación														
RESUMEN DE VOLUMEN <table border="1"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>2.00</td> </tr> </table>			PROYECTO:	2.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00
PROYECTO:	2.00													
ACUMULADO ANTERIOR:	-													
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00													
POR EJERCER:	-													
EXCEDENTE:	-													
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.00													

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO		
ESTIMACIÓN 2 (DOS)				
PERIODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO		
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS		
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
KIOSKO				
4.8				
Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xhwhw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		KIOSKO	AL	POSTE
		37.5 m		
		PIE DE POSTE	AL	LINEA DE MEDIA TENSIÓN
		7 m		
				7

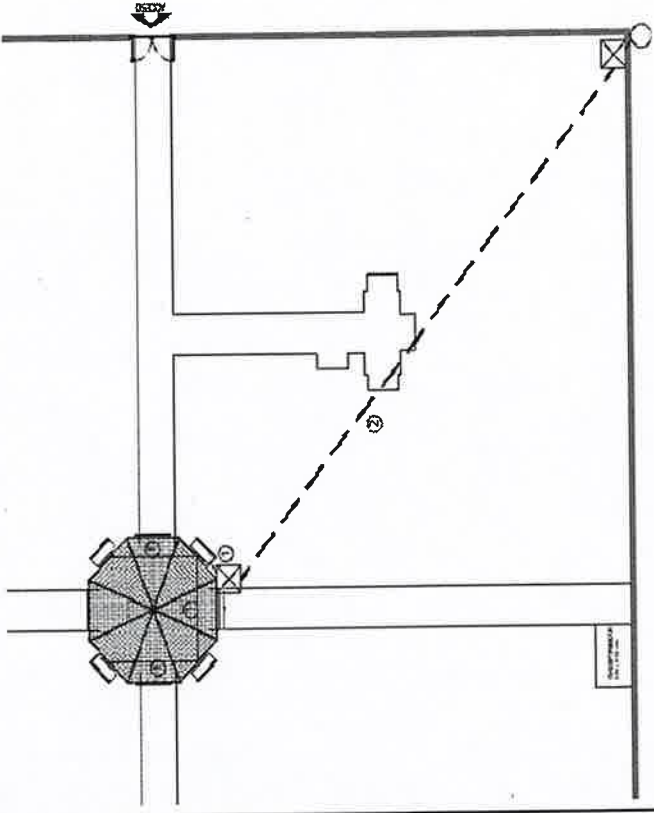


ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
KIOSKO			
4.8			
Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xhhw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación			
		SIMBOLOGIA ○ Poste existente conectado acomodado a la red de alumbrado --- Tubería pad rd 1"2 --- Tubería pared de greda galvanizada □ Reflector led marca fibronia o similar ☒ Registre 4br10x650 cms	
		CODIGO DE CABLEADO ① 1-10, 1-10, 1-12 T.F. 1-21MM ② 2x1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	60.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	44.50		
POR EJERCER:	15.50		
EXCEDENTE:			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	44.50		

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
CONCEPTO		
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
KIOSKO	4.8 Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xhhw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:	60.00	
ACUMULADO ANTERIOR:	-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	44.50	
POR EJERCER:	15.50	
EXCEDENTE:		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN		44.50

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO			
ESTIMACIÓN 2 (DOS)					
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO			
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS			
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
KIOSKO					
4.9		P1	P2	TOTAL	UNIDAD
Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw- ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		PERIMETRO	HILOS		
		34.5	3	103.50	
		COLUMNAS			
		3.1	3	9.30	
		CONEXIÓN A LAMPARAS			
		4	3	12	
		REGISTRO A KIOSKO			
		3	3	9	
		DE MUFA A FOTOCELDA			
		3	3	9	
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		300.00			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		142.80			
POR EJERCER:		157.20			
EXCEDENTE:		-			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		142.80			
		SUMA DEL VOLUMEN: 142.80 M			


ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO															
ESTIMACIÓN 2 (DOS)																	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023																	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO															
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS															
IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA																	
KIOSKO																	
4.9																	
Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thw- ls marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación		SIMBOLOGIA - Poste existente conectado a acomoda a la red de alumbrado - Tubería para rd 17 - Tubería para rd 17 - Reflector led marca viakon o similar - Registro 40x40x60 cm CODIGO DE CABLEADO <table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-2MM</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>2x1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19</td> </tr> </table>		①	1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-2MM	②	2x1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19										
①	1-10, 1-10, 1-12 T.F. T-2MM																
②	2x1 cal. 6 T-35 mm PAD Rd 19																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>142.80</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>157.20</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>142.80</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	300.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80	POR EJERCER:	157.20	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80
RESUMEN DE VOLUMEN																	
PROYECTO:	300.00																
ACUMULADO ANTERIOR:	-																
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80																
POR EJERCER:	157.20																
EXCEDENTE:	-																
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80																



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO												
ESTIMACIÓN 2 (DOS)														
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023														
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.														
UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO														
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA														
CONCEPTO IV. INSTALACIÓN ELÉCTRICA KIOSKO 4.9 Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw Is marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación RESUMEN DE VOLUMEN <table> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>142.80</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>157.20</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>142.80</td> </tr> </table>			PROYECTO:	300.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80	POR EJERCER:	157.20	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80
PROYECTO:	300.00													
ACUMULADO ANTERIOR:	-													
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80													
POR EJERCER:	157.20													
EXCEDENTE:	-													
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	142.80													

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO			
5.3	Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	CONCEPTO	# EQUIPOS
		Caminadora	1
			1
			UNIDAD
		SUMA DEL VOLUMEN: 1.00 PZA	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	1.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00		

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO	

5.3

Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.

TABLA CUANTIFICADORA DE MOBILIARIO

CANTIDAD	MOBILIARIO
12	REHABILITACIÓN DE BAUCAS
1	KIOSKO
2	RETIRO Y REPOSICIÓN DE RESBALADEROS
1	TRANSFORMADOR
3	REACONDICIONAR COLUMPIOS
1	REACONDICIONAR SUBE Y BAJA
6	RETIRO DE BAUCAS DE CONCRETO

01 RETIRO DE BAUCAS DE CONCRETO

02 CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO

03 RETIRO Y REPOSICIÓN DE RESBALADEROS

04 REACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO

05 PLANTURA A MURO PERIMETRAL DEL PARQUE

RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	1.00
ACUMULADO ANTERIOR:	-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

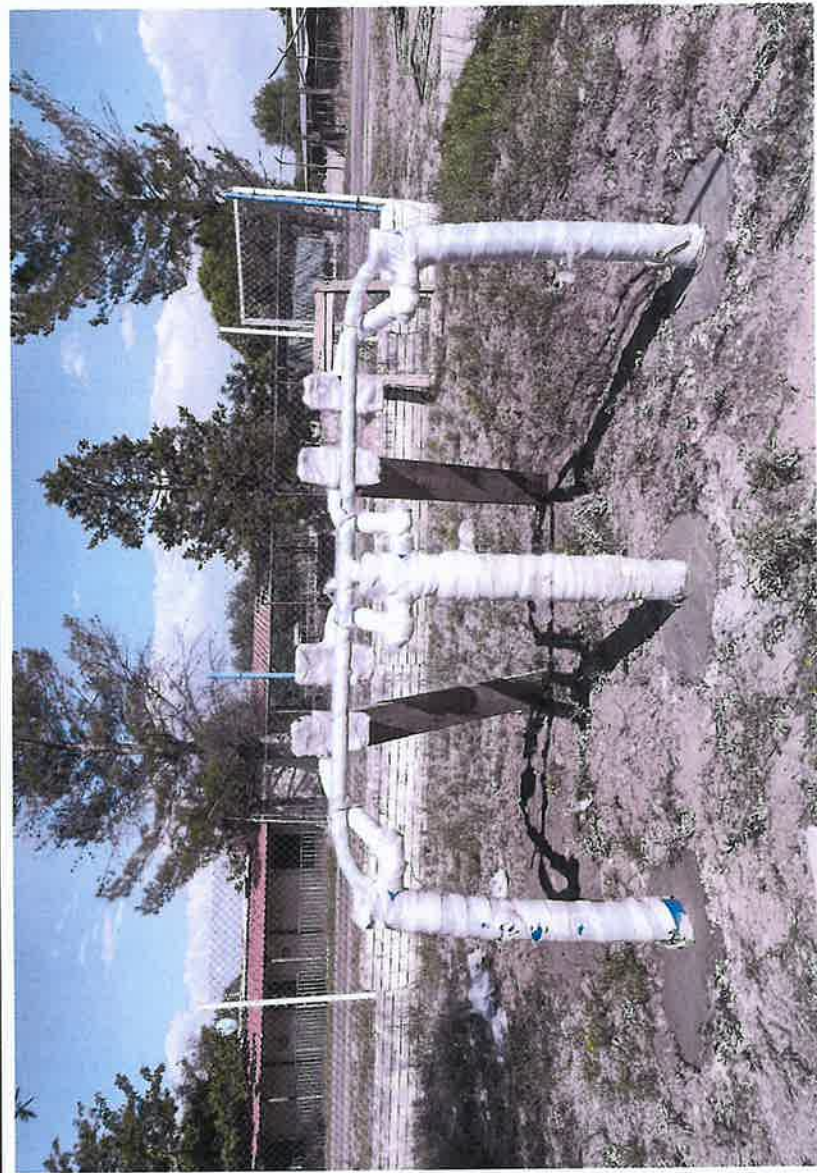
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

CONCEPTO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO	

5.3
Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.



RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	1.00
ACUMULADO ANTERIOR:	-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

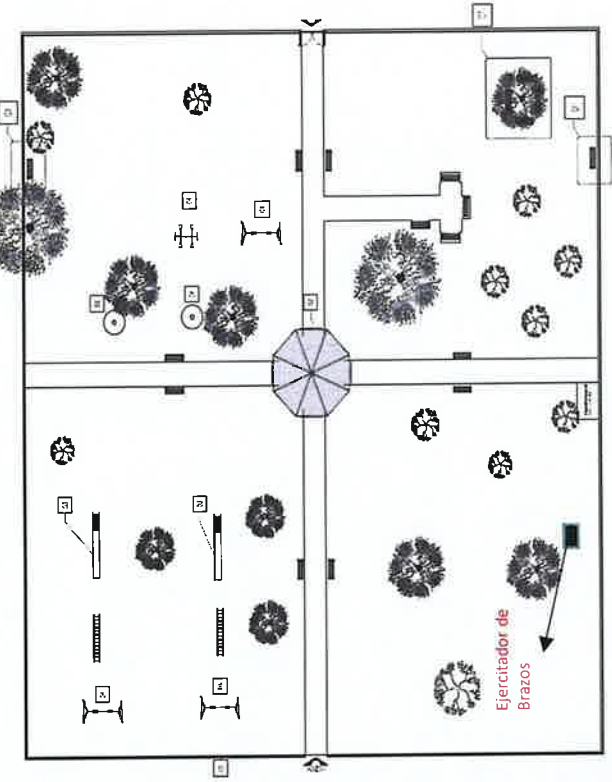
GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO			
ESTIMACIÓN 2 (DOS)					
PERIODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO			
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS			
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO					
5.4	Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T,	CONCEPTO	# EQUIPOS	TOTAL	UNIDAD
		Ejercitador de brazos dúo	1	1	
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		1.00			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		1.00			
POR EJERCER:		-			
EXCEDENTE:					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		1.00			
		SUMA DEL VOLUMEN:		1.00	PZA

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO			
5.4 Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	1.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00		
POR EJERCER:			
EXCEDENTE:			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00		

ING. JORGE ROSALÍO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO															
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO															
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023																	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.																	
CONCEPTO																	
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO																	
5.4	Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T,	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROYECTO:</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td><td></td></tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td><td></td></tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	1.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00	POR EJERCER:		EXCEDENTE:		A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00
RESUMEN DE VOLUMEN																	
PROYECTO:	1.00																
ACUMULADO ANTERIOR:	-																
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00																
POR EJERCER:																	
EXCEDENTE:																	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00																

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO			
ESTIMACIÓN 2 (DOS)					
PERIODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO			
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS			
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO					
5.6	Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	CONCEPTO	# EQUIPOS	TOTAL	UNIDAD
		Juegos Infantiles varios	10	10	
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:				7.00	
ACUMULADO ANTERIOR:				-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:				10.00	
POR EJERCER:				-	
EXCEDENTE:				3.00	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:				7.00	
SUMA DEL VOLUMEN:				10.00	PZA

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EN COLONIA OCAIMPO												
ESTIMACION N° 2 (DOS)													
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023													
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAIMPO												
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO	CROQUIS / PLANOS												
5.6 Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	columpios pasamanos resbaladillas volantines columpio sube y baja juego libre												
	RESUMEN DE VOLUMEN <table border="1"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td align="right">7.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td align="right">10.00</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td align="right">3.00</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td align="right"><u>7.00</u></td> </tr> </table>	PROYECTO:	7.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.00	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	3.00	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	<u>7.00</u>
PROYECTO:	7.00												
ACUMULADO ANTERIOR:	-												
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.00												
POR EJERCER:	-												
EXCEDENTE:	3.00												
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	<u>7.00</u>												

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
5.6 Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.			
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:		7.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		10.00	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		3.00	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		7.00	

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO			
5.7	Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T-	CONCEPTO	UNIDAD
		# BANCAS	TOTAL
		12	12
		Bancas rehabilitadas	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	12.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.00		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.00		
SUMA DEL VOLUMEN:		12.00	PZA

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS
V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO	

5.7
Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T-

TABLA CUANTIFICADORA DE MOBILIARIO	
CANTIDAD	MOBILIARIO
12	REHABILITACIÓN DE BANCAS
1	KIOSKO
2	RETIRO Y REPOSICIÓN DE RESBALADEROS
1	TRANSFORMADOR
3	REACONDICIONAR COLUMPIOS
1	REACONDICIONAR SUBE Y BAJA
6	RETIRO DE BANCAS DE CONCRETO

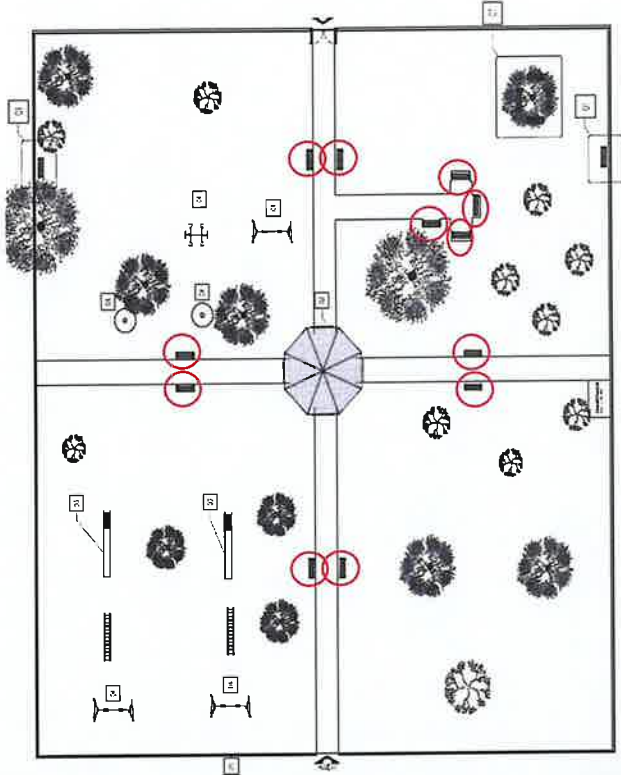
01 RETIRO DE BANCAS DE CONCRETO

02 CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO

03 RETIRO Y REPOSICIÓN DE RESBALADEROS

04 REACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO

05 PINTURA A MURO PERIMETRAL DEL PARQUE



RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	12.00
ACUMULADO ANTERIOR:	-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.00
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.00

ING. JORGE ROSALDO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 2 (DOS)		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

CONCEPTO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

5.7
Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T-



RESUMEN DE VOLUMEN

PROYECTO:	12.00
ACUMULADO ANTERIOR:	-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.00
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	12.00

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
