


Control



Sepuric

Servicios Públicos Relacionados
con la Industria de la Construcción

I - Factura - VERSIÓN 4.0

129

No. de serie del CSD del emisor

00001000000507980675

Fecha y Hora de emisión

2023-12-06T19:10:52

Folio Fiscal

7783DA84-949D-11EE-B99F-00155D014009

Lugar de expedición: 31184

Tipo de Cambio: 1.00

Emisor

RFC: GCS160311ID6

RAZÓN SOCIAL: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC

RIO MADEIRA 2026

COL. RIBERAS DE SACRAMENTO CHIHUAHUA

ESTADO: CHIHUAHUA, MEX CHIHUAHUA 31184

REGIMEN FISCAL: 626 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2023-12-06T19:10:53

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14 QUINTO PISO

COL.CENTRO, CHIHUAHUA C.P.:31000

ESTADO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEX

TELEFONOS: -

Regimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONTRATO NO. 050/2023 ESTIMACION NO. 3 (TRES) CONV MOD EXC CONSISTE EN: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO, ALCANCE DE LA ESTIMACION: \$13,684.84 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$8,691.69 DESCUENTOS C.M.I.C. (0.2%): \$27.37 D.I.F. (0.2%): \$27.37 SUMA DE LOS DESCUENTOS: \$54.74 IMPORTE NETO A RECIBIR: \$5737.31 ClaveProdServ: 72141000 - Servicios de construcción de autopistas y carreteras Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,993.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$798.90	4,993.15	4,993.15

CFDI Relación

Tipo Relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo

UUID: 1E448468-169C-11EE-9E76-00155D012007

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICIONES DE PAGO

TOTAL EN LETRA

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
05/100 MXN

Subtotal

4,993.15 MXN

IVAT 0.160000

798.90 MXN

Total

5,792.05 MXN

Sello digital del emisor

IV678yUVewAAB86kwBgHghrU5oR8Y1VRkZ0gdQIHCONcrZxHnVNrhcYV/Rn+SJ+IdoOAO55juz6IPZZto+BFTv0sAXI8BotLA/r/A/H2fA/bz903Wo0kn47KRD2Lz+1JM1Pq1um+IZfwZdKpkqzKNQ5iBkDAVnaOBTNBtyS3Aw53C8GvGEmScaK3heP/MDCKW1UOTaXe6d5v7lq0eJWSC6eeqGQf/tUm2ZByJsX0DzVvcbYD4UhnI9DKAnZ32MnEk+GZgG3mSsVNu6D+EQs0b9BdYIJZfV8/zLND0D8x3GNKQD8H0JQUkLau6f3ADBzqHpS4LucGLL0CKuaYdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|7783DA84-949D-11EE-B99F-00155D014009|2023-12-

06T19:10:53|TBN040609RKA|IV678yUVewAAB86kwBgHghrU5oR8Y1VRkZ0gdQIHCONcrZxHnVNrhcYV/Rn+SJ+IdoOAO55juz6IPZZto+BFTv0sAXI8BotLA/r/A/H2fA/bz903Wo0kn47KRD2Lz+1JM1Pq1um+IZfwZdKpkqzKNQ5iBkDAVnaOBTNBtyS3Aw53C8GvGEmScaK3heP/MDCKW1UOTaXe6d5v7lq0eJWSC6eeqGQf/tUm2ZByJsX0DzVvcbYD4UhnI9DKAnZ32MnEk+GZgG3mSsVNu6D+EQs0b9BdYIJZfV8/zLND0D8x3GNKQD8H0JQUkLau6f3ADBzqHpS4LucGLL0CKuaYdw==|00001000000504587508|]

Sello digital del SAT

UOBjtPjuwzPABJ70eg3e1C01v77XEOYbonJv3Ay1IPqkvMvRyowaF9Kx7a4ywJVQkPRtBLytwuTHLkYEEICqllQFGaFYxdoiLAImw8f8OIF4zh27DSf1VkJJeU3PttRIEU5llkc7E2gFqDf8WYshoNHKDFuAAzMDkpXHI+yyZamRxUMMdZWYQov41DBRn+ZcSmkJILPcmHIZIS92Yovjm5FAdJmWj22wCNNZG/Y9b-tcREfIKfnAsrwxU8d7qviZgA/jp15zLchwOYH6R61hiXoqBU1oRcMELIQSBEP4yQayLiQJISJUGd0vENM+rJf313B/pvyDFJCR3Q8Og==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.comprobantes-fiscales.com.mx

Página 1 de 1





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FAFM	CONTRATO: 050/2023
OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	ESTIMACIÓN: 3 (TRES) CONV MOD EXC
	PERIODO DE EJECUCIÓN: 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	ESTADO FINANCIERO CON IVA
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD	IMPORTE CONTRATADO: \$ 567,859.85
28.1936491 N 108.3671516 O	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ 519,382.31
UBICACIÓN COLONIA OCAMPO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: \$ 15,874.41
CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	IMPORTE ACUMULADO: \$ 535,256.72
RFC: GCS-160311-ID6	IMPORTE POR ESTIMAR: \$ 32,603.13

TIPO DE OBRA	IMPORTES S/IVA	OBSERVACIONES:
CONCEPTOS NORMALES:	\$ -	
CONCEPTOS EXCEDENTES:	\$ 13,684.84	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ -	
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	\$ -	
REINTEGRO DE LA RETENCIÓN ANTERIOR:	\$ -	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN S/IVA		\$ 13,684.84

DESCUENTOS	
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES)	\$ -
C.M.I.C. (0.2%)	\$ 27.37
D.I.F. (0.2%)	\$ 27.37
S.I.V.C. (0.5%)	\$ -
SUMA DE LOS DESCUENTOS	\$ 54.74
RESUMEN	
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN	\$ 13,684.84
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 8,691.69
SUBTOTAL	\$ 4,993.15
I.V.A.	\$ 798.90
TOTAL (IMPORTE FACTURADO)	\$ 5,792.05
TOTAL CON LETRA	
(CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.)	
DESCUENTOS	
IMPORTE NETO A RECIBIR	\$ 5,737.31

ELABORÓ
<u>GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.</u>
CONTRATISTA
REVISÓ
<u>ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ</u>
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
<u>ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ</u>
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
<u>ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA</u>
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AUTORIZÓ
<u>ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO</u>
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$5,737.31 (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.), COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC, DEL CONTRATO 050/2023, POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO.

1 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN (IMPORTES SIN IVA)

SUMA DE LOS TRABAJOS:	13,684.84
RETENCIÓN POR ATRAZO:	-
REINTEGRO:	-
ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:	13,684.84
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	8,691.69
SUBTOTAL:	4,993.15
IVA (16%):	798.90
IMPORTE DE LA FACTURA:	5,792.05
IMPORTE NETO A RECIBIR:	5,737.31

2 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO (LOS IMPORTES NO LLEVAN IVA)

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):	-
C.M.I.C. (0.2%):	27.37
D.I.F. (0.2%):	27.37
S.I.V.C. (0.5%):	-
SUMA DE DESCUENTOS:	54.74

3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO:	567,859.85
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR:	519,382.31
VALOR DE ESTA ESTIMACION:	15,874.41
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION:	535,256.72
IMPORTE POR ESTIMAR:	32,603.13

4 RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO (SEGÚN FACTURA):	141,964.96
ACUMULADO AMORTIZADO ANTERIOR:	129,845.58
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACION:	10,082.36
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION:	139,927.94
IMPORTE POR AMORTIZAR:	2,037.02

5 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO

	C.M.I.C. (0.2%):	D.I.F. (0.2%):	S.I.V.C. (0.5%):
ACUMULADO ANTERIOR:	895.48	895.48	-
ESTA ESTIMACION:	27.37	27.37	-
ACUMULADO ACTUAL:	922.85	922.85	-

RECIBIMOS

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
GCS-160311-ID6

HOJA DE PARTIDAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA	
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC		OCAMPO	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
TIPO DE TRABAJOS	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE
NORMALES			
EXCEDENTES	I II V	PRELIMINARES KIOSKO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO	1,765.51 3,167.07 8,752.26
EXTRAORDINARIOS			13,684.84
			SUBTOTAL: 13,684.84
			IVA: 2,189.57
			TOTAL: 15,874.41



GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
CONTRATISTA



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA DE CONCEPTOS

CONTRATO No. 050/2023									
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC									
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023									
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.									
UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
			PROYECTO	ACUM. TOTAL	AC-JM. ANTERIOR	ESTIMADO			
	NORMAL								
	EXCEDENTE								
I	PRELIMINARES								
1.3	Excavación para zapata corrida en material tipo "B" de 0.00 m a 0.80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobrecanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M3	8.90	11.64	8.90	2.74	425.28	1,165.27	
1.4	Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.	M3	15.50	20.30	15.50	4.80	125.05	600.24	
II	KIOSKO								
2.3	Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T	M3	10.52	10.71	10.52	0.19	170.00	32.30	
2.8	Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbreira, pizado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M	21.00	29.76	21.00	8.76	357.85	3,134.77	
V	OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO								
5.6	Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	7.00	10.00	7.00	3.00	2,917.42	8,752.26	
	EXTRAORDINARIOS								
							SUBTOTAL:	13,684.84	
							IVA:	2,189.57	
							TOTAL:	15,874.41	

GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

[PÁGINA 1/1]

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO				
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC						
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO				
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS				
I PRELIMINARES						
1.3	Excavación para zapata corrida en material tipo "B" de 0.00 m a 0.80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		18.89	x 0.7	x 0.88	=	11.64
		perímetro				
		AB	2.22			
		BC	2.58			
		CD	2.15			
		DE	2.5			
		EF	2.17			
		FG	2.6			
		GH	2.14			
		HI	2.53			
		TOTAL	18.89			
RESUMEN DE VOLUMEN						
PROYECTO:		8.90				
ACUMULADO ANTERIOR:		8.90				
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		11.64				
POR EJERCER:		-				
EXCEDENTE:		2.74				
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.74				
SUMA DEL VOLUMEN:					11.64	M3

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN


CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

CONCEPTO

I PRELIMINARES

1.3

Excavación para zapata corrida en material tipo "B" de 0.00 m a 0.80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobrecanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.

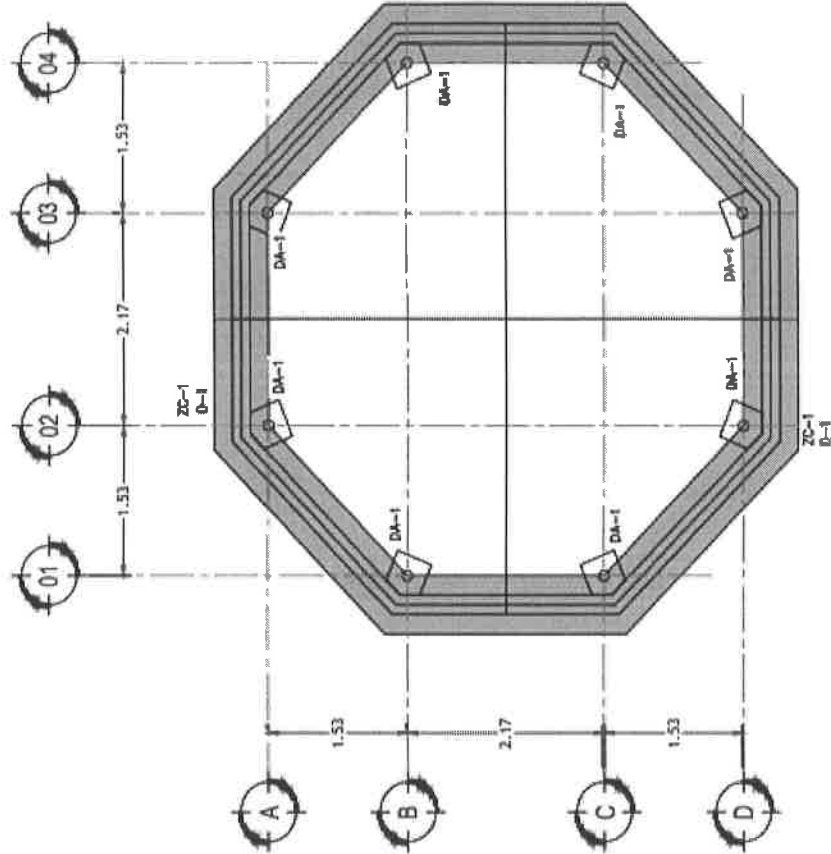

RESUMEN DE VOLUMEN

PROYECTO:	8.90
ACUMULADO ANTERIOR:	8.90
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	11.64
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	2.74
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.74

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

CONCEPTO	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
I PRELIMINARES	

1.3
Excavación para zapata corrida en material tipo "g" de 0.00 m a 0.80 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobreanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.



RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	8.90
ACUMULADO ANTERIOR:	8.90
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	11.64
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	2.74
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	2.74

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
I PRELIMINARES			
1.4	Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.	VOLUMEN	UNIDAD
		ABUNDAMIENTO	TOTAL
		x	=
		x	=
		x	=
		2.95	3.84
		1.02	1.33
		11.64	15.13
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		15.50	
ACUMULADO ANTERIOR:		15.50	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		20.30	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		4.80	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.80	
SUMA DEL VOLUMEN:		20.30	M3


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

CONCEPTO

I PRELIMINARES

1.4 Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.

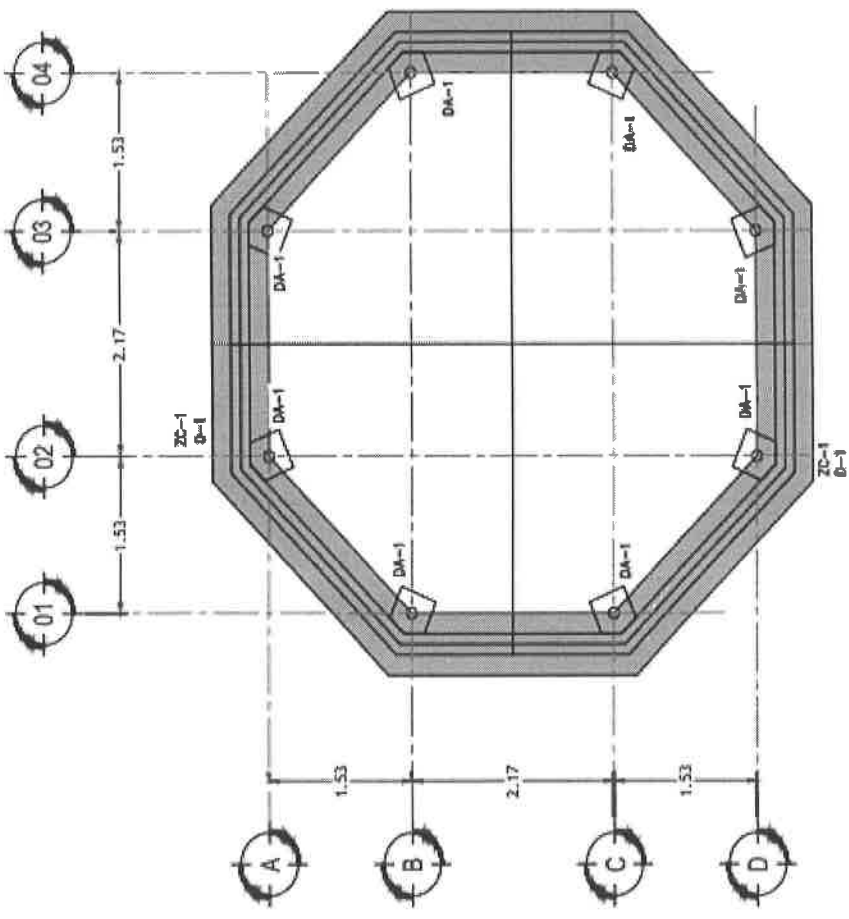

RESUMEN DE VOLUMEN

PROYECTO:	15.50
ACUMULADO ANTERIOR:	15.50
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.30
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	4.80
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.80

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

CONCEPTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA

I PRELIMINARES

1.4 Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado, equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.

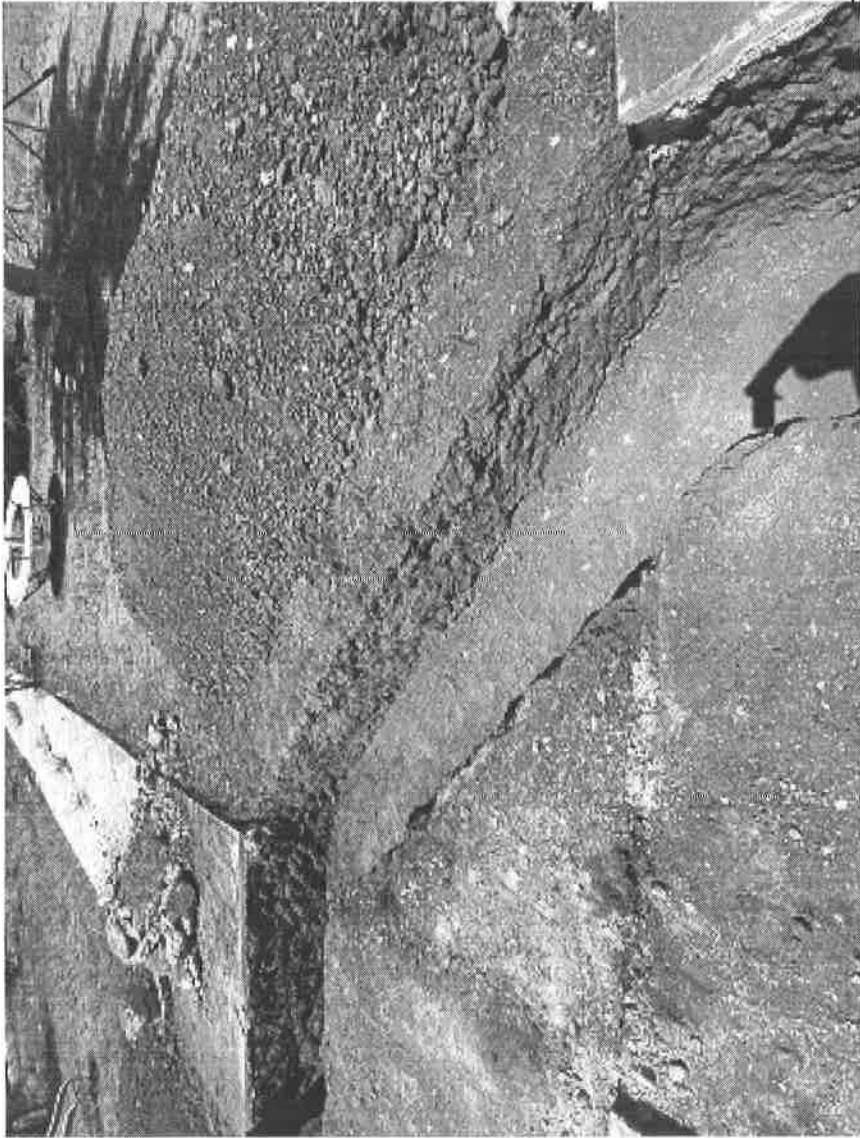

RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	15.50
ACUMULADO ANTERIOR:	15.50
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	20.30
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	4.80
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.80

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC	
PERIODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRAFICA				
II KIOSKO						
2.3	Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T	GEOMETRÍA	AREA	RESULTADO	ALTURA	TOTAL
		T1	(1.8*1.8)/2	x	0.42	= 0.756
		T2	(1.8*1.8)/2	x	0.42	= 0.756
		T3	(1.8*1.7)/2	x	0.42	= 0.735
		T4	(1.8*1.8)/2	x	0.42	= 0.756
		R1	(1.8*2.03)/2	x	0.42	= 1.533
		R2	(1.8*1.98)	x	0.42	= 4.662
		R3	(1.8*2)	x	0.42	= 1.512
RESUMEN DE VOLUMEN						
PROYECTO:		10.52				
ACUMULADO ANTERIOR:		10.52				
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		10.71				
POR EJERCER:		-				
EXCEDENTE:		0.19				
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.19				
SUMA DEL VOLUMEN:		10.71 M3				

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN


CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

II KIOSKO

2.3

Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T

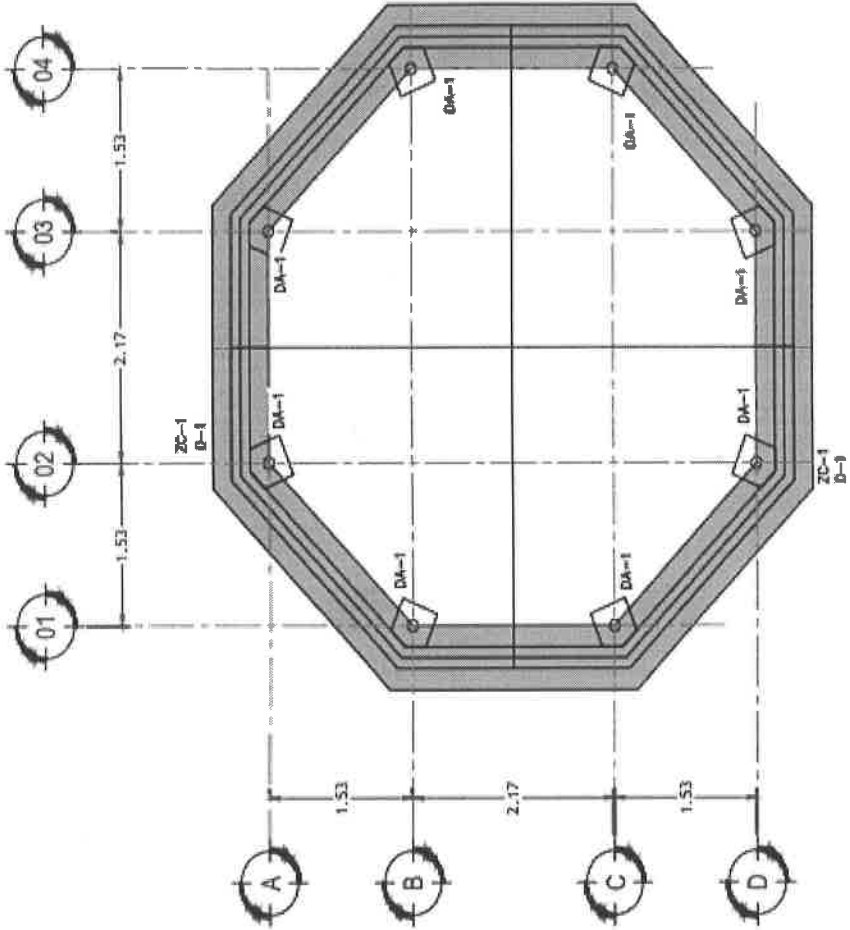

RESUMEN DE VOLUMEN

PROYECTO:	10.52
ACUMULADO ANTERIOR:	10.52
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.71
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	0.19
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	0.19

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO												
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC														
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023														
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.														
CONCEPTO II KIOSKO														
2.3	Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P.U.O.T	EVIDENCIA FOTOGRAFICA												
RESUMEN DE VOLUMEN <table border="1"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>10.52</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>10.52</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>10.71</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>0.19</td> </tr> </table>		PROYECTO:	10.52	ACUMULADO ANTERIOR:	10.52	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.71	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	0.19	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	0.19	
PROYECTO:	10.52													
ACUMULADO ANTERIOR:	10.52													
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.71													
POR EJERCER:	-													
EXCEDENTE:	0.19													
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	0.19													

**JORGE ROSALIO
ERINTENDENTE**



GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

CONCEPTO OPERACIONES ARITMÉTICAS

II. KIOSKO		LARGO	# PZAS	TOTAL
2.8	Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbreira, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	3.72	x 8 =	29.76
RESUMEN DE VOLUMEN				
PROYECTO:		21.00		
ACUMULADO ANTERIOR:		21.00		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		29.76		
POR EJERCER:		-		
EXCEDENTE:		8.76		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		8.76		
SUMA DEL VOLUMEN:		29.76 M		

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

CONCRETO	CROQUIS/ PLANOS
----------	-----------------

II. KIOSKO

2.8
Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbrea, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.

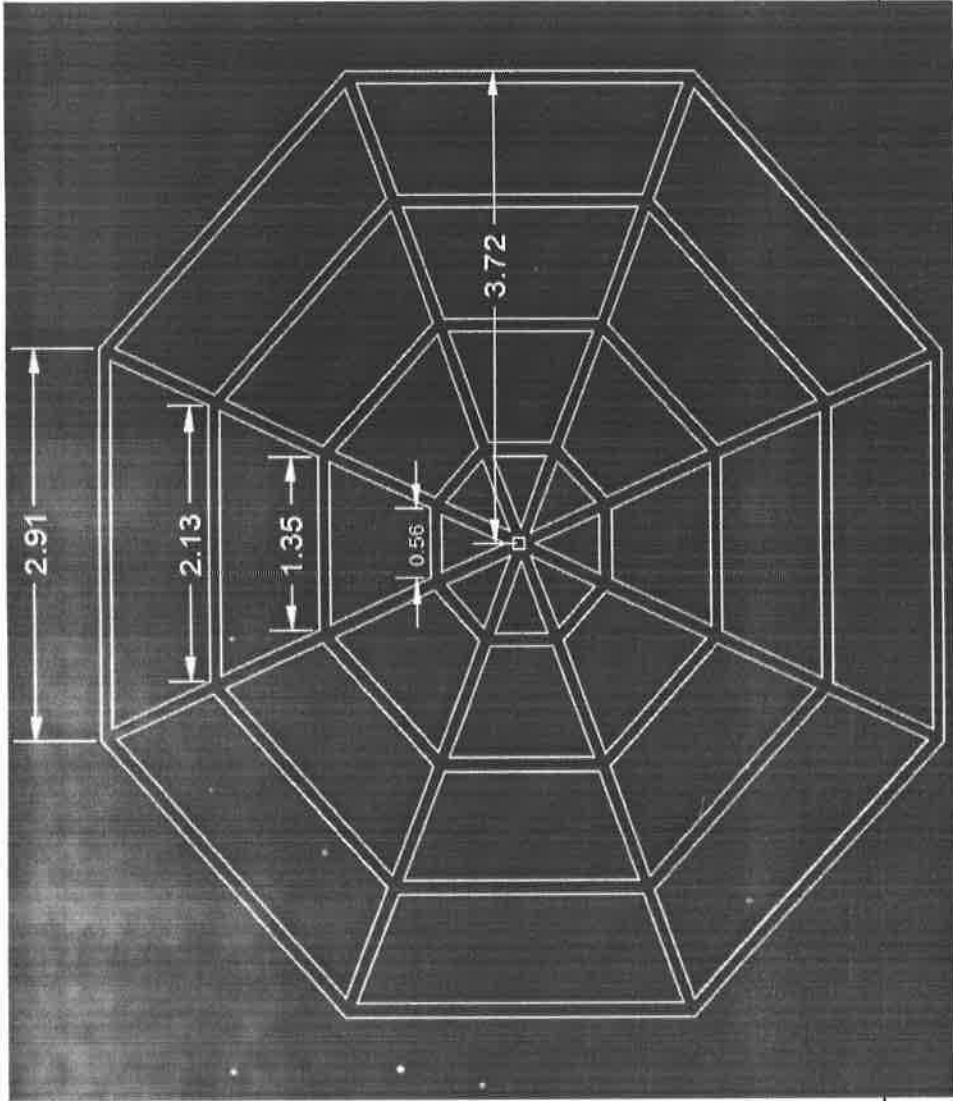


RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	21.00
ACUMULADO ANTERIOR:	21.00
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	29.76
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	8.76
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	8.76


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

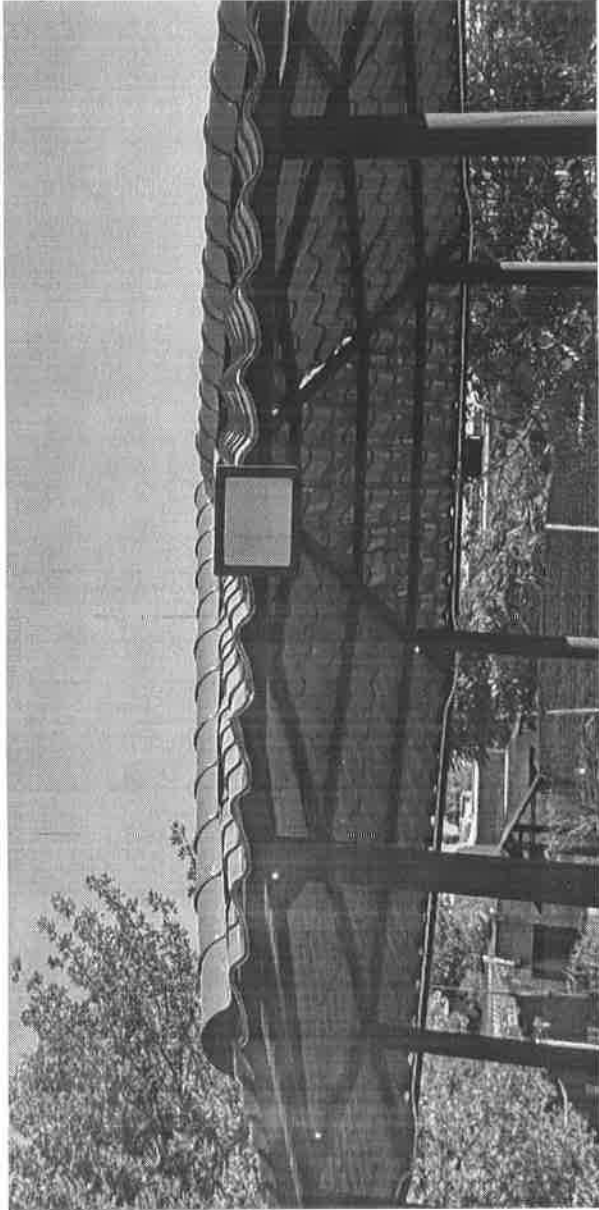CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC			
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRAFICA	
II. KIOSKO			
2.8	Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbreira, pijiado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.		
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:			21.00
ACUMULADO ANTERIOR:			21.00
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:			29.76
POR EJERCER:			-
EXCEDENTE:			8.76
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:			8.76


ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023		OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.		
		UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO

CONCEPTO	# EQUIPOS	TOTAL	UNIDAD
5.6 Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	10	10	
Juegos Infantiles varios			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	7.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	7.00		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.00		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	3.00		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00		
SUMA DEL VOLUMEN:		10.00	PZA

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC	
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO

V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO															
5.6 Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	croquis / planos Diagrama de un parque infantil con una estructura central octogonal. Se muestran varias zonas de juego: columpios, pasamanos, resbaladillas, volantines, sube y baja, y un juego de agua. Las etiquetas están escritas en español.														
<table><tr><th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th></tr><tr><td>PROYECTO:</td><td>7.00</td></tr><tr><td>ACUMULADO ANTERIOR:</td><td>7.00</td></tr><tr><td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>10.00</td></tr><tr><td>POR EJERCER:</td><td>-</td></tr><tr><td>EXCEDENTE:</td><td>3.00</td></tr><tr><td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td><td>3.00</td></tr></table>		RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	7.00	ACUMULADO ANTERIOR:	7.00	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.00	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	3.00	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00
RESUMEN DE VOLUMEN															
PROYECTO:	7.00														
ACUMULADO ANTERIOR:	7.00														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.00														
POR EJERCER:	-														
EXCEDENTE:	3.00														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00														

ING. JORGE ROSALIO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 050/2023	OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	
ESTIMACIÓN 3 (TRES) CONV MOD EXC		
PERÍODO: DEL 5 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR SEPURIC, S.A DE C.V.	UBICACIÓN: COLONIA OCAMPO	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

V. OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO

5.6
Rehabilitación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.



RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	7.00
ACUMULADO ANTERIOR:	7.00
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	10.00
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	3.00
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	3.00

ING. JORGÉ ROSALÍO AGUIRRE RODRÍGUEZ
SUPERINTENDENTE

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
