

RFC emisor: CABA670418AUA
 Nombre emisor: ARNOLDO CASTILLO BARAY
 RFC receptor: MCI651010V22
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Construcciones.

Folio fiscal: 527560B4-CA6A-4D77-8C6D-FC0010E393CE
 No. de serie del CSD: 00001000000508694488
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31210 2023-12-29 20:48:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario		Importe	Descuento		Objeto impuesto
72101507		1.00	E48	Unidad de servicio	83,214.15		83,214.15			SI objeto de impuesto.
Descripción	Estimación No. 7 (SIETE) CONV MOD EXT del contrato No. 086/2023 que consiste en "REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA" Alcance de estimación: \$111524.98 Amort. Anticipo: \$28310.83 Descuentos C.M.I.C. (0.2%): \$223.05 D.I.F. (0.2%): \$223.05 SANCION (1%/MES): \$2862.91 Total Descuentos: \$3309.01 Neto a recibir: \$93219.40				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	83,214.15	Tasa	16.00%	13,314.26
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
 Tipo de relación: CFDI por aplicación de anticipo
 Folio fiscal relacionado: 8383972D-0380-43F0-B921-2B138EDBA4E3

Subtotal \$ 83,214.15
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 13,314.26
 Total \$ 96,528.41

Sello digital del CFDI:

b5O5IOFn9RVIEPMcR6p3IZoN0sgdtu1tGkqIXZITs7GFwpJqgnUFKNxJsoVSYgokXdE5TWurpg5JUGC/3PeACOwnl7LjRcjNyz7KqDKyvRFRbxDwYkGIARNwMOmRsGkZTGg7LiSiH48Wo19wPBhn9lv16FN+Ukf2daDla6c2YbWdV1owwpSkQFqJSNj4I6NbwfD6yPQYzXTe+GDqZOr9YWzfaEUFOxC9SSCnPND0klremXIq1rybu+ocvQWQ93Rz3kwTVYVWzF112x8Ep+jWPQ5Dugq5nFe86SRARlaGsh8qunkprW9qNHHwiyY35ym7e9VZPmSeVzHiXwMHp5t/Q==

Sello digital del SAT:

dRo229sx9Ntel1yn4PJ8dWbl4QP2mMWbuCs1dnKeRgUFyqe54obzryXHZ0B8FN9MLmTDCEYoZ7GevPa+53aQg9c2lYunyLVKQroe2CcQIH8J/Q8YTJF5l/g/+J1xP9+2hNoitAHNCsMfDdbYgd1gYmMVH+3mhoWEy6OcUK8P+B7rlgXAUyxd0S6EQESnQ/tqHsP7DLQx9foj3y0TQ+EbSbi3+D+w0OTilJPdXnaB4nPougYRd8DyMm6LXw2D/78ByW9LIULMoaccf9ldA+m6H1f9uB3tV/HErwh2GetWUub30Vg4EFtJJ7AA8oTkgAB4lcAtiwUFevoyccKN7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|527560B4-CA6A-4D77-8C6D-FC0010E393CE|2023-12-29T20:48:51|SAT970701NN3|b5O5IOFn9RVIEPMcR6p3IZoN0sgdtu1tGkqIXZITs7GFwpJqgnUFKNxJsoVSYgokXdE5TWurpg5JUGC/3PeACOwnl7LjRcjNyz7KqDKyvRFRbxDwYkGIARNwMOmRsGkZTGg7LiSiH48Wo19wPBhn9lv16FN+Ukf2daDta6c2YbWdV1owwpSkQFqJSNj4I6NbwfD6yPQYzXTe+GDqZOr9YWzfaEUFOxC9SSCnPND0klremXIq1rybu+ocvQWQ93Rz3kwTVYVWzF112x8Ep+jWPQ5Dugq5nFe86SRARlaGsh8qunkprW9qNHHwiyY35ym7e9VZPmSeVzHiXwMHp5t/Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-12-29 20:48:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FAFM			CONTRATO: 086/2023	
OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA			ESTIMACIÓN: 7 (SIETE) CONV MOD EXT	
			PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023	
			ESTADO FINANCIERO CON IVA	
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD	IMPORTE CONTRATADO:	\$ 982,596.97
	28° 21' 50.84" N	106° 11' 17" O	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 851,234.62
UBICACIÓN EJIDO LA NORIA			IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 129,368.98
CONTRATISTA ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY			IMPORTE ACUMULADO:	\$ 980,603.60
RFC: CABA-670418-AUA			IMPORTE POR ESTIMAR:	\$ 1,993.37

TIPO DE OBRA	IMPORTES S/IVA	OBSERVACIONES:
CONCEPTOS NORMALES:	\$ -	
CONCEPTOS EXCEDENTES:	\$ -	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ 111,524.98	
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	\$ -	
REINTEGRO DE LA RETENCIÓN ANTERIOR:	\$ -	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN S/IVA	\$ 111,524.98	

DESCUENTOS	
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES)	\$ 2,862.91
C.M.I.C. (0.2%)	\$ 223.05
D.I.F. (0.2%)	\$ 223.05
S.I.V.C. (0.5%)	\$ -
SUMA DE LOS DESCUENTOS	\$ 3,309.01
RESUMEN	
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN	\$ 111,524.98
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 28,310.83
SUBTOTAL	\$ 83,214.15
I.V.A.	\$ 13,314.26
TOTAL (IMPORTE FACTURADO)	\$ 96,528.41
TOTAL CON LETRA	
(NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 41/100 M.M.)	
DESCUENTOS	\$ 3,309.01
IMPORTE NETO A RECIBIR	\$ 93,219.40

ELABORÓ


ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
CONTRATISTA

REVISÓ


ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AUTORIZÓ


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CALCULO DE SACIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA
DEL CONTRATO 086/2023

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA


CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY

ESTIMACIÓN EN LA QUE SE APLICA ESTA SANCIÓN			7 CONV MOD EXT
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	16/12/2023	AL	29/12/2023
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO			15/10/2023

IMPORTES SIN I.V.A.	
MONTO CONTRATADO	847,066.35
MONTO ACUMULADO HASTA EL FIN DEL PERIODO CONTRATADO	730,289.83
MONTO FUERA DEL PERIODO CONTRATADO	116,776.52

INTERES MENSUAL POR ATRAZO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1%
DÍAS DESDE EL TERMINO DEL CONTRATO HASTA EL FIN DEL PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN	75
FACTOR DE SANCIÓN	2.451612903

IMPORTE DE LA SANCION	2,862.91
-----------------------	----------


ING. JESUS GERARDO FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZO

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$93,219.40 (NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DECINUEVE PESOS 40/100 M.N.), COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7 (SIETE) CONV MOD EXT, DEL CONTRATO 086/2023, POR EL TRABAJO DENOMINADO: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA.

1 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN (IMPORTES SIN IVA)

SUMA DE LOS TRABAJOS:	111,524.98
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	-
REINTEGRO:	-
ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:	111,524.98
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	28,310.83
SUBTOTAL:	83,214.15
IVA (16%):	13,314.26
IMPORTE DE LA FACTURA:	96,528.41
IMPORTE NETO A RECIBIR:	93,219.40

2 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO (LOS IMPORTES NO LLEVAN IVA)

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):	2,862.91
C.M.I.C. (0.2%):	223.05
D.I.F. (0.2%):	223.05
S.I.V.C. (0.5%):	-
SUMA DE DESCUENTOS:	3,309.01

3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO:	982,596.97
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:	-
ACUMULADO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN:	851,234.62
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN:	129,368.98
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	980,603.60
IMPORTE POR ESTIMAR:	1,993.37

4 RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO (SEGÚN FACTURA):	245,649.23
ACUMULADO AMORTIZADO ANTERIOR:	212,808.67
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	32,840.56
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	245,649.23
IMPORTE POR AMORTIZAR:	-

5 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO

	C.M.I.C. (0.2%):	D.I.F. (0.2%):	S.I.V.C. (0.5%):
ACUMULADO ANTERIOR:	1,467.65	1,467.65	-
ESTA ESTIMACIÓN:	223.05	223.05	-
ACUMULADO ACTUAL:	1,690.70	1,690.70	-

RECIBIMOS


ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
CABA-670418-AUA

HOJA DE PARTIDAS

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 7 (SIETE) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
TIPO DE TRABAJOS	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE
NORMALES			-
EXCEDENTES			-
EXTRAORDINARIOS	#10	EXTRAORDINARIOS	111,524.98
			111,524.98
SUBTOTAL:			111,524.98
IVA:			17,844.00
TOTAL:			129,368.98

ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA DE CONCEPTOS

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA						
ESTIMACIÓN 7 (SIETE) CONV MOD EXT								
PERÍODO: DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023								
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EIIDO LA NORIA						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PROYECTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR			ESTIMADO
	NORMAL							
	EXCEDENTE							
	EXTRAORDINARIOS							
EXT-03	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 1.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 2.00 m. barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced.30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m		100.00	2.00	98.00	1,138.01	111,524.98
			SUBTOTAL:				111,524.98	
			IVA:				17,844.00	
			TOTAL:				129,368.98	

EZ VILLAROBOS

ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

[PÁGINA 1/1]

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

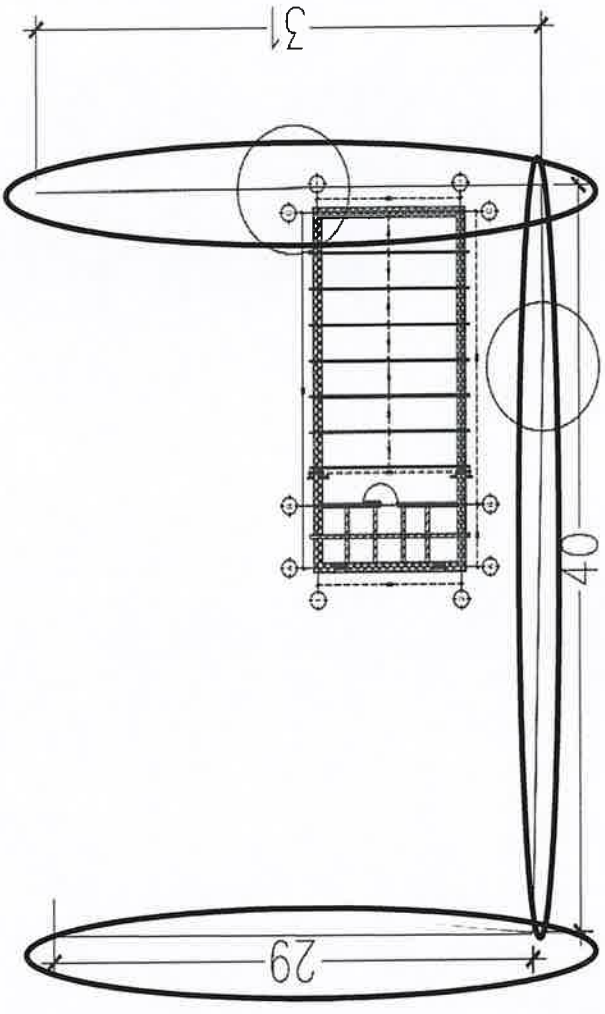
GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 7 (SIETE) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
#10. EXTRAORDINARIOS			
EXT-03	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 1.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 2.00 m. barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced.30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	METROS LINEALES 27 40 31	(PERIMETRAL) x 1 = 27 x 1 = 40 x 1 = 31
RESUMEN DE VOLUMEN		TOTAL	UNIDAD
PROYECTO:	-		
ACUMULADO ANTERIOR:	2.00		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	98.00		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	98.00		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	98.00		
SUMA DEL VOLUMEN:		98.00	m

ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 7 (SIETE) CONV MOD EXT			
PERIODO: DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
#10. EXTRAORDINARIOS			
EXT-03			
Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 1.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 2.00 m. barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced.30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		-	
ACUMULADO ANTERIOR:		2.00	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		98.00	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		98.00	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		98.00	

ING. ARNOLDO MENDEZ WILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
