

Fecha:

No.

001

NOTA 01

Lunes 09 de Mayo del 2022

Con esta nota y fecha siendo las 8:00 a.m. se hace la apertura de la bitácora de obra, con el fin de anotar todos los asuntos técnicos, administrativos y de progreso que se generen durante la ejecución de la obra:

- Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (II ETAPA) EN COL. LAS NORIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
- Oficio de Autorización: 2022-PDM-FISM-OP-010.
- Contrato: No. 030/2022
- Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES S. DE R.L. DE C.V.
- Domicilio fiscal: Rep. Dominicana, 805-A, Col. Panamericana, C.P. 31107 Chihuahua, Chih.
- Representante Legal: Saúl Omar Simental Ortega.
- Importe: \$ 8,194,297.14 (ocho millones, ciento noventa y cuatro mil doscientos noventa y siete pesos 14/100 M.N.) Incluyendo I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado).
- Periodo de Ejecución: de 210 días naturales debiendo iniciar el día Lunes 09 de Mayo del 2022 y concluir a más tardar el día Domingo 04 de Diciembre del 2022.

• AUTORIZADOS PARA FIRMA

- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (D.O.P.M.):
 - Residente de Obra: Ing. Lucha José Ayala Chávez
 - Cédula Profesional: No. 9844065
 - Domicilio: Calle Priv. De La Juventud, No. 10517, Col. Ignacio Allende, C.P. 31134, Cd. Chihuahua, Chih.
- Número de Teléfono: 614-170-04-66.
- CONTRATISTA:
 - Superintendente de Obra: A.g. Saúl Omar Simental Ortega
 - Cédula Profesional: No. 3463493
 - Domicilio: Rep. Dominicana, 805-A, Col. Panamericana, C.P. 31107, Cd. Chihuahua, Chih.
 - Número de Teléfono: 614-488-26-61

Ing. Lucha José Ayala Chávez
Residente de Obra
D.O.P.M.

Superintendente de Obra
CONTRATISTA

Fecha:

No.


002

NOTA 02

Lunes 09 de Mayo del 2022

Con esta nota y fecha siendo las 8:00 hrs. se establece lo siguiente:



- 1.- Se podrán aceptar notas de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs y sábados de 8:00 a 17:00 hrs. la bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.
- 2.- Se tendrá un plazo máximo para la firma de notas de 3 días naturales o en su equivalente a 72 horas naturales. Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas y/o autorizadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo se establece que por ninguna causa se podrán modificar y/o alterar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria, al igual que las notas que cuenten con tachaduras no serán válidas, en caso de cometer errores se deberá encerrar con los símbolos de corchetes ([]) y volver a escribir el texto o la palabra correcta.
- 3.- Los números generadores serán presentados semanal, quincenal o mensualmente, con periodos no mayores de 30 días naturales dentro de los 6 días naturales siguientes al día de término del periodo de la estimación, la residencia de obra para realizar la revisión y se aprobación de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación.
- 4.- Las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato (precio extras) se registrarán en esta bitácora por el residente de obra.



NOTA 03

Lunes 09 de Mayo del 2022

Este día se hace la entrega del lugar donde se realizarán los trabajos relacionados a la obra, el contratista manifiesta que comienza a trabajar sin que le otorguen el anticipo, no cobrará intereses generados por la entrega tardía de este, solo procederá para el diferimiento, se hace la entrega de los planos y proyecto de la obra en mención.

Fecha:

No.

003

NOTA 04

Lunes 09 de Mayo del 2022

Este día se comienza con los trabajos y se entregan las "Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus en el sitio de los trabajos de la Dirección de Obras Públicas Municipales" donde se hizo de su conocimiento al contratista de las medidas necesarias que se deben llevar a cabo para evitar la propagación del SARS-CoV-2 conocido como el nuevo coronavirus COVID-19, mediante un instructivo que este mismo compartió con sus trabajadores y ardo llevar a cabo estas medidas sanitarias en lo más posible.

NOTA 05

Jueves 12 de Mayo del 2022

- Trabajos de excavaciones, plantilla y nivelación de tubería del tramo 45-43
- Trabajos de relleno compactado en tramo 26-45
- Sondeo de tubería de 8" de agua potable.

NOTA 06

Martes 17 de Mayo del 2022

- Trabajos de excavaciones, plantillas, nivelación de tubería del tramo 92-91
- Conexión en pozo 94.
- Trabajos de relleno compacto en tramo 93-92.

NOTA 07

Viernes 20 de Mayo del 2022

- Trabajos de excavaciones, plantilla, nivelación de tubería del tramo 65-60
- Trabajos con relleno compactado en tramo 91-65
- Sondeo de tubería de 3" y tomar de agua potable.

Fecha:

No.

004

NOTA 08

Lunes 23 de Mayo del 2022

- Trabajos de plantilla, nivelación de tubería del tramo 09-47
- Trabajos de relleno compactado en tramo 40-89
- Saneos de tubería de 3" y tomar de agua potable.

NOTA 09

Jueves 26 de Mayo del 2022

- Construcción de pozos de visita, excavaciones del tramo 64-65
- Rellenos compactados en tramo 57-64
- Colado de bocales en pozos.
- Saneos de tubería de 3" y tomar de agua potable.

NOTA 10

Martes 31 de Mayo del 2022

- Excavaciones, plantillas, nivelación de tubería en tramo 66-67.
- Rellenos de protección y rellenos compactos en tramo 65-66.
- Saneos de tubería de 3" y tomar de agua potable.
- Se recibe Estimación 1 Normal para su revisión.

NOTA 11

Viernes 03 de Junio del 2022

- Excavaciones, plantillas y nivelación de tubería del tramo 75-94 y 94-96.
- Rellenos compactados en tramo 76-75
- Saneos de tubería de agua potable.
- Construcción de pozos de visita
- Colado de bocales en pozos de visita.
- Se entrega Estimación 1 Normal para su revisión y lista para su facturación y trámite.

Fecha:

No.

005

NOTA 12

Lunes 06 de Junio del 2022

- Excavaciones, plantillas y nivelación de tubería de los tramos 77-78 y 78-79
- Rellenos de protección y rellenos compactados en tramo 77-78
- Sondeos de tubería de 3" y tomas de agua potable.

NOTA 13

Jueves 09 de Junio del 2022

- Plantillas, rellenos de protección y rellenos compactados en los tramos 82-81, 81-80 y 77-82.
- Sondeos de tubería de 3" y tomas domiciliarias.

NOTA 14

Martes 14 de Junio del 2022

- Excavaciones, nivelación de tubería y rellenos compactados en los tramos 80-67 y 79-80.
- Construcción de pozos de visita y colado de sacales.
- Sondeos de tubería de 3" y tomas de agua potable.

NOTA 15

Viernes 17 de Junio del 2022

- Rellenos compactados en el tramo 80-67 y 79-80.
- Excavación para descargas domiciliarias del tramo 93-92, 92-91 y 91-55.
- Se entrega Estación No. 2 Normal para su revisión.

NOTA 16

Lunes 20 de Junio del 2022

- Excavación para descargas domiciliarias del tramo 65-64, 64-67 y 65-90.
- Construcción de registros albañales del tramo 93, 92, 92-91 y 91-65.

Fecha:

No.

006

NOTA 17

Jueves 23 de Junio del 2022

- Excavación para descargas domiciliarias del tramo 65-66, 66-67, 67-68 y 68-69.
- Construcción de registros albañales del tramo 65-66, 66-67 y 67-68.
- Se entrega Estimación 2 Revisada y lista para su facturación.

NOTA 18

Viernes 24 de Junio del 2022

- Excavación para descargas domiciliarias del tramo 76-77, 77-78, 78-79 y 79-80.
- Construcción de registros albañales del tramo 65-66, 66-67, 67-68 y 68-69.
- Colado de tapas para registros albañales.

NOTA 19

Jueves 30 de Junio del 2022

- Excavación para descargas domiciliarias del tramo 77-78, 78-79, 79-80 y 80-81.
- Construcción de registros albañales del tramo 76-77, 77-78, 78-79 y 79-80.
- Se entrega Estimación No. 3 Normal para su revisión.

NOTA 20

Lunes 04 de Julio del 2022

- Excavaciones en meteral "B", colocación de plantilla y nucleación de tubería del tramo 74-75 y 75-76.
- Colocación de tapas para registros albañales.
- Se entrega Estimación No. 3 Revisada y lista para su facturación.

Fecha:

No.

007

NOTA 21

Jueves 07 de Julio del 2022

- Excavaciones en material "B" y "C" en tramo 72-68 y 68-67.
- Relleno compactado con material de banco en capas de 20 cm de los tramos 74-73 y 73-72.

NOTA 22

Martes 12 de Julio del 2022

- Excavación en material "B" y "C" del tramo 66-83 y 83-84.
- Relleno con material de banco compactado en capas de 20 cm del tramo 72-68 y 68-67.
- Excavación para descargar domiciliarias del tramo 74-73 y 73-72.

NOTA 23

Viernes 15 de Julio del 2022

- Excavaciones en material "B" y "C" del tramo 84-85 y 85-86.
- Compactación en capas de 20 cm con material de banco del tramo 66-83 y 83-84.
- Construcción de registros albañiles del tramo 74-73 y 73-72.

NOTA 24

Lunes 18 de Julio del 2022

- Excavaciones en material "B" y "C" del tramo 83-88 y 88-87.
- Relleno con material de banco compactados con material de banco en tramos 84-85 y 85-86.
- Excavación para descargar domiciliarias del tramo 66-83, 83-84 y 84-85.

Fecha:

No.

008

NOTA 25

Jueves 21 de Julio del 2022

- Excavaciones en material "B" y "C" del tramo 07-06 y 06-51
- Compactación en zanjas con material de banco de los tramos 03-08 y 08-07.
- Construcción de registros albañales de los tramos 66-03, 03-04 y 04-05.
- Excavaciones en material "B" y "C" para descargas domiciliarias de los tramos 05-06 y 03-08.

NOTA 26

Martes 26 de Julio del 2022

- Compactación con material de banco en tramo 07-06 y 06-51.
- Excavaciones en material "B" y "C" para descargas domiciliarias de los tramos 08-07 y 07-06.
- Construcción de registros albañales de los tramos 05-06 y 07-08.

NOTA 27

Viernes 29 de Julio del 2022

- Rellenos compactados con material de banco en descargas domiciliarias.
- Excavaciones en material "C" del tramo 06-51 para descargas domiciliarias.
- Construcción de registros albañales del tramo 08-07 y 07-06.
- Se entrega Estimación 4 Normal para su revisión.

NOTA 28

Lunes 01 de Agosto del 2022

- Construcción de registros albañales del tramo 06-51.
- Excavación en material "C" en tramo 08-06.
- Excavación en material "B" para descargas domiciliarias del tramo 06-05.
- Se entrega Estimación 4 Normal revisada y lista para su facturación.

Fecha:

No.

009

NOTA 29

Jueves 04 de Agosto del 2022

- Excavaciones en material "C" del tramo 68-69
- Construcción de descargas domiciliarias del tramo 72-68.

NOTA 30

Martes 09 de Agosto del 2022

- Trabajos de plantilla, instalación de tubería de PVC y relleno con material de banco para cama de protección del tramo 68-69.
- Construcción de registros albañales del tramo 72-68.
- Excavación en material "C" para descargas domiciliarias del tramo 68-69.

NOTA 31

Viernes 12 de Agosto del 2022

- Excavación en material "C" en tramo 68-71
- Construcción de registros albañales en tramo 68-69.

NOTA 32

Lunes 15 de Agosto del 2022

- Se presentan fuertes lluvias durante la semana pasada.
- Se trabaja con rellenos compactados con material de banco del tramo 68-71.
- Excavación en material "C" para descargas domiciliarias en tramo 68-71
- Excavación en material "C" del tramo 71-70

NOTA 33

Jueves 18 de Agosto del 2022

- Se siguen presentando fuertes lluvias en la zona.
- Rellenos compactados con material de banco seco del tramo 71-70
- Excavación en material "C" del tramo 70-52.

Fecha:

No.

010

NOTA 34

Martes 23 de Agosto del 2022

- Se siguen presentando fuertes lluvias derivado de las seve reflejado con hundimientos en excavaciones ya, rellenos y compactados, por lo cual se da la instrucción al contratista de que realice nuevamente excavaciones, retiro de material agudizado con profundidad de 0.80m a 1.00m según sea el caso y lo que requiera en espesor, relleno de otra con material de banco sea, para amacizar para lo cual no se pagará la excavación, solo procederá para pago de suministro de material de banco, compactación al 90%, retiro a 1er Km y retiro de Km subsiguiente del material extraído.

NOTA 35

Viernes 26 de Agosto del 2022

- Construcción de descargas domiciliarias en tramo 71-70.
- Rellenos compactos con material de banco en calle Diana Laura del tramo 26-93 y 76-96.

NOTA 36

Lunes 29 de Agosto del 2022

- Construcción de descargas domiciliarias del tramo 70-52
- Construcción de registros albañales en tramo 71-70.
- Rellenos compactados con material de banco en calle Norma de Jesús y calle La Noria del tramo 93-47 y 57-65.
- Se recibe Estimación 5 Normal para su relación.

NOTA 37

Jueves 01 de Septiembre del 2022

- Se siguen presentando fuertes lluvias durante la mañana.
- Construcción de registros albañales del tramo 70-52
- Rellenos compactados con material de banco en calle La Noria y calle Norma de Caneles de los tramos 65-69 y 60-51
- Se entrega Estimación 5 Normal revisada y lista para su facturación.

Fecha:

No.

011

NOTA 38

Martes 06 de Septiembre del 2022

- Rellenos compactados con material de banco en calle Noma de Luis del tramo 76-67
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 76-93 y 76-96.
- Se entregan las siguientes O.C. para conceptos con volumen excedente:
 - 04 - Suministro de material de banco
 - 06 - Excavación en material "B"
 - 03 - Suministro de graca redondo.

NOTA 39

Viernes 09 de Septiembre del 2022

- Rellenos compactados con material de banco en calle Noma de Jureo del tramo 96-68
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 93-65
- Se entregan las siguientes O.C. para conceptos con volumen excedente:
 - 10 - Construcción de pozo de visita de 2.00m a 2.50m de profundidad.
 - 11 - Construcción de pozo de visita de 1.50m a 2.00m de profundidad.

NOTA 40

Lunes 12 de Septiembre del 2022

- Rellenos compactados con material de banco en calle Noma de Jureo del tramo 68-52.
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 57-69.
- Se entregan las sig. O.C. para conceptos con volúmenes excedentes:
 - 16 - Relleno compactado al 90%.
 - 17 - Excavaciones para localización de líneas existentes (sondeos).

NOTA 41

Jueves 15 de Septiembre del 2022

- Limpieza y revisión de pozos de visita del tramo 66-51.
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 66-51.
- Se entregan las sig. O.C. para conceptos con volúmenes excedentes:
 - 18 - Acarreo de material a 1 Km.
 - 19 - Acarreo de material en Km subsecuentes.

Fecha:

No.

012

NOTA 42

Martes 20 de Septiembre del 2022

- Limpieza y revisión de pozos de visita del tramo 76-67.
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 76-67.
- Se entregan las sig. O.C para conceptos con volumen excedente:
- 21- Suministro de material de banco.
- 26- Descargas domiciliarias.

NOTA 43

Viernes 23 de Septiembre del 2022

- Limpieza y revisión de pozos de visita del tramo 96-68.
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 96-68.
- Se entrega la sig. O.C para concepto con volumen excedente:
- 27- Registro albanal.

NOTA 44

Lunes 26 de Septiembre del 2022

- Limpieza y revisión de pozos de visita del tramo 68-52.
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 68-52.
- Se entregan las siguientes O.C para conceptos con volumen excedente:
- 30- Acarreo de material a 1 Km.
- 31- Acarreo de material en Km subsiguientes.

NOTA 45

Jueves 29 de Septiembre del 2022

- Limpieza y revisión de pozos de visita del tramo 65-47.
- Revisión de descargas domiciliarias del tramo 65-47.
- Se recibe estampación 6 Excedente para su revisión y de igual forma se solicita convenio modificatorio por obra excedente.

Fecha:



No.

013

NOTA 46

Martes 04 de Octubre del 2022



- Se entrega estimación 6 Excedente revisada y lista para facturar y tramitarla.



NOTA 47

Viernes 07 de Octubre del 2022


- Se suministra material de banco para mejorar calle afectada por lluvias.



NOTA 48

Lunes 10 de Octubre del 2022



- Se trata material de banco con agua para homogenizar y se tendido en capa de 20 cm.



NOTA 49

Jueves 13 de Octubre del 2022

- Trabajos de tendido y compactación de material de banco.



NOTA 50

Martes 18 de Octubre del 2022

- Trabajos de firme con material de banco y compactación.
- Se realizan limpiezas en las calles para finalizar la obra.



Fecha:



No.

014

NOTA 51

Viernes 21 de Octubre del 2022



- Se entrega la siguiente orden de campo para volumen y concepto Extraordinario:
- EXT-01 - Mejoramiento de terracerías con material de banco.
- Se realizan limpiezas para entrega de obra.

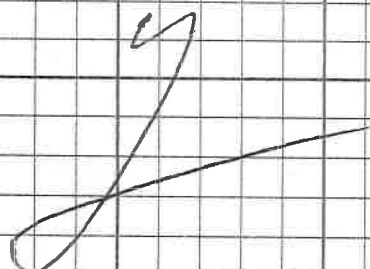

NOTA 52

Martes 25 de Octubre del 2022

- Limpiezas en pozos de visita y descargas domiciliarias.
- Se recibe Estimación 7 de obra extraordinaria para ser revisada.



NOTA 53

Viernes 28 de Octubre del 2022

- Se entrega Estimación 7 Final de obra por obra excedente revisada y lista para ser tramitada, de igual forma se solicita convenio por obra excedente Extraordinaria.
- Para esta fecha se encuentra terminada la obra, se procede a realizar el cierre administrativo de esta, así como la entrega de la misma a la dependencia encargada de su ejecución y mantenimiento.
- Con esta nota y fecha, siendo las 12:00 horas se da por terminada la obra y el cierre de esta bitácora, estando conforme ambas partes.

