

PAEDDA CONSTRUCCIONES

EDUARDO POSADA QUEZADA
POQE650216GK0
Domicilio Fiscal
CALLE 18 4602
Col. BELLAVISTA 31050
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144350631

Factura No: 83
FOLIO FISCAL (UUID):
64D0C89B-B092-4F11-961D-427535E636CB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000202605182
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-12-19T14:03:04
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-12-19T14:03:03

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA Chihuahua
México

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 19 diciembre 2014
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO VALLE DORADO, UBICADO EN CALLE PRADERAS DE SAN IGNACIO Y CALLE DINOSAURIO, COLONIA VALLE DORADO ESTIMACIÓN No 2 (DOS) SEGÚN CONTRATO No.280/2014 ALCANCE DE ESTA ESTIMACIÓN \$ 585,229.83 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO \$ 175,568.95 DESCUENTOS: 0.2% I.C.I.C \$ 1,170.46 0.2% INST \$ 1,170.46 0.2% D.I.F \$ 1,170.46 0.5% INS. Y VIG \$ 2,926.15 SUMA DESCUENTOS \$ 6,437.53 NETO A RECIBIR \$ 468,769.09	\$ 409,660.88	\$ 409,660.88

MONTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS, 62/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 409,660.88
IVA(IVA 16.00%): \$ 65,545.74
TOTAL: \$ 475,206.62

ELLO DIGITAL DEL CFDI

30GwRhlWb2sBicGwRk4UvNfR4mVQroPITXIGQpe337aByRTOIMdFach2zhBmFK1mVIFEYXg/EGM3BM8T7FAMcmSNzvsBasj9Yz5tjQdHK1kn1elmd4wNGevKSyngnbR5YEceCQ/RcmMnGMJYTGlnh3EHazic

ELLO DIGITAL DEL SAT

95v0a8dLog88IO4SUvrmkmGbpVg8o62ka7YWPBmCD03hY6BlaCW5bBV2nJ4yWh7cOmLCM34xVKJLQZMS9TyTEKnoBskDxN81BK34pw22eL9s7OgGYOgsgZFuCStrMidX9rAN0Jc1MXa2zHHWPmgGSLQBRg

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.01640C89B-B092-4F11-961D-427535E636CB2814-12-19T14:03:04G306wRhlWb2sBicGwRk4UvNfR4mVQroPITXIGQpe337aByRTOIMdFach2zhBmFK1mVIFEYXg/BEGM3BM8T7FAMcmSNzvsBasj9Yz5tjQdHK1kn1elmd4wNGevKSyngnbR5YEceCQ/RcmMnGMJYTGlnh3EHazic00001000000203495276



Este documento es una representación impresa de un CFDI
provisión de los impuestos que pagan por los contribuyentes.
Este folio digital es parte de un programa de certificación de inversión con
Saque por el cual, los contribuyentes podrán beneficiarse de los beneficios
que les otorga el SAT. Este folio digital es parte de un programa de
certificación de inversión con el cual, los contribuyentes podrán beneficiarse
de los beneficios que les otorga el SAT.

Folios Digitales
Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT# 05710



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: DIRECTO MUNICIPAL	CONTRATO No. 280/2014	CONTRATADOS
OBRA: CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO VALLE DORADO, UBICADO EN CALLE PRADERAS DE SAN IGNACIO Y CALLE DINOSAURIO, COLONIA VALLE DORADO	ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)	\$ 3,760,846.57 CON IVA
UBICACIÓN: CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014	
CONTRATISTA: ING. EDUARDO POSADA QUEZADA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 678,866.60 CON IVA
RFC PQQE650216GK0	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 796,802.72 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 1,475,669.32 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 582,452.49	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 2,777.34	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 585,229.83	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 1,170.46
0.2% INSTITUTO	\$ 1,170.46
0.2% D.I.F.	\$ 1,170.46
0.5 INSP. Y VIGILANCIA	2,926.15
SUMA DESCUENTOS	\$ 6,437.53

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 585,229.83
AMORT ANTICIPO	\$ 175,568.95
SUB-TOTAL	\$ 409,660.88
I.V.A.	\$ 65,545.74
TOTAL	\$ 475,206.62

(CON LETRA)

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 62/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 6,437.53
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 468,769.09

AUTORIZO

ELABORO

ING. GERARDO TALAVERA TALAVERA
RESIDENTE D.O.P.M

ING. EDUARDO POSADA QUEZADA
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. ENRIQUE VILARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSERVACION
DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Vo. Bo.

ING. GABRIEL AUDEVENTOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Este es un documento de trabajo de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el cual no tiene validez legal. Toda información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser utilizada para fines legales. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser utilizada para fines legales. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser utilizada para fines legales.

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT


Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
POQE650216GK0	EDUARDO POSADA QUEZADA	MC651010Y22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
64D0C89B-B092-4F11-961D-427535E636CB	2014-12-19T14:03:03	2014-12-19T14:03:04	FMD10020357
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$475,206.62	ingreso	Vigente	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CHIHUAHUA, CHIH.,

30/NOVIEMBRE/2014.

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 468,769.09
(CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 9/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 280/2014 POR LA CANTIDAD DE: \$ 3,760,846.57 INCLUYE CONVENIO
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 MN POR TRABAJOS EN LA OBRA:
CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO VALLE DORADO, UBICADO EN CALLE PRADERAS DE SAN IGNACIO Y CALLE
DINOSAURIO, COLONIA VALLE DORADO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 585,229.83

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 175,568.95

		SUBTOTAL	\$	409,660.88
		IVA	\$	65,545.74
		TOTAL	\$	475,206.62
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO				
I.C.I.C. DEL 0.2%	1,170.46			
INSTITUTO 0.2%	1,170.46			
D.I.F. 0.2%	1,170.46			
INSPECCION Y VIGILANCIA 0.5%	2,926.15			
SUMA	6,437.53			

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 3,760,846.57
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 796,802.72
ESTA ESTIMACION	\$ 678,866.60
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 1,475,669.32
POR EJERCER	\$ 2,285,177.25

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 1,128,253.97
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 239,042.61
ESTA ESTIMACION	\$ 203,659.98
ACUMULADO ACTUAL	\$ 442,702.59
POR AMORTIZAR	\$ 685,551.38

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% I.C.I.C	0.2% INSTITUTO	0.2% DIF	0.5% INSP Y VIG
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,373.81	\$ 1,373.81	\$ 1,373.81	\$ 3,434.52
ESTA ESTIMACION	\$ 1,170.46	\$ 1,170.46	\$ 1,170.46	\$ 2,926.15
ACUMULADO ACTUAL	\$ 2,544.27	\$ 2,544.27	\$ 2,544.27	\$ 6,360.67

R E C I B I M O S

ING. EDUARDO POSADA QUEZADA
POQE650216GK0

El presente documento es una copia de la factura de pago de la obra de construcción de desarrollo comunitario Valle Dorado, ubicada en Calle Praderas de San Ignacio y Calle Dinosaurio, Colonia Valle Dorado, emitida por el Municipio de Chihuahua, Chihuahua, México, a favor de la empresa contratada, la cual es válida para ser presentada ante la autoridad competente para la emisión de la factura de pago de la obra.



OBRA: CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO VALLE DORADO UBICADO EN CALLE PRADERAS DE SAN IGNACIO Y CALLE DINOSAURIO, COLONIA VALLE DORADO

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

CONTRATISTA: ING. EDUARDO POSADA QUEZADA

PERÍODO: 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)

No. CONTRATO: 280/2014

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	

NORMALES	
	\$ 582,452.49
EXCEDENTES	
	\$ 2,777.34
EXTRAS	
	\$

El presente documento es una copia de la estimación de obra que se encuentra en el expediente de la obra, la cual es de carácter informativo y no tiene validez legal. La estimación de obra es un documento que se genera en el momento de la adjudicación de la obra y que sirve como base para la ejecución de la misma. La estimación de obra es un documento que se genera en el momento de la adjudicación de la obra y que sirve como base para la ejecución de la misma.

POR EL CONTRATISTA

ING. EDUARDO POSADA QUEZADA

SUBTOTAL \$	585,229.83
I.V.A. \$	93,636.77
TOTAL \$	678,866.60

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING. GERARDO YALAVEA YALAVEA



OBRA:	CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO VALLE DORADO, UBICADO EN CALLE PRADERAS DE SAN IGNACIO Y CALLE DINOSAURIO, COLOMIA VALLE DORADO
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA
CONTRATISTA:	ING. EDUARDO POSADA QUEZADA
PERIODO:	16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)
No. CONTRATO:	280/2014

No.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR		

OBRA NORMAL							\$ 582,452.49
3 CENTRO COMUNITARIO							
3.2	ESTRUCTURA						
3.2.2	Trobe de Concreto 1-1, con dimensiones de 0.60 x 0.40 m. Fabricada con concreto f'c= 250 kg/cm ² , acero de refuerzo 6VS#8-Estribos#2@20cms de fy4200kg/cm ² . Incluye: cimbra, curado, vibrado, curado, acabados, chalfanes en esquinas y todo lo necesario para su correcta instalación. Detalles y especificaciones de acuerdo a proyecto.	m	252.00	192.28	0.00	1,218.13 \$	234,222.04
3.2.2B	Trobe de Concreto 1-2, con dimensiones de 0.60 x 0.40 m. Fabricada con concreto f'c= 250 kg/cm ² , acero de refuerzo 9VS#8-Estribos#2@20cms de fy4200kg/cm ² . Incluye: cimbra, curado, vibrado, curado, acabados, chalfanes en esquinas y todo lo necesario para su correcta instalación. Detalles y especificaciones de acuerdo a proyecto.	m	30.00	30.00	0.00	1,218.13 \$	36,543.90
3.2.3	Losa de azoles de 0.15 m. de espesor aligerada con case-ton 50 x 60 x10, a base de concreto f'c=210 kg/cm ² , armada con 2 varillas No. 3 en cada calle ambas sentidas y 2 bastones No. 3, aligerada con case-ton 50x60x10 y trabe inferioridad de 20x25 armada con 2 varillas No. 4 inferior mas 2 No. 3 superior con estribos de 1/4 @ 20 cms. Incluye acero para anclaje, cimbrada, armada, calada, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m ²	716.00	680.91	0.00	457.75 \$	311,686.55

OBRA EXCEDENTE							\$
3 CENTRO COMUNITARIO							
3.2	ESTRUCTURA						2,777.34

POR EL CONTRATISTA:

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION



OBRA: CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO VALLE DORADO UBICADO EN CALLE PRADERAS DE SAN IGNACIO Y CALLE

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

CONTRATISTA: ING. EDUARDO POSADA QUEZADA

PERIODO: 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)

No. CONTRATO: 280/2014

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
3.2.28	Trabe de Concreto 1-2, con dimensiones de 0.60 x 0.40 m. Fabricada con concreto f'c= 250 kg/cm2 , acero de refuerzo 9VS#8-Estribas#2@20cms de fy=200kg/cm2. Incluye: cimbra, curado, vibrada, curada, acabadas, chalfanes en esquinas y toda la necesidad para su correcta instalacion. Detalles y especificaciones deacuerda a proyecto.	m	30.00	32.28	30.00	2.28	1,218.13	2,777.34

SUBTOTAL	\$	585,229.83
IVA	\$	93,636.77
TOTAL	\$	678,866.59

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de trabajo celebrada el día 16 de octubre de 2014, en la que se discutió y acordó la ejecución de los trabajos de construcción de desarrollo comunitario en el Valle Dorado, ubicado en la calle Praderas de San Ignacio y Calle...

POR EL CONTRATISTA:

ING. EDUARDO POSADA QUEZADA

POR LA OFICINA DE CONSTRUCCION

ING. GERARDO TALAVERA



COMUNIDAD VALLE DORADO



PAEDDA CONSTRUCCIONES
Ing Eduardo Posada Quezada

LICITACION : I.O-808019998-N73-2014		CONTRATISTA: ING.EDUARDO POSADA QUEZADA		U.M	M
OBRA: CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO VALLE DORADO		CONTRATO: 280/2014		PLANO	
UBICACIÓN. CALLE PRADERAS DE SAN IGNACIO Y CALLE DINOSAURIO COL VALLE DORADO		CONCEPTO: 3.2.2		ESTIMACION 2	

LABORÓ
PAEDDA CONSTRUCCIONES


ING.EDUARDO POSADA QUEZADA
RESPONSABLE DE OBRA

AUTORIZO

ING.GERARDO TALAVERA TALAVERA

SUPERVISOR DE OBRA

Vº. Bº.

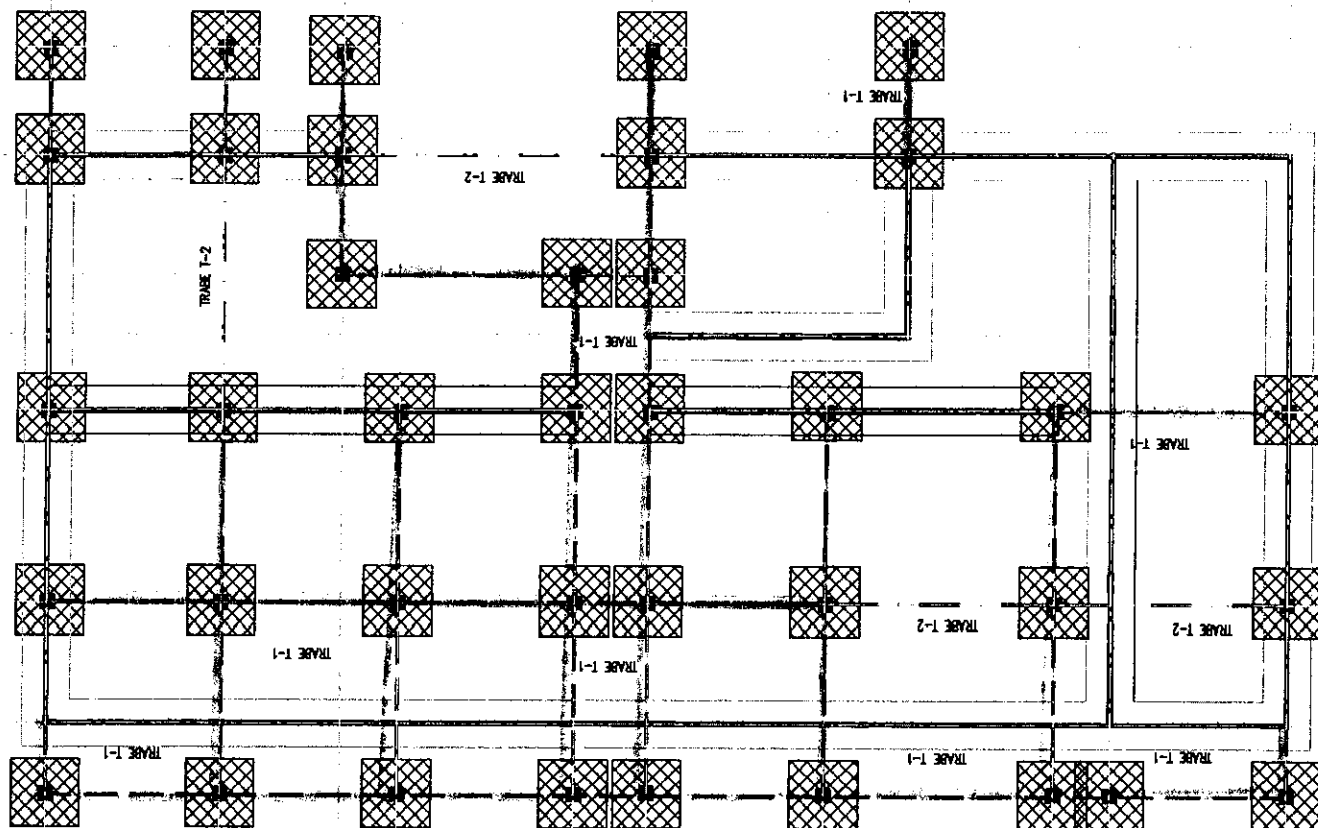

This is a floor plan of a building. The plan shows a grid of rooms. The rooms are labeled with "TRADE 1-1" and "TRADE 1-2". The plan also shows a large rectangular area on the right side of the plan, which is outlined with a double line. The plan is oriented with the top of the page towards the left.



Ing. Eduardo Posada Quezada

CLABORÓ
PACIFICA CONSTRUCCIONES
INGENIAROS POSADA QUIZADA
RESIDENTE DE UNHA

LABOR
PACIENTES CON INFECCIONES

ING. EDUARDO POSADA QUIZADA
RESIDENTE DE UGHA

AUTORIZAÇÃO

ING. GERARDO TALAVERA TALAVERA

SUPERVISOR DE OBRAS

ପ୍ରଫ. ସି. ଶତ୍ତ.




Ing. Eduardo Posada Quezada

[illegible]

LABORÓ
FABRICA CONSTRUCCIONES
INGENIARDO POSADA QUEZADA
RESIDENTE DE URNA

AUTORIZO
ING. GERARDO TALavera TALavera
SUPERVISOR DE OBRA

Wb. No.

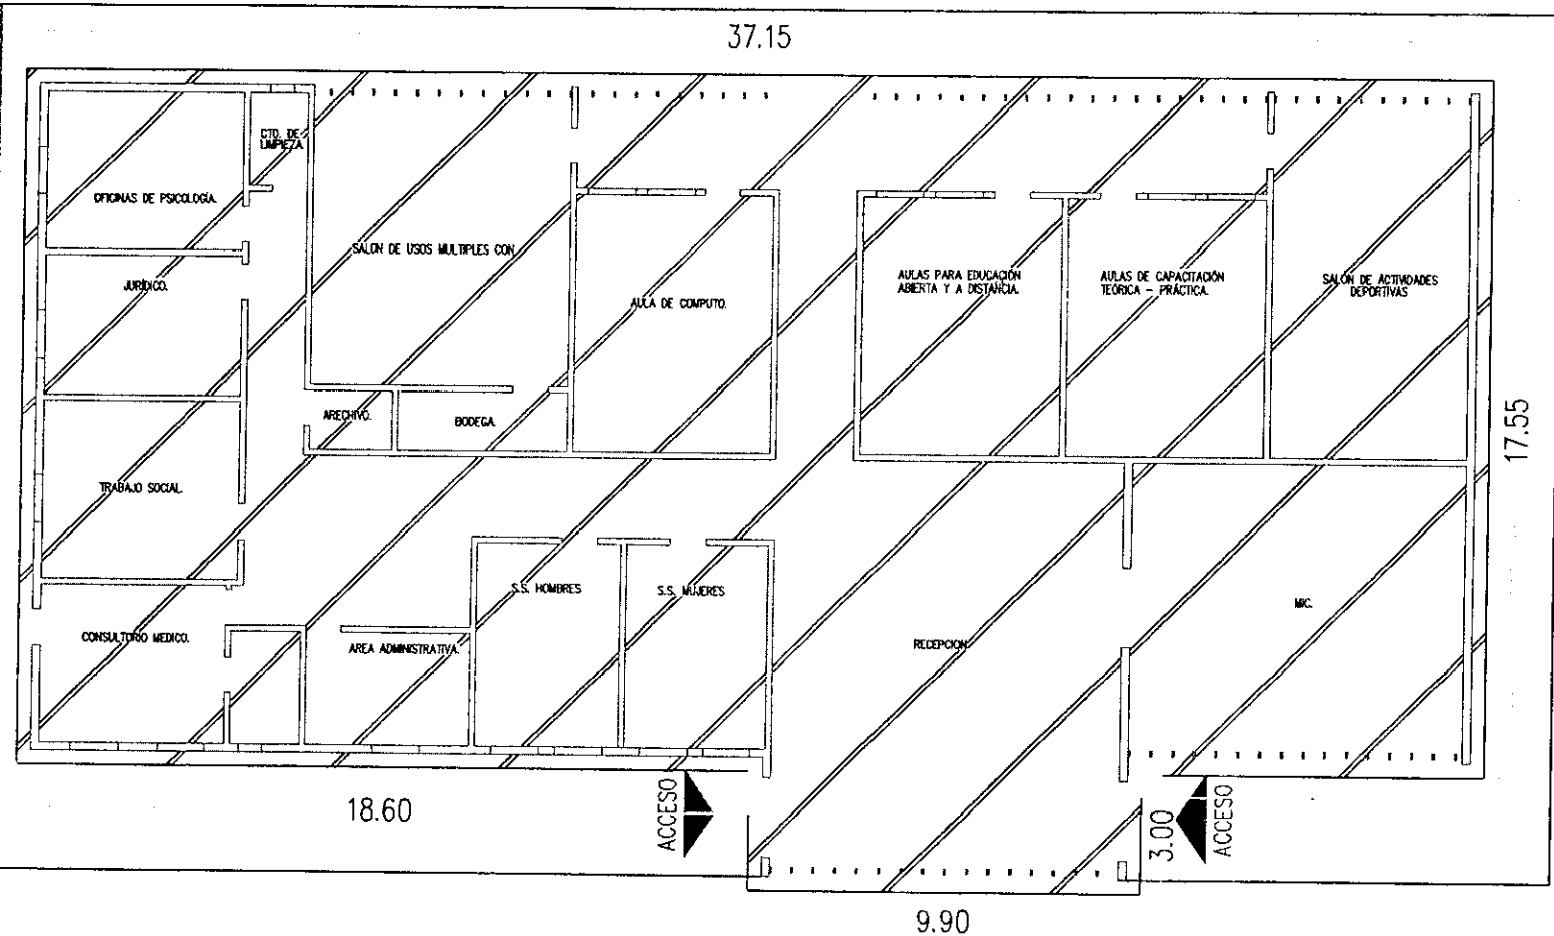

Elaborado por: [illegible]
 Revisado por: [illegible]
 Aprobado por: [illegible]
 Fecha: [illegible]
