



Copy

Depto. de Licitaciones y Control de Obra.

Oficio No. D/3270/2019

Asunto: envío factura de pago.

Chihuahua, Chih., a 25 de septiembre de 2019.

Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU.
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
PRESENTE.


Anexo al presente envío a usted el siguiente documento de GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A DE C.V. en original y una copia:

Factura No. 502, relativo a la ESTIMACION 2 de la obra "Rehabilitación de Canchas Parque Banderas;", según contrato 066/2019, por un importe de \$ 281,307.88 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 88/100 M.N.), según oficio de autorización No. 2019-PDM-PCAM-AT-019 y proyecto No. 2019AT000026.

Con cargo al techo financiero municipal. Lo anterior a fin de realizar el trámite correspondiente.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

C.C.P. ARCHIVO.

CHCG/MCMR/GMM





GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV

GDC0101265T8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE LEIBNITZ, No. 117/PISO 3, NUEVA ANZURES, 31134, Ciudad de México,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
Tel. (55)47399200

SUCURSAL

Av. Zarco, 2411, Jardines del Santuario, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. (614)4113864

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

USO CFDI: I01 - Construcciones

CALLE MINA, No 408, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 502

FOLIO FISCAL (UUID)

A42A3CA3-57C9-4B17-9984-20E923438821

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408645659

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-19T13:53:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-19T13:44:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31000

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo)

05A84516-E54E-4CBF-AF46-E12647B5204A

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 02 (DOS) PARA LA OBRA REHABILITACION DE CANCHAS DE PARQUE BANDERAS; SEGUN CONTRATO No. 066/2019	\$ 242,506.79	\$ 242,506.79

Clave Prod. Serv. - 70111713 Servicios de administración o mantenimiento de parques
Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 242,506.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38,801.09

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 447,796.09

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 205,289.30

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% \$ 895.59

DIF DEL 0.2% \$ 895.59

\$ 1,791.18

NETO A RECIBIR \$ 279,516.70

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS, 88/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 242,506.79

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 38,801.09

TOTAL

\$ 281,307.88

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vu/u073XieRajjWGNXa6PIBvG7asQxGjdGHfKafK0aB9+nR/63H9BIFqVOJHw4fBWQmmlMCSII9wOvT75YOQYBbFLSdxphVQgGQpNLUbwLwvuu+uefQaVWH/Ev1f15WjzC8IOJ77/LF+Xx0O1b2i727QTQmGNTaajcJW4ELNBOJSLANm4ODzTb9Vv+MUZ6kJon++CIsHQQ9gpO0ZDIPA8qpQYdxChVq8JAKy1mASZtyscBgQzOIpp28GXODWJXdhq7bJQr3yDs1VvhdyztuYJsnY4Sjdx2gBGjpxZ2jCgVvDz0lk7Dz8LITJyT/BuzSIEhYzOJBs9lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QEUGAc6RLZCqD2J8ulc54oSaSd6Zqs/tK9q/PKBRRCid+azFLdapZiWcO2EszORRn3P0PvVsf4MaeFxiKLiDabuNeVnD3Zqu4i8o8viglPG8Q6Ewb0pTvB8CpmleogXuEsl49RGucA7644vEvK0EEz5H5iCoWEZVWVRvzVZN8suVVCsatZa02t9fbcHgxeVOKLJTn8IXZBLI6iw5yyViVmtsgIEJBfQsgxe01IRASaDSyGIBOCPB4T9sNi0vo+Hy0rA/NqaxwTzFLPInDFZhfYkHuh8y+88oCblpv2687SD893nlygo1cduyRBvmlBsl3QWf8dyll/3V17eEY5v5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1j1.1A42A3CA3-57C9-4B17-9984-20E923438821|2019-09-19T13:53:24|FLI081010EK2|Vu/u073XieRajjWGNXa6PIBvG7asQxGjdGHfKafK0aB9+nR/63H9BIFqVOJHw4fBWQmmlMCSII9wOvT75YOQYBbFLSdxphVQgGQpNLUbwLwvuu+uefQaVWH/Ev1f15WjzC8IOJ77/LF+Xx0O1b2i727QTQmGNTaajcJW4ELNBOJSLANm4ODzTb9Vv+MUZ6kJon++CIsHQQ9gpO0ZDIPA8qpQYdxChVq8JAKy1mASZtyscBgQzOIpp28GXODWJXdhq7bJQr3yDs1VvhdyztuYJsnY4Sjdx2gBGjpxZ2jCgVvDz0lk7Dz8LITJyT/BuzSIEhYzOJBs9lw==|00001000000403498740|



Facturar en línea® **CFDI**

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GDC0101265T8	GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A42A3CA3-57C9-4B17-9984-20E923438821	2019-09-19T13:44:00	2019-09-19T13:53:24	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$281,307.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
[Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
[Sistema Infomex \(https://www.infomex.org/gobierno/federal/home.action\)](https://www.infomex.org/gobierno/federal/home.action)
[INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)


¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- English (<https://www.gob.mx/en/index>)
- Temas (<https://www.gob.mx/temas>)
- Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)



Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



Síguenos en

RESUMEN DE ESTIMACION



PROGRAMA: PCAM2019	CONTRATO No. 066/2019 ✓	CONTRATADO \$ 964,876.78 CON IVA
OBRA: Rehabilitación de Canchas Parque Banderas;	ESTIMACIÓN No. ESTIMACION 2 ✓	
	PERIODO EJEC. 15-AGO-2019 al 13-SEP-2019	
UBICACIÓN: CALLE AV. PUNTA ALAMILLO Y AV. PUNTA ANGOSTURAS # Col.PUNTA ORIENTE	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 519,443.46
CONTRATISTA: GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 369,537.81
RFC GDC0101265T8	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 888,981.27

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 447,796.09	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ 0.00	
<u>EXTRAS</u>	\$ 0.00	
<u>DEVOLUCIÓN</u>	\$ 0.00	
<u>RETENCIÓN</u>	\$ 0.00	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 447,796.09 ✓	

DESCUENTOS

0.2 % C.M.I.C.	\$ 895.59 ✓
0.2 % D.I.F.	\$ 895.59 ✓
SUMA DESCUENTOS	\$ 1,791.18

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 447,796.09
AMORT ANTICIPO	\$ 205,289.30
SUB-TOTAL	\$ 242,506.79 ✓
I.V.A.	\$ 38,801.09 ✓
TOTAL	\$ 281,307.88 ✓

(CON LETRA)
(DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 88/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 1,791.18
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 279,516.70 ✓

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A DE C.V.

ELABORO CONTRATISTA
REVISO

Jesus m. Franco
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

AUTORIZO RESIDENTE D.O.P.M
Vo. Bo.

[Signature]
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE:

\$ 279,516.70

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEISPESOS 70/100 M.N.)

COMO PAGO A LA ESTIMACIÓN NUM. ESTIMACION 2 CONTRATO No. 066/2019 POR LA CANTIDAD DE:

\$ 964,876.78

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
Rehabilitación de Canchas Parque Banderas;

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 447,796.09

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 205,289.30

SUBTOTAL \$ 242,506.79

IVA \$ 38,801.09

TOTAL \$ 281,307.88

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

C.M.I.C. DEL 0.20%	895.59
D.I.F. DEL 0.20%	895.59
SUMA	1,791.18

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$ 964,876.78
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 0.00
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 369,537.81
ESTA ESTIMACION	\$ 519,443.46
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$ 888,981.27
POR EJERCER	\$ 75,895.51

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 385,950.71
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 147,815.12
ESTA ESTIMACION	\$ 238,135.59
ACUMULADO ACTUAL	\$ 385,950.71
POR AMORTIZAR	\$ 0.00

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.20% C.M.I.C.	0.20% D.I.F.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 637.13	\$ 637.13
ESTA ESTIMACION	\$ 895.59	\$ 895.59
ACUMULADO ACTUAL	\$ 1,532.72	\$ 1,532.72

RECIBIMOS

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A DE C.V.
GD00101265T8

OBRA: Rehabilitación de Canchas Parque Banderas;


UBICACIÓN: CALLE AV. PUNTA ALAMILLO Y AV. PUNTA ANGOSTURAS #

ESTIMACIÓN No.: ESTIMACION 2

No. CONTRATO: 066/2019

PERIODO: DEL 15/08/2019 AL 13/09/2019

CONTRATISTA: GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A DE C.V.



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM TOTAL	ACUM. ANTERIOR		
OBRA NORMAL							
-	REHABILITACION DE CANCHAS PARQUE BANDERAS						\$ 447,796.09
	HABILITADO DE DRENE PLUVIALES DE SECCION 15X15 CMS. EN DALA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE @ 3.00 MTS. INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA , PERFILADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	20.0000	20.0000	0.0000	20.0000	\$ 278.45
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO Y ACRILICO VACIADO EN SITIO CALIBRE 10 MM, MODELO CONFOSPORT PM. O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SBR CAUCHO DE A 3 MM PROPORCION 1.5 KG/M2 MAS ATHLON 45, AGLUTINANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS PROPORCION 1.4 KG/M2, COMFORT COATING WS, SELLO COLOREADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS EN EMULSION ACUOSA PROPORCION 1.5 KG/M2, PITLINIA PINTURA ACRILICA CON ELEVADO PODER CUBRIENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LINEAS DE JUEGO EN SUPERFICIES ACRILICAS PROPORCION 5 KG INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	471.3000	456.3700	0.0000	456.3700	\$ 969.01
9							\$ 442,227.09
OBRA EXCEDENTE							
OBRA EXTRAORDINARIA							
							\$ 0.00
							\$ 0.00

GL DISEÑO Y CONSTRUCCION CO, S.A DE C.V.

CONTRATISTA

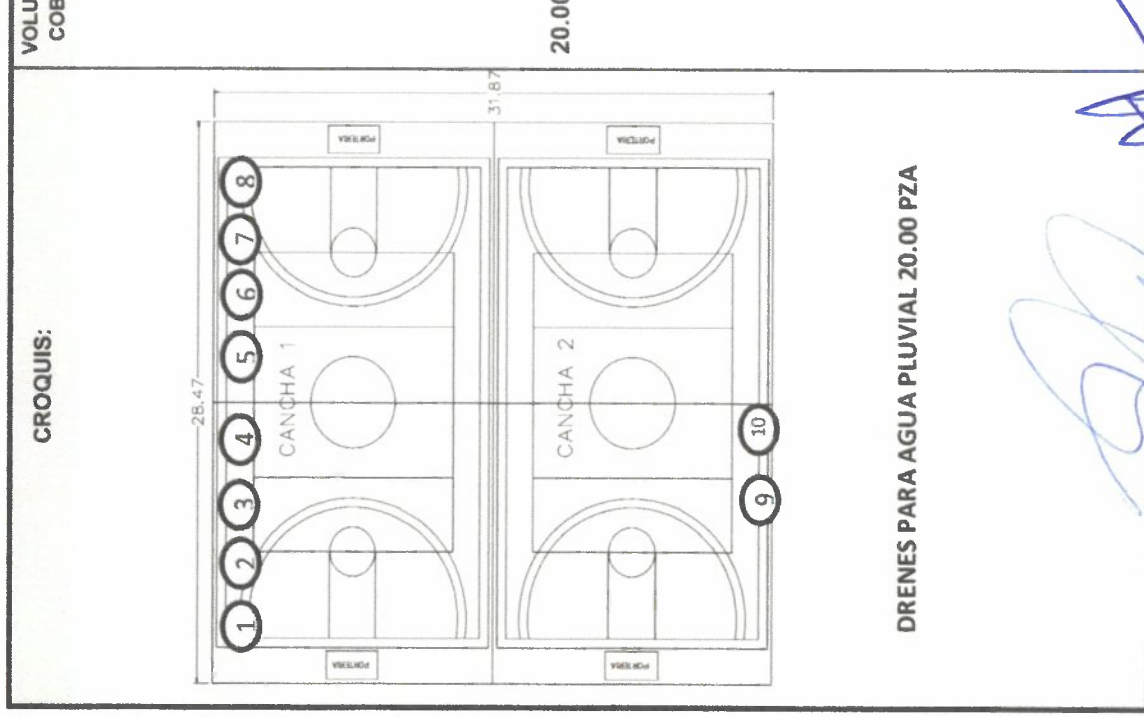
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

RESIDENTE D.O.P.M.

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO :	TRAMO:
OBRA :	CONTRATISTA:
REHABILITACIÓN DE CANCHAS PARQUE BANDERAS	GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO SA DE CV

No DE ESTIMACION: 1 PERIODO :		CROQUIS:	VOLUMEN COTIZADO

[illegible]

DRENES PARA AGUA PLUVIAL 20.00 PZA

RESIDENTE

CONTRATISTA

No DE ESTIMACION: 1	PERIODO :
CROQUIS:	
VOLUMEN A PAGAR:	

CROQUIS:

28.47

16.03

M2 DE PISO DE CAUCHO = LARGO X ANCHO

CONTRATISTA

RESIDENTE








Handwritten signature or mark in blue ink.





ATA NÚM. 8 23/agto./19

Se autoriza estimación #1 en el sistema electrónico
para imprimir e ingresar a trámite de pago.

Jc. 



ATA NÚM. 9 28/agto./19

Se recibe estimación N.º impresa. Se autoriza
su ingreso para trámite de pago.

Jc. 

ATA NÚM. 10 28/08/19

Se autoriza al contratista hacer dobles los
papeles 15x30 en lugar de 15x15. y ubicar los
únicamente donde está más alta la zona de
las canchas.

Jc. 

NOTA NUM. 11 02/Sept/19
Se inicia la colocación de Piso de Caucho
en la cancha indicada por la Dirección de
Desarrollo Humano, a través del Lic. Arturo Aranda
Jco.

NOTA NUM. 12 04/Sept/19
Se demuele concreto en la Perimetral para hacer
los drenes.

NOTA NUM. 13 13/Sept/19
Se concluye la instalación de Piso de Caucho
de 10 mm. de espesor, incluida la pintura.
