

Fecha:

00

Fecha: 16 de Abril del 2018.

Nota N. 001

Con esta fecha y Nota se da Apertura a la presente Bitácora de Obra, con el fin de Asentar todos los Asuntos Técnicos y Administrativos que se generen durante la Ejecución de la obra Denominada:

"Construcción de Puentes en Fraccionamiento Santa Clara" ubicada en la prolongación AV. los Nogales y Cuarto provincia de Albarcoche en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

No. Contrato = 034/18

Importe de la obra = 4,399,802.55 con IVA

Dependencia Ejecutora = Dirección de Obras Públicas Municipales
(Departamento de Construcción de Infraestructura urbana)

Contratista = TEPORACA S.A DE C.V

Período de Ejecución = 16/ABRIL/18 - 13/AGOSTO/18

Domicilio del Contratista = Colonia San Felipe, Carbol #3702

Continúa en Hoja →

Fecha:

No.

01

Continua Nota N. 001

Los Trabajos Consisten en: Obras preliminares, Terracerías, obras de drenaje, Estructuras, Pavimentos, Señalamiento y obras complementarias

- No de Oficio de Aprobación Presupuestal es "2018-PDH-33FM-OP-041"

- La Dirección de obras públicas y mantenimiento notifica que el Representante de obra Nombrado es el Ing. Ernesto Pérez Barón con No. Tel 614-198-26-56 Autorizándolo a Realizar Aprobaciones y Subscribir las mismas (será notificado también por vía de oficio.)

- La Empresa Contratista por su Representante de obra en calidad de Superintendente será el Ing. Luis Alberto Vega García y Autorizándolo a Realizar Aprobaciones y Subscribir las mismas en esta Bitácora con No de Tel. 614-239-81-92

~~Por la Dependencia~~

~~Por el Contratista.~~

Ing. ~~Ing. Lizette del Río Sigala~~
Jefe del Departamento de Construcción
D.O.P.T.S

Ing. Ernesto Pérez Barón
Representante de obra
D.O.P.S.

Ing. Luis Alberto Vega García
Superintendente de Construcción

TEDORACA

Fecha



No.

02

Nota N. 002

17/Abr./18



Con Esta Fecha Y Nota Se Establece que la presente Bitácora Permanecerá en el sitio de la obra para consulta y asentur Notas Diariamente en un Horario de 8:00 AM - 5:00 PM.



Nota N. 003

17/Abr./18



Con Esta Fecha Y Nota, se Establece que una vez Asentada la Nota, la Contraparte Estara obligada a Firmarla en un plazo No Mayor a 72 HRS, En caso contrario, Se Dara por Aceptada el contenido de la misma.



Nota N. 004

17/Abr./18

Con Esta Fecha Y Nota, se establece que una vez asentada y firmada la Nota, la misma no sera ni podrá ser modificada ni por el responsable que Retiro la Nota.



Fecha:



No.

03

Nota N.005

17/Abril/18



Con Esta Fecha y Nota. Se Establece la obligación de Ambas partes de Asentar en la Bitácora los Aspectos Relativos, a la Revisión y Autorización de Estimaciones y Numeros Generadores, Contributos de obra Adicionales o Conceptos no previstos en el contrato, Así como lo Relacionado a las Normas de Seguridad, Higiene y protección al medio ambiente, que deben implementarse.



Nota N.006

17/Abril/18



Con Esta Fecha se hace la entrega oficial al Contratista del Proyecto Geométrico, Estructural en forma electrónica, así como los puntos de control (coordenadas) y Elevaciones, con el fin de Realizar los Trazos y Levantamientos Requeridos.



Nota N.007

18/Abril/18

- Se inician los Trabajos de Topografía, Realizando el levantamiento de Terreno Natural de la zona
- Se notifica al contratista que se realizara cambios en la geometría y Dimensiones en las dos obras de drenaje (se entregara un breve) datos de la dicha modificación.



Fecha:




No.

04

Nota N.008

19/Abril/18



Se Tiene una Reunion con la JMAS para ubicar lineas Existentes que puedan ser afectadas en la zona, Pasando una linea de Agua Potable de 4 pulgadas en el eje Central del puente Accesos

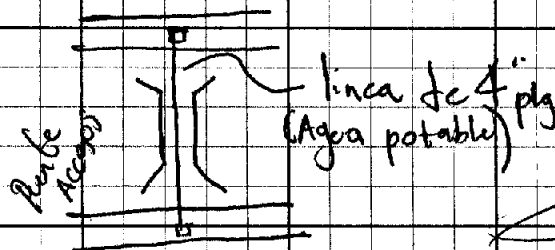

Nota N.009

20/Abril/18




- Llega Excavadora 312B
- Baño
- Bodega
- Revolutoras
- Camion de Volteo
- Se entrega al contratista datos de motivacion ala gerencia de las obras de drenaje.



Nota N.010

23/Abril/18

Se Inicia con la Excavacion para la Cimentacion del eje 1 y 2 del puente Accesos Y Se inicia con la Compactacion del eje 1 del Terreno Natural

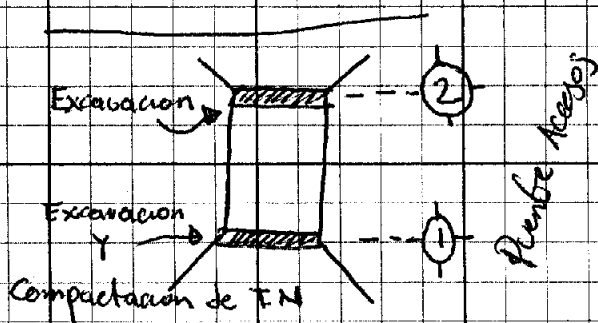

Fecha:



No.

05

Nota N.011

24/Abr/18



Se Continúa con la Excavación del eje 2 del puente Accesos. Se hizo Material tipo C, por lo cual la Excavadora 312B Se cambia de lugar para dar inicio a la Excavación del eje 1 y 2 del puente Albacete.



Nota N.012

25/Abr/18



Llega Retro Excavadora con Martillo para continuar con las Demoliciones del eje 2 del puente Accesos y seguir con la Excavación del eje 2. Y se da inicio a la colocación de mampostería en la zapata del eje 1 del puente Accesos.



Nota N.013

26/Abr/18


Se inicia con la compactación del Terreno natural de la cimentación del eje 1 y 2 del puente Albacete.



Nota N.014

27/Abr/18

- Se inicia con las Excavaciones en Aleros en el puente Accesos
- Se inicia con la de mampostería en la zapata del eje 2 del Puente Accesos



Nota N.015

28/Abr/18

Se inicia con las compactaciones del Terreno Natural de Aleros 1 y 2 del Puente Accesos

continúa Nota →


Fecha:

Nº

06

Nota N. 015

28/Abril/18

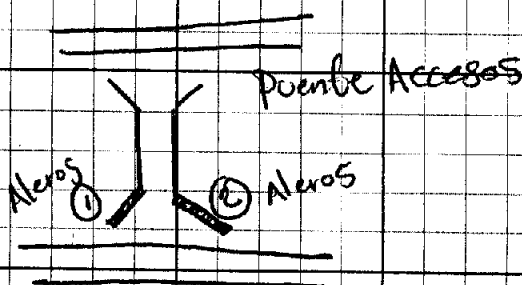

Nota N. 016

30/Abril/18

Se Continúa con la colocación de mampostería en Zapatas y Aleros del eje 1 y 2.

Nota N. 017


2/Mayo/18

Se inicia con la colocación de mampostería en Muro del eje 2 del Puente Accesos.

Nota N. 018

3/Mayo/18

Se Tiene una Reunión con la Jmas para propuesta de ubicación de línea de Agua potable de 4 pulgadas.

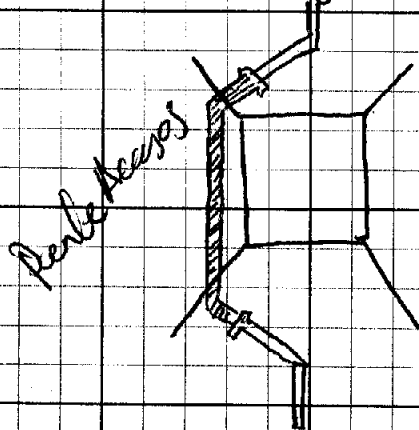

Fecha:



No.

07

Nota 019

7/mayo/18



Se Continúa con los Trabajos de colocación de mampostería en el muro del eje 1 y se unifican los trabajos de colocación de mampostería en Aleros del puente Accesos



Nota 020

9/mayo/18



Se Tiene una Reunion con la Desarrolladora MIKONOS con el Sr. Carlos Paralta, Ya que hay una Estructura metálica con una larga informatica de la desarrolladora MIKONOS que afecta en los Trabajos obreata en el puente Albacete. Para ver los Detalles de Reubicacion de la Estructura Metálica.



Nota 021

9/mayo/18

Se inician los Trabajos de Relleno para Estructuras y proteccion de obras de drenaje en el puente Accesos eje 1 y con el Afine y compactacion de Campeato en el puente Accesos.



Nota 022

11/mayo/18

Por medio de la Presente Nota se notifica al contratista que se debe reubicar la Reubicacion de la Tuberia de 4" de agua potable propiedad de JMÁS la cual Estorba para la contraccion del Puente Accesos. Se Anexa Croquis de la relocalizacion por medio sera por una garza de Tuberia de Acero al carbon de 4" con la proteccion anti corrosiva solicitada por la JMÁS

continúa Nota →

Fecha:

Nº.


08


Nota 022

11/mayo/18

Y Todo lo necesario para dicha publicación, por lo que se deba de presentar los precios Extras necesario.

- Se le notifica al contratista que la desarrolladora MIKONOS se hace responsable para reubicar la Estructura Metálica ubicada en el puente Albacetez ala brecha.







Nota 023

14/mayo/18

- Por medio del presente nota se le notifica al contratista que se debe realizar la reubicación del orbófono de alumbrado público existente ubicado en el puente Albacetez y Puente Accesos. Se anexa croquis de la reubicación por lo que se deba presentar los precios extras necesarios.
- Por medio del presente nota se le notifica al contratista que se debe realizar los trabajos de Sumerido y colocación de concreto utilizado en cimentación y formación de parapeto por lo cual se deba presentar los precios extras necesarios. Se anexa croquis.







Nota 024

15/mayo/18

Se Continúan los Trabajos de Colocación de piedra mampostería en aleros y Muro del puente Accesos. Terminando al día de hoy los Zapatas, Muros y Muro del puente Accesos







Nota 025

16/mayo/18

Se inician los Trabajos de colocación de mampostería en Zapatas del puente Albacetez y los Trabajos de Excavación en debellan en el puente Accesos




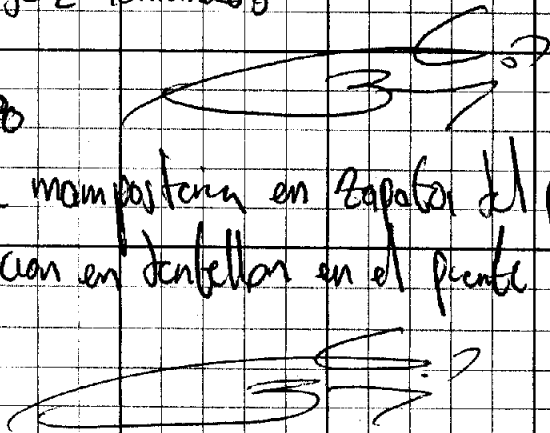


Fecha

09

Nota 026. 18/mayo/18

- La Desarmelladora MIKONOS inicia los Trabajos desmantelamiento Tramos y Excavaciones para realizar el movimiento y Rehabilitación de la Estructura metálica ubicada en el puente Albaceros.
- Por medio del presente se le notifica al contratista que debe realizar los trabajos de suministro y colocación de Junta de expansión en losa de puente de Solera de 4" pulgadas, por lo cual se deberá presentar los precios extras necesarios, se anexa croquis.



Nota 027. 22/mayo/18

- Se inician los trabajos de suministro y colocación de Concreto hidráulico en Zampuesto y Dintelón del puente Accesos
- Se inician los trabajos de colocación de mampostería en Apatas del puente Albaceros

