

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN EN DERECHO DE VÍA DE PEMEX No CONTRATO 041/2018
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2018-PDM-PEPD-OP-036
CARACTERÍSTICAS: CORTE DE TERRENO NATURAL, COMPACTACIÓN DE TERRENO, COLOCACIÓN DE CAPA DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DE 2.0 CM DE ESPESOR

MONTO DE CONTRATO: \$983,126.38 CON IVA MONTO MODIFICADO N/A

CONTRATISTA: BOWERA, S.A. DE C.V.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 23 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 12 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: N/A
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO: N/A

AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN


ACUMULADO GENERAL IVA INCLUIDO

PROGRAMADO: \$ 419,598.34
REAL: \$ 338,074.40

POR PARTIDA

	PROGR.	REAL
1 TERRACERÍAS	100.00%	100.00%
2 RED HIDRÁULICA Y SANITARIA	100.00%	100.00%
3 ENCOFRADO DE DUCTO	100.00%	100.00%
4 PAVIMENTACIÓN	100.00%	100.00%
5 REQUISITOS CENAGAS	100.00%	100.00%
6 EXTRAORDINARIOS	100.00%	100.00%

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

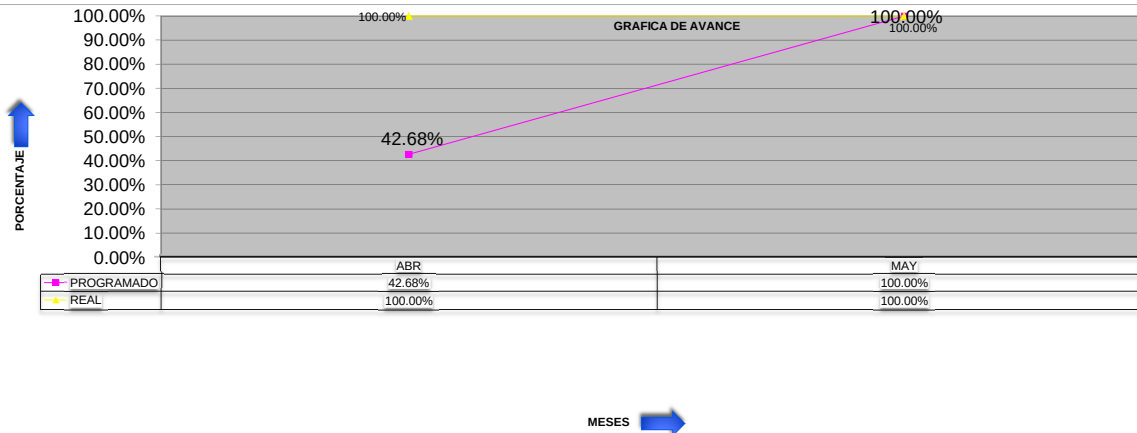

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

TERRACERÍAS

SE REALIZÓ CORTE Y TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN LA CALLE INDUSTRIAL 1 FUERA DEL DERECHO DE VÍA EN COORDINACIÓN CON CENAGAS

RED HIDRÁULICA Y SANITARIA

SE PROLONGA TUBERÍA EXISTENTE DE 3" DE DIAM. DE AGUA POTABLE A LO LARGO DE LA CALLE INDUSTRIAL 1 HASTA DONDE SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN

ENCOFRADO DE DUCTO

SE REALIZARON SONDEOS PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA Y PROFUNDIDAD DE LÍNEA DE 8" DE GAS NATURAL

PAVIMENTACIÓN

SE COLOCA BASE HIDRÁULICA EN CALLE INDUSTRIAL 1

SE CONFINA BASEHIDRÁULICA CON DENTELLONES Y GUARNICIÓN, SE COLOCA BANQUETA EN CALLE INDUSTRIAL 1

REQUISITOS CENAGAS

AL NO HABER PERMISO PARA TRABAJAR EN EL DERECHO DE VÍA NO SE PUEDE ESTABLECER UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA CONTRATAR LA POLIZA POR DAÑOS A A INFRAESTRUCTURA DE CENAGAS

EXTRAORDINARIOS

COMENTARIOS

ESTIMACIÓN 1 EN FIRMAS PARA PAGO

SE SOLICITA APOYO A JMAS PARA RENIVELAR LOS POZOS DE VISITA A NIVEL DE RASANTE

POZO DE VISITA DESBORDADO AFECTÓ PARCIALMENTE BASE HIDRÁULICA COLOCADA Y TERRACERÍAS CON GIARNICIONES, POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A COLOCAR MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO EN ESTAS ZONAS EN LUGAR DE PAVIMENTO.

NO SE HAN LIBERADO LOS TRABAJOS DENTRO DEL DERECHO DE VIA POR CAUSA DE LA TUBERÍA DE GAS NATURAL EXISTENTE, PERMISO DE CENAGAS EN PROCESO, **POR TAL MOTIVO SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS.**



CALLE INDUSTRIAL 1, BASE HIDRÁULICA



CALLE INDUSTRIAL 1, COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN



CALLE INDUSTRIAL 1, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y DENTELLONES



VISTA DE CALLE INDUSTRIAL 1, COLOCACIÓN DE MICROCARPETA
