

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN COLONIAS AREOPUERTO 1 Y II		No CONTRATO 068/2018
	OFICIO DE AUTORIZACION No.		
CARACTERISTICAS:	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAM Y RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAM, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS.		
MONTO DE CONTRATO:	\$3,623,237.31	CON IVA	
CONVENIO		CON IVA	
CONTRATISTA:	TEPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO		27 DE JUNIO DE 2018	
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:		09 DE SEPTIEMBRE DE 2018	


AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:		\$	-	0.00%				
REAL:		\$	-	0.00%	PROGR.	REAL	POR PARTIDA	PROGR. REAL
1	POR PARTIDA						9	
2							10	
3							11	
4							12	
5							13	
6							14	
7							15	
8								

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

13%

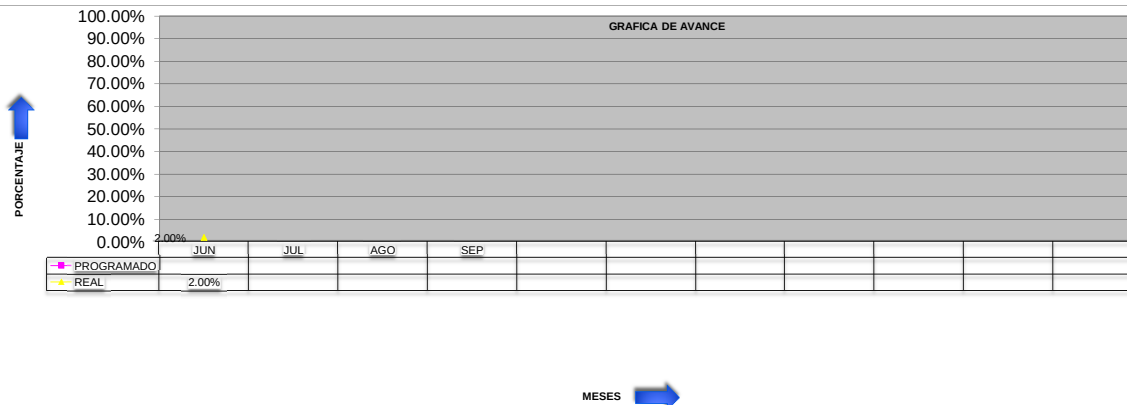

OBSERVACIONES: SE LABORA EN LA EXCAVACION DE ZANJA PARA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAM , COLOCACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA

