

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ

RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

ING. JESUS MANUEL CHAVEZ MEDINA

RESIDENTE CONTRATISTA

CONTRATISTAS

CONSTRUCTORA TEMPORACA

TEMPORACA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

LIBRO NO. 1

Remodelación de calle Juárez.

Tramo 1: Blvd. Díaz Ordaz a C. Ocampo.

Tramo 2: C. 13. a C. 21 Ambos lados.

Nota No 15 de febrero de 2016

Con esta fecha y nota se habre bitacora de la obra: REGENERACION DE IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO, calle Aldama, Tramo del BLV. DIAZ Ordaz a calle Vicente Guerrero: Ave. Juarez: Tramo de: Blvd. Diaz Ordaz A C. 21A y AVE NIDOS HEROES, TRAMO: CALLE 14 A A AVE Ocampo, colonia Centro.

Esta Bitacora ampara Los trabajos ejecutados en la calle Juarez en el Tramo comprendido del Blvd. Diaz Ordaz a la Calle 21A. de la Colonia Centro.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NO. DE CONTRATO: 001/2016

NO. DE OFICIO DE APROBACION PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-005

ANTICIPO: 30%

CONTRATISTA EJECUTORA: TEMPORACA CONSTRUCTORA SA DE C.V.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$45,883,130.80 MIN INCLUYENDO EL IVA.

IMPORTE TOTAL DE LA CALLE JUAREZ:

\$ 16,880,884.62 MIN S/IVA.

FECHA INICIO CONTRATO: 15 FEBRERO DE 2016

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL:

TRABAJOS POR EJECUTAR: (PARTIDAS)

Punto 2.1 Demoliciones

Punto 2.2 Elementos sobre la Via Publica.

Punto 2.3 Terracerias

Punto 2.4 Firmes y Rampas

Punto 2.5 Prefabricados

Continúa Nota 1.

Continúa Nota 1 15 FEBRERO 2016

- Punto 2.6: Guarniciones y Juntas
 Punto 2.7: Mobiliario Urbano
 Punto 2.8: Señalamiento Vial
 Punto 2.9: Alumbrado Público
 Punto 2.10: Sistema de Riego
 Punto 2.11: Media Tensión
 Punto 2.12: Red de baja Tensión
 Punto 2.13: Canalización Fibra Optica
 Punto 2.14: Canalizaciones Telmex y cable
 Punto 2.15: Tardineria
 Punto 2.16: Tomas Domiciliares

NOTA No.2 15 FEBRERO 2016

Se asienta en esta Nota las Firmas
 Autorizadas para la Presentación:

ING. ELORIA MARTINEZ R.
 RESIDENTE OBRA,
 DPTO. CONSTRUCCION
 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ING. JESUS MANUEL GARCIA M.
 RESIDENTE DE OBRA

NOTA No.3 15 FEBRERO 2016

Se Especifica por medio de esta Nota
 que el tiempo máximo para Firmar notas
 será de 72 hrs para ambas partes, la
 Nota que no sea firmada dentro de este
 tiempo especificado quedará por aceptada.

Nota No.4 15 FEBRERO 2016

En este día se dieron inicio a los
 Trabajos correspondientes al retiro y demon-
 taje de los elementos sobre la Vía Pública
 del Tramo comprendido del Blvd. Díaz Ordaz
 a la calle Campo sobre la Ave. Juárez.

Continúa Nota No. 4 15 Febrero 2016

Este día se dermostó un poste de Alumbrado público con su respectiva lámpara sobre la Ave. Juárez En el Tramo comprendido del Blvd. Díaz Ordaz a la calle 12ava.

- Se retiraron También en este Tramo 6 árboles ubicados en banqueta.

Nota No. 5 15 Febrero 2016 Martes

Previo al arranque de la obra se hizo recorrido con Personal de la Comisión Federal de Electricidad, Telefonos de México y Junta de Aguas en la Ave. Juárez En el Tramo del Blvd. Díaz Ordaz a la calle 21^a. Marcando cada uno de los involucrados la ubicación de los registros existentes, Trayectorias y profundidades de las tuberías por ambas aceras. Reconido que se hizo conjuntamente con Residente de la Contratista, Residente por parte de obras públicas del municipio, estando enterado el contratista al inicio de los trabajos de dichas instalaciones de las Dependencias involucradas.

- El día de hoy se le hizo entrega al Residente del contratista la Información proporcionada por el Ing. Puerta de Junta de Aguas la cual indica la ubicación de las líneas de agua existentes en calle de 3" de diámetro y tuberías localizadas en áreas de banquetas por demoler. Para que se tenga cuidado de no ir a dañar al momento de iniciar con las demoliciones.

Nota No 6 16 FEBRERO 2016

Se continúa el día de hoy con el desmontaje de Postes de alumbrado público y lámparas retirándose este día 3 Pzas sobre la Ave. Juárez En el Tramo comprendido entre Boulevard Díaz Ordaz a Calle 12ava.

Se retiraron 2 parquímetros Localizados entre las calles Decima y Ave. Ocampo. Los cuales fueron entregados a Personal de Parquímetros del Ictissal.

Se Dio inicio el día de hoy con la demolición de la banqueta existente sobre la Avenida Juárez Tramo comprendido entre Blvd. Díaz Ordaz a calle Doce.

BLVD
DIÁZ
ORDAZ.

CIUDAD
JUDICIAL.

Inicio de demolición banqueta.

500m
calle 12ava

Se le hizo la indicación al Contratista que antes de dar inicio con las demoliciones se verifique en los Pozos o Registros existentes para verificar profundidades y trayectorias, para no irlos a dañar.

M

Quintana

Nota No. 7 18 Febrero 2016 Jueves.

Se hace entrega del Proyecto Eléctrico IMPe y Digital (Planos E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07) indicando que solo se colocará una lámpara Modelo 1260HA 60 LEDs IRIDIUM de Alta Potencia de 127W se entrega Ficha Técnica de la misma.

- Se Entrego trazo para desplante de Guarnición del Tramo Blvd. Díaz Ordaz a la Calle Ocampo

M

Quintana

Nota. No. 8 18 FEBRERO 2016

Se hace entrega de planta con ubicación de Fibras ópticas existentes en Ave. Juárez entre Blvd. Díaz Ordaz y C. 14 indicándole al Residente físicamente las trayectorias y las profundidades tanto en acera derecha como izquierda.

- Se le hizo Entrega del Texto para Tabulación de Señalamiento para ofrecer disculpas a la ciudadanía.

- se hace entrega de plantas con ubicaciones de líneas de Telmex comprendidas entre los siguientes tramos.

1.- Independencia a Ocampo.

2.- de Calle 13AVA. A Calle 19AVA

3.- de Ave. Independencia a Ave. Vicente Guerrero.

Nota. No. 9 18 Febrero 2016 Se le solicita al contratista de inicio con los sondeos en las tomas hidráulicas y descargas domiciliarias para verificar profundidades, tipo de material para definir si se hacen nuevas.

Nota. No. 10 19 Febrero 2016 Viernes


Se le hizo entrega al contratista de la Topografía de la Ave. Juárez. Tramo Blvd. Díaz Ordaz a la calle 21 (Secciones) donde se indican la ubicación de los Bancos de Nivel con su elevación y físicamente se entregaron El Banco Nivel 1, 2, 3, 4, 5 En este mismo Tramo.

Nota. No. 11 19 Febrero 2016

Se aclara en esta Nota, que el contratista solo esta Trabajando de 4:00 PM a 12 P.M., Con las demoliciones, En el Horario Normal No trae Fuerza de Trabajo solo trae al Topografo, Por lo que se le solicita que a la mayor brevedad posible se regularice esta situación.

Nota. No. 12 19 Febrero Viernes se continua con las demoliciones en banquetas y Guarnicion En Tramo III de la calle Juarez ENTRE CALLE 14, y calle 12. +0.15

Sección Guarnición demolida tercer tramo.



Nota. No. 13 21 Febrero 2016 Lunes

Se hace Entrega de Plantas de Trazo de la c. Ave. Juarez Tramo: Blvd. Díaz Ordaz a Ave. Ocampo EN Digital e impresos.

Se inician demoliciones entre C. 10 a C. 12 de banquetas y Guarniciones existentes.

Nota No. 14 22 Febrero de 2016

Se hacen Demoliciones de Banquetas Existentes de la C. 12 a la C. 10 con un espesor variable, tambien se demuestran Guarniciones existentes en este Tramo. (esp. Banqueta 0.10, 0.10.14 cms. 0.05

0.20 y Bar variable 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.4.


Nota. No. 15 23 DE FEBRERO 2016 MARTES

Se continúan con las demoliciones de banquetas existentes así como Guarniciones de calle 12ava. a calle decima. espesor de Banqueta 0.10cms min. Sección de Guarnición Variable.


- Se demolió base de concreto existente de alumbrado público Entre calles: 12Ava. a c. 10Ava.

Nota. No. 16 24 Febrero de 2016

El día de hoy se terminó con la demolición de las banquetas y Guarniciones de calle 12Ava. a c. 10Ava. con Secciones Variables de banquetas y Guarnición (10cms, 12cms, 1 Sección Guarnición



Se le indica al contratista que la Guarnición Pecho Paloma que se colará del Tramo del Blvd. Díaz Ordaz a la Calle Decima será con la siguiente sección:

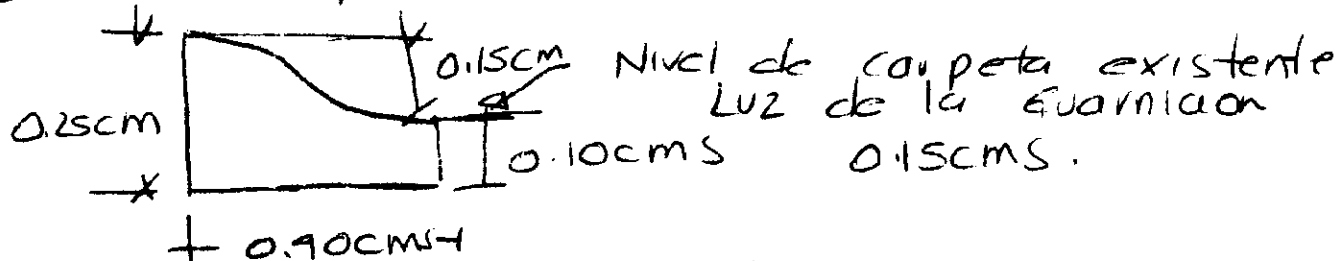

La sección es diferente a la presupuestada en la E7 - de concurso por lo que deberá presentar el precio extraordinario de concurso.

* Se indica También que en las entradas que queden abajo de los 0.15 cms. se le deberá dejar la Banqueta o Adoquín en su caso al nivel existente, considerando rampas de 2.00m de largo a ambos lados de las puertas o rejas.

En los casos de los registros de Comisión Federal y Telmex estos serán puntos obligados para los niveles del Adoquín o banquetas nuevas.

NOTA No. 17 24 DE FEBRERO 2016 Miércoles

En cuanto al Alumbrado Público en el Proyecto entregado vienen indicados unos spots. En piso en la parte de Enfrente de los árboles, se indica que estos no se colocarán, se le solicitará al Ing. que hizo el Proyecto la modificación correspondiente.

* Se continúa con el Trazo para colado de guarniciones, se trazan las cabezas de manzana del Blvd. Díaz Ordaz a c. 14 y de calle catorce a calle 12.

* Se demuele carpeta Asfáltica existente para el colado de guarniciones de c. catorce a calle 12. El bloque de carpeta asfáltica en este Tramo Trac 15cms. de espesor y a la hora de la demolición se viene el bloque completo, los anchos son variables y van desde 0.50 cms hasta 0.98cms. de ancho.

Nota. No. 18 25 Febrero de 2016 Jueves

Se continúan con los Trazos para corte de carpeta asfáltica de la calle Doce a la calle Decima.

Se hacen cortes de carpeta asfáltica de la calle 14 a la c. Doce y de la calle Doce a la calle Decima.

Se Demuele carpeta asfáltica de la calle Doce a la calle Decima con anchos variables que van desde 0.50cm a 0.80cms con un espesor de 0.15 cms. y a la hora de Efectuar la demolición se viene el bloque completo.

Nota No. 19 26 Febrero 2016 Viernes

Se cimbra para colado de Guarniciones de la calle catorce a la Calle Doce.

Se continúan con las demoliciones de Carpe ta asfáltica existient Para colado de Guarniciones de la Calle Doce a la Calle Decima.

Se le indica al contratista que para sacar el agua de las áreas de estacionamiento donde tienen el bombreo hacia los pavimentos se colocaran Tubos de 3" de diametro de PVC con salida hacia la Penpendicular longitudinal, este T.

Nota No. 20 27 Febrero 2016 Sabado
Se Tivaron 2m³ de concreto f/c = 200x5/cu
Para colado de Guarnición del Tramo de la calle 12 a la calle 10, C. 14 a C. 10

Nota No. 21 29 de Febrero 2016 Lunes

Se Tivaron 4m³ m³ de concreto f/c = 200x5/cu
Para colado de guarniciones de la calle decima a la calle 12 Doce

+ se continua con las demoliciones de Carpe ta asfáltica para colado de Guarniciones en Cabezas de Manzana de Blvd. Díaz Ordaz a Calle 14 y de Calle catorce a Calle Doce.

* se Traza o se Ubican donde se colocaran las Lamparas del Alumbrado Publico de la Blvd. Díaz Ordaz a la Ave. Ocampo.

Nota No. 22 1º Mayo 2016 Martes

Se hace Entrega planta de Acabados y Planos de detalles de la Ave. Juárez de la Blvd. Diaz Ordaz a La Ave. Orampo.

Se le proporciona al Residente planos en impresión y Archivo Digital.

* se hace entrega de las ordenes de campo de los siguientes Precios extraordinarios del Alumbrado Publico y canalizaciones de Telmex y catalogo de conceptos para que presente los Precios unitarios correspondientes.

EXT-2 suministro y PVC de 16 mm

EXT-3 suministro e Instalacion cable xlp monopro-Lav de Aluminio cal. 6


EXT-4 suministro e instalación de cable THW - LS cal -10

EXT-5 suministro e instalación de cable THW - LS cal 12

EXT-6 suministro e instalación de Luminarias TIPO IR-60HA LEDS IRIDIUM DE ALTA POTENCIA DE 127 WATS. DE ACUERDO A FICHA TECNICA ANEXA.

EXT-7 suministro e instalacion de Tablero de control de alumbrado de 3 circuitos.

EXT-8 suministro y colocacion de Tubería Para Telmex marca PVC cedula 200 de 51 mm.




Nota No. 26 4 Marzo 2016 Viernes

Se le Notifica al contratista que para el riego de los arboles localizados en Cabezas de manzana del Tramo: Blvd. Diaz Ordaz a campo. Se colocara un Tubo de PVC Hidraulico RD-26 de 1" de diametro y los Tubos que van del de 1" al arbol sera Tubo Hidraulico PVC RD-26 de 1/2" de diametro y se alimentaran de una Toma existente.




Nota. No. 27 4/03/2016

El día de hoy se le hace entrega de plantas de la calle con la ubicación de las siguientes instalaciones: Tramo Diaz Ordaz a C.21


- 1.- Ubicación Fibra optica
- 2.- Ubicación de instalaciones de Telmex
- 3.- Instalaciones de Comisión Federal.

Se le hizo entrega También el Proyecto modificado de Alumbrado publico el cual ya no tiene los spot. en los arboles.

Se entregan Precios extras. con ordenes de campo para su cotización del presupuesto de Alumbrado Modificado y canalizaciones de Instalaciones de Telmex.

Se le indicó que el Tubo a colocar para las instalaciones de Telmex sera Tubo PVC de 2" Marca Duralón o similar seria 20

Se le hizo la indicación al Residente que el area de Trabajo deberr estar delimitada por cintilla amarilla en todo el Tramo.





Nota NO. 28 7 marzo 2016

Se Continúan con demoliciones de carpetas con
colado de Guarniciones en banquetas existentes
del Blvd. Diaz Ordaz y C. 14 lado Norte en
la parte de arriba de la Banqueta existía Carpeta
Asfáltica con espesor de 5-8cms y Banqueta abajo
de carpeta con espesores de 5-7cms.

* se colaron Guarniciones a banquetas lado Norte
Blvd. Diaz Ordaz C. 14

* se retiró un poste de concreto ubicado en C.
14 Banqueta sur.



* se coloca caliche en Banqueta Norte Blvd.
Diaz Ordaz a C. 14, Banqueta sur Blvd. Diaz Ordaz a
C. 12

* se continúa con la instalación de pódulo
eléctrico de Blvd. Diaz Ordaz a C. Decima.

Se le indica al contratista que las lámparas
de alumbrado público que vienen indicadas
en proyecto en la Banqueta de la Ciudad
Judicial no se colocarán, se le indicó al
Ingeniero manifiesto que modificará el proyecto.

CM

Manifiesto

Nota. No. 29 8 marzo 2016

Se realizó el día de hoy una reunión con
personal de Telefonos de Mexico para definir
las instalaciones a dejar en Banqueta (subterrá-
neas) del Blvd. Diaz Ordaz a Ave. Ocampo este
día se nos entregó la planta con la ubicación
de los registros, y las radiuras a colocar, se obtiene
lo siguiente:

h


Manifiesto

continúa Nota. 29 →

Nota No. 29 8 Marzo 2016

- 1.- Se colocaran 3 Tubos PVC serie 20 de 2"
- 2.- se colocaran Registros yasea contruidos en obra o prefabricados TIPO L-3
- 3.- las subidas a muro a muro indicadas en planta seran con 2 tubos de PVC de 2" colocados en los limites de los predios, las radiales se dejaran Tubos con poliducto de 1" de diametro, se dejaran sololas puntas.
- * Tambien indicio personal de Telmex que no se dejara un cruce de banqueta sur a banqueta Norte.


Debido a que el poliducto para cable se tarda en llegar, se colocara tubo PVC 2" * se le indica al contratista colocar un tubo de PVC para cable en tramo del Blvd. Diaz Ordaz a C. Decima esta por definir la localizacion de los Registros. tanto para, las instalaciones subterranas que se dejaran para Telmex y cable se dejara un Registro en Banqueta Diaz Ordaz del lado del borchilleres y llevar la tuberia hasta aqui, para estas instalaciones se tendra que atravesar el Blvd. Diaz Ordaz por excavacion de manera direccional.




Nota. 30 9 marzo 2016

se entrega Presupuesto del sistema de Riego para cotizacion asi como el Plano de este aun hay modificaciones:

- 1.- aun no se define de donde se va a suministrar el agua.





→ continua No 30

- 2.- el tramo donde se va a colocar tuberías para el riego será solo del Blvd. Díaz Ordaz a Calle 21
- 3.- la tubería de 1" general de PVC RD-26
- 4.- la tubería marcada en planos como 3/4" que esta alimentación al arbol será con tubo PVC RD-26 de 1/2"
- 5.- al arbol se le colocará un burbujeador
- 6.- la Cisterna se construirá de concreto el lugar aún no está definido.

Notificar con Personar se da de alta a Sistemas de Riego el cual deberá revisar el Proyecto para que presente las observaciones y/o adecuaciones necesarias y que en el Transcurso de la ejecución del mismo decida definir y cambiar proyecto sin que se tenga que depender para el avance de Parques y Jardines.

- 7.- se colocará una válvula de control en cada cuadrante.
- 8.- se entregará material con conceptos complementarios al catálogo con los conceptos que estén faltando para que el sistema de Riego quede funcionando al 100%
- 9.- al Final de la obra se deberá entregar el Proyecto Final ya como queda.


Nota. NO. 31 9 de marzo 2016

Se cuenta en esta Nota que el viernes 4 de marzo se recibió la primera parte del anticipo.




Nota. No. 32 9 Marzo 2016.

Se le indica al contratista que las banquetas no se podrían colar hasta que se reciba la compactación del Vellano el cual deberá ser al 90% de su P.V.M. el granizo a utilizar en banquetas con acabado lavado sea de 3/8".

Nota. No. 33 9/marzo 2016

Se coló plantilla para colocación de Adosquin de banquetas norte tramo Blvd. Díaz Ordaz C. 14





Nota. No. 34 11/marzo/2016

Se recibieron 3.5 m³ de concreto F/c = 700 kg/m³ con Fibra (900 kg/m³) para colado de banquetas Norte Blvd. Díaz Ordaz a C. 4.

* Se colocan 3 tubos Pvc. 2" para telmex y 1 tubo de 2" para cable Tramo de la calle 14 a la calle 12

* Se hacen reubicaciones de Tomas de agua existentes con tubería de 1/2 pulg. Tuboplas. Tramo C. 14 a la calle 12





Nota No. 35 14/03/2016

Se le hace la indicación al Residente que se deberán dar radiales con Tubera para cable de 1" de diámetro del registro a cada una de las viviendas o locales.

Se colocarán 3 registros para cable con medidas aproximadas de $0.89m \times 0.49m \times 0.60m$ se le indica físicamente donde colocarlos.

* Se indica que las banquetas de roche, rds y de entradas a estacionamientos serán solo de Granito acabado Lavado sin el colorante, debido a que no funciona de esta manera.

* Se le indica También el colado de Guarnición Trapezoidal con la siguiente sección:

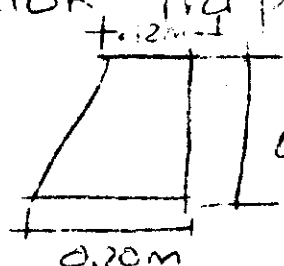

dejando una luz de 20cms.

0.35 y el colado de banqueta a Vuelta de Plana en la calle 14 Lado sur.

* Con la vibración de la compactadora y martillo utilizado en las demoliciones se cayó la Tachalota de la Finca de Ave. Suarez No. 1400.

* Se solicita Presentar el Precio Unitario correspondiente a la Guarnición Trapezoidal de sección $0.12m \times 0.20m \times 0.35m$ de altura colada con concreto fijo $200kg/m^3$ así como de Banqueta de 10 cms de espesor acabado a Vuelta de Plana.

de Precio Unitario de suministro y colocación de Tachalota en muro para reposición en vivienda Ave. Suarez No. 1400.

[Firma]

[Firma]

Nota No. 36 14/03/2016

se coló plantilla para colocación de adoquín de banqueta sur Tramo Blvd Díaz Ordaz a C. 14

* Se demuele carpeta asfáltica ubicada en cabeza de manzana para poder dar el nivel a la colocación del adoquín.

[Firma]

[Firma]

Nota. No. 37 14/03/2016

Se recibe compactación de T.N para
calzada de plantilla, Banqueta San. Tramo
Bld. Díaz Ordaz a la calle 14

Se indica al contratista que la compactación
del terreno natural deberá ser al 95% de
su P.M. como se indica en el catálogo de
conceptos de concurso.

Nota. No. 38 15/03/2016 MARTES
Se le solicita al Residente la construcción
de Registros Sanitarios de acuerdo a lo
Indicado en el concepto 2.16.3 donde solo
están las puntas del tubo Sanitario.

Nota. No. 39 15/03/2016
Se le dio la indicación al Residente de
colocar la plantilla Pavejo hasta TOPAR con
los pavimentos esto debido para facilitar
el Procedimiento constructivo ya que Trae-
mos diferentes espesores.


x así mismo se le indicó que las Tuberas
que se andan instalando para Telmex y
Cable no deberán estar arriba del
Poliduto del Alumbrado público.

Nota. No. 40 15/03/2016
Se le indica que las banquetas con acabado
granzon lavado deberán estar totalmente
limpias después del acabado sin rastros
o manchas blancas residuo de la lechada del
Cemento para ser considerados para pago.

Nota. No. 41 15/marzo/2016

Se le indica que antes de comprar las lamparas se debiera verificar con el Projectista las lamparas definitivas debido a los cambios que se han estado presentando en el Proyecto.


Se solicita Presentar Precio Unitario de suministro y colocacion de Poluretano en Banqueta con acabado Granzon Lustrado.




Nota. No. 42 16/marzo/2016

Se solicita Presentar el Precio Unitario correspondiente a perforación direccional para Cruces en avenidas Principales.

Y Tambien Presentar Precio Unitario extra ordinario de volado de banqueta a vuelta de plana con concreto F'c = 500 kg/cm².






Nota No 43 17/marzo/2016


Se coloca Tuberia de 1" de diametro para radiales de instalacion de Telmex a un metro de los Negocios de acuerdo al Proyecto recibido por Telmex, así como poliducto para instalaciones de cable a cada Negocio del Tamo ambos de la C. 12 a C. 14.

Se coló plantilla para colocacion adicional de C. 14 a C. 12

Se constroyen los stros sanitarios con adobon entre calle 12 y calle 14
Se trabaja con una de 30 cms de ancho y 60 cms de alto para instalaciones de Telmex y cable de cable 12
anillo de goma.


Nota. No. 44 18 marzo 2016
Se le indicó al Residente q' las anclas para las bases de alumbrado sean de 1.00m de desarrollo y los anillos se colocarán a cada 20cms.

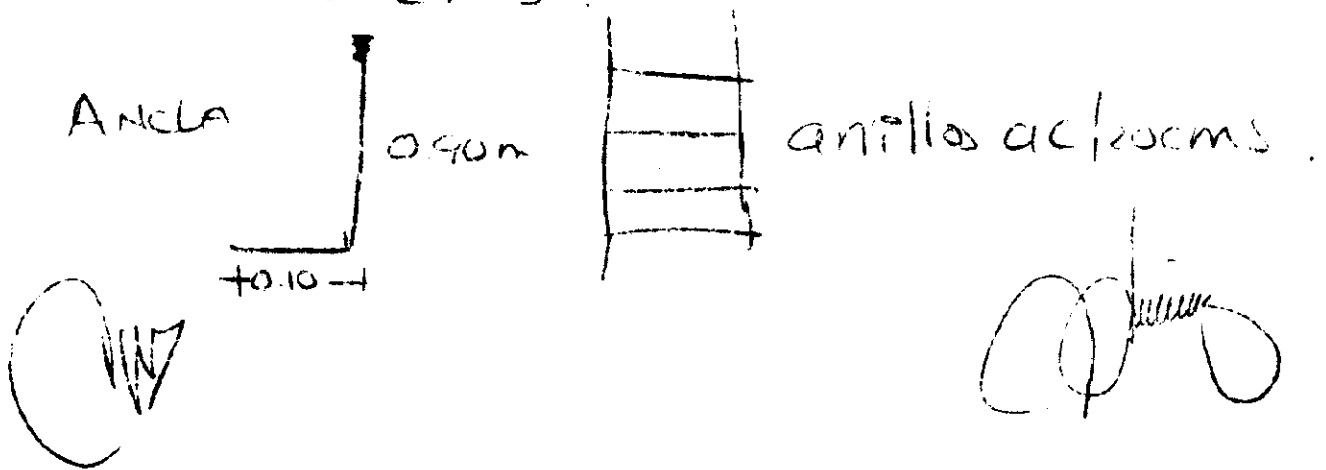

Nota. 45 21 marzo 2016 Lunes
No se Trabajo x ser día inhábil.



Nota. No. 46 22 marzo 2016 Martes
Se colocan 5 bases para postes de alumbrado público, se colocan plantillas para colocación de adoquín del Tramo de C 14 a C. 12 y de C. 12 a C. 10, colado guarnición Trapecoidal C. 14.




Nota. 47. 23 marzo 2016
Hasta el día de hoy se Trabaja de lunes a que por Semana Santa No se laborarán los días 24, 25 y 26 del presente mes.



Nota No 48 15 Abril 2016 Viernes

Se le solicita al contratista ordenar los trabajos correspondientes a alumbrado público ya que a la fecha no se han colado las bases entre C. 12 a calle 10 y a continuación algunas por colar de calle 14 a calle 12.

* Se recibieron compactaciones de Terreno natural de banqueta Norte sobre el B.N. Díaz Ordaz, Tramo de Banqueta Norte de calle 12 a calle 10, y compactación de relleno suliche de cabeza de manzana de C. 14 dando 95%.



* Debido a las condiciones del material existente en el lugar no se está alcanzando la compactación del 95% indicada en el contrato por lo que se le indica al contratista que se recibirá al 90% de su D.S. ya que para colado de banquetas y colocación de adoquines se requiere mayor grado de compactación, así mismo se entrega Orden de Campo para que fijen precio extraordinario de la compactación del Terreno Natural al 90% de su D.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota No 49 17 Abril 2016 Viernes

Se solicita presentar a la mayor brevedad posible la estimación del costo de...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota No. 49 12/Abril/2016 Sabado
 Se continúan el día de hoy con el trabajo de Banqueta grabada a lo largo de la zona de la manzana 14 (rochetas de Blvd. Díaz Ordaz a la calle 14 a la calle 12) y Cachera Feneceja.

El día de hoy se recibirá aduquin color gris claro 3500 piezas.

Nota No. 50 4/Abril/2016 Lunes.
 Se colocan Registros TIPO L-3 Para instalaciones de Telmex 3 Piezas en Tramo de C. 14 a C. 12.

Se continúan con los trabajos de Plantilla por colocación de Aduquin Tramos de C. 12 a Calle 10 y de Calle 14 a Calle 12.

Nota No. 51 5/Abril/2016 Martes
 Se entrega planta de señalamiento de Ave. Juarez Tramo Blvd. Díaz Ordaz a Ave. Ocampo.

Se hace entrega de Proyecto definitivo de Trazo y acabados de la Ave. Ocampo a la Ave. Independencia.

Nota No. 52 5/Abril/2016
 Se da inicio con la colocación de Aduquin iniciando los trabajos en el Tramo de Blvd. DIAZ ORDAZ A C. 14.

Nota No. 52 Continuación 3/04/2016
se ofrece para el adoquín de plantillas del
tamo de c. 12 a calle 12.

Se le indicó al contratista demandar la
Bombrera que de C. 14 de Lido a que tiene la
pendiente hacia las viviendas.

Nota No. 53. 6 Abril 2016 Mienudo
Se le indica al contratista Lexantán el
adoquín en Lido debido a que no está claro
la de tracciones y tuberías, indicando que
la instalación del mismo es similar a
la instalación de cerámica.

* se corta, afina y compactan cabezas de
manzanera de la calle Dese

Nota No. 54 7/04/2016

Hoy se contacta otra persona para la
educación de adoquín del Tamo de C. 14 a calle
12.

* se hizo excavación para localizar Torno
de drenaje existente del No. Ave. Juanes Pío
ya que este no está visible, se colocaron 2
Tubos de 9".

* se reciben compactaciones de Torno
Natural de cabezas de Manzana de C. 12
para colocar plantillas, localizando una
calle de vehículos en esa con calle 12 ya lo
que se indica nivelación a N.P.T.

Nota No. 55 7/04/2016

Hasta el día de hoy no se han empezado
trabajos pendientes debido a falta de
Materiales y mano de obra y a pesar
de ello no se han programado se en
→ continúan

Continúa Nota No. 55 7/04/2016
Continúa -

1.- Colados de bases (Portatita de concreto)
2.- Puercos en zanjas en cruces de calle y rancho que se hizo para colocar los cimbres de la Guarnición.

3.- Colados de Manijeta Guarnición fundidos de cabezas de manijeta del tramo de Blvd. Luis Ochoa de C. 10.

4.- Colados de los detalles de Manijeta de Guarnición (cavado).

CM

CM

Nota No. 56 8/04/2016 Viernes
Se le indica al contratista que nuevamente hay revisión y cambio al Proyecto entre Av. Ocampo y Calle Independencia por lo que no se le puede dar Tramo para demoliciones.

CM

CM

Nota No. 57 9 Abril 2016

Se afinan y compactan Tramos para colados de Plantilla de C. 12 a C. 10.
Se instala adoquín de C. 14 a C. 12

CM

CM

Nota No. 58 11 Abril 2016

Se le autoriza la demolición de las Manijetas existentes de C. 10 a Av. Ocampo mismo que se reedificará después de las Nueve de la Noche.

CM

CM

Nota. No. 59 12 abril

Se da Trabajo en la columna de adopción
de la C. 10 a C. 12 y de la C. 12 a C. 14
se piden para Colados de Plantas.
Trabaja en este mismo Tramo.
Se da con Juntas de Agua las torres
de adopción de C. 10 a C. 12 y C. 12 a C. 14.

(17)

[Signature]

Nota. No. 58 13 abril 2016 Miércoles,
se demolicionan banquetas de C. 10 a Ave.
Ocampo, se refuerza list existente en el lugar.
Se da para Colados de Guarniciones
de no piden en este mismo Tramo.

Se da la Colocación de adopción Tramo C.
10 a C. 12 y C. 12 a C. 14.

Se da la indicación de las torres existente,
en Tramo de C. 10 a Ave Ocampo se da para
hacer o construir nuevas con Tubos Plus de
1/2 pulgada de diámetro en su totalidad.

Se solicito de nuevo presentar los estimados
del mes de Febrero y mes de Marzo.

También se solicito más mano de obra
y dar a la mayor brevedad posible
antes de los trabajos que se van a
verificar.

(17)

[Signature]

Nota. No. 59 14 Abril - 2016 Jueves,
Se le indica al contratista por medio
de esta Nota que si no se ejecuta
ningún Trabajo en el Tramo de C. 10 a
Ave Ocampo. Entre otros, se da y
entre el este de C. 10 a C. 12 y C. 12 a C. 14.

Continúa Nota No. 59.

Realizando el Proyecto por parte del Implan.
También se le hace un seguimiento
que se continúan con los Trabajos del
Tramo de calle 13 a calle 21 ambos
Lados. En estos momentos no hay
Proyecto por lo que en cuanto se tenga se
le hará entrega.

Lo Anterior por Instrucciones de:
Implan.

Nota No. 60 15 ABRIL - 2016

Se solicita Presentar lo siguiente:
Precios extraordinarios mediante Ofertas
de campo

- 1.- EXT-37 Fabricación y colocación de Tapa
Metálica en sótano.
- 2.- EXT-38 Lasa de concreto armado
en sótano
- 3.- Suministro y colocación de Tapa metá-
licas en tubos drenaje
- 4.- Suministro e instalación de registro
eléctrico de 40x40x90 cms.

Nota No. 61

Se trabaja en colocación de Tubos En los:
1 Solo tubo para alumbrado de calle
10 y Ave. Ocampo.

Se instalan 3 Tubos de 2" para instala-
ciones subterráneas, e instalados de Telmex
se colocan Tubos 1" para radial de
Telmex para lo mismo.

Nota No. 62 18 abril 2016
Se le indica al residente la demolición de un negocio existente en Telnex para abrir en este mismo lugar un negocio h-3 Telnex. Se ubicaron las Pistas para estacionamiento Público.

Trabaja con muy poca mano de obra contratados a la Fecha

(11)

Nota No. 63 19 abril 2016 Martes
Se continúa con el estado de avance de los Puntos de Entrega. Trabajo C-10 a Ave. Ochoa. Hicieron nuevo las zonas sombreadas abien de la Ave. Ochoa a la Calle 10 como del Blvd. Diaz Ordaz a la Calle 10 se hizo sombreado para localización de Puntos Sombrados de la calle 14 a la calle 12 y Blvd. en ~~zona~~ Diaz Ordaz a Calle 11 en el cruce 2 veces hacia el exterior.

a la Fecha no se han ejecutado los siguientes:

- Colocar en zanjada rocam de ancho para la guardación de carril de calle.
- No se han colocado banquetas que estén lavadas.
- No se han colocado tapones en todos los laterales.
- No se han colocado Tapas a los vaguitos malos y de Telnex.
- No se tiene suficiente mano de obra para la colocación del adoquín.
- No se han colocado postes de alumbrado y no se han colocado bases de lámpara en 12 y calle 14.

(11)

Nota No. 64 21 ABRIL DE 2016

Se asienta en esta nota que las instalaciones, Subterráneas, instaladas para Telmex 2 Toms, de 2" de diámetro y radiales con Tubo de 1" de diámetro se instalaron del Blvd Díaz Ordaz a la Av. Ocampo.

En esta Tramo Tan Lina se instalaron postes L-3 (Tiro) para Telmex.

Se hicieron instalaciones Subterráneas con cables con 1" de diámetro y radiales con Tubo de 1" de diámetro, con Tubo de 1" de diámetro, 10, repuestos se instalaron para el servicio de 2000 tipo alumbrado público del Tramo del Blvd Díaz Ordaz a la calle 12 llegando con el cable hasta cruzando Estación de la Para Estas instalaciones están pendientes el Curo del Blvd Díaz Ordaz.





Nota No 65 22 ABRIL 2016

Se construyeron 3 registros con tuberías de Acero y Tapa, Metálicas del Tramo de la calle 14 a la calle 12.

X se colocaron Registros Tipo L3 - Para Telmex
3 piezas Tramo C. 14 a la C. 12
2 piezas Tramo C. 12 a la C. 10
2 piezas Tramo C. 10 a la C. Ocampo.





EXT- 66 NOTA No 66 25- ABRIL- 2016.

Se trabajó con Toman a descargar de la calle la a la Av. Ocampo se hacen Toman, ahora se le dio la indicación al Residente del Toman a futuro con tubo de 1" de diámetro la guarnición al registro existente.





Nota No 67, 26 de Abril, 1967.
 Se le dio la indicación al residente de
 hacer todas las tuberías y cajas de la C. 10 a la
 Avecampo con Teco Plus 1/2". Se le indicó también
 la colocación de la tubería de 1" de diámetro
 cubriéndolo de 1/4" de diámetro de la C. 10 a Ave-
 campo. Terminando el día de hoy la instalacion
 del tubo eléctrico para alumbrado Público
 y cajas de 2" de diámetro para instalaciones
 de tuberías de 1/2" de diámetro. Terminando el día
 hasta hoy se cubrió en Avecampo.

Se piden para cubrir los sis. Puntos de abastecimiento
 de agua que se encuentran en Avecampo.

- Colocación de tuberías de 1/2" de diámetro
 con cajas en ambos extremos para puntos
 de luz.
- Carga de concreto para 2003/10/17. Se
 trajo a colocarse alrededor de la casa
 de 3/4" x 1/2" x 1/2".
- Suministro y colocación de cañería de
 en tuberías de 1/2" de diámetro.
- Suministro y colocación de tubo hidráulico
 de 1/2" de diámetro.
- construcción de letreros de drenaje
 de 1/2" de diámetro. Hay un metro de
 fuerza con placa antideslizante de 1/2" x
 1/2" a Base de argilla 1 1/2" x 3/16" para
 g. y.



[Handwritten signature]

Nota No 68...

A la fecha se están con trabajos para
 mejorar de 1/2". Dar agua a 1/2" y
 no se han terminado por falta de
 materiales de 1/2".

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nota. NO. 69 29 Abril de 2016


Se demolió Banqueta existente entre
3 y Avenida Ocampo Banqueta Nat. Se le
indica al Residente que No se construyan las
banquetas y Adicional que tengan ubicadas en
este Tramo debido a que se va a demoler
el Edificio para ejecutar un Proyecto que se pre-
ve dentro del Estado. Hasta que Terminen con la
obra se mantendrá el acceso a las
banquetas de esta zona.

- Se le da También la Indicación de
que de la Av. Ocampo, a Calle 11 se ejecu-
tan Trabajos Viales de Reconstrucción que
a la Fecha E. A. Ay. Ayer Responsable
de 1 uno de Proyectos del Municipio No
nos ha pasado el Proyecto.

- Dentro del área o Trabajo de Calle 11
Av. Ocampo se localiza una Línea de FAS
tróica (Sistema de Junta de Agua), además en
una de las manzanas se localiza una caja de verificación
la cual se requiere No quede a bajo de la quanti-
dad por lo que solicita Junta de agua con
los bandos correspondientes Para localizar la
Junta sobre la Calle 11, y para hacer
los Trabajos de verificación y dar solución a la
Caja de verificación para Esto se le solicita
eliminar los siguientes piezas expuestas
y presentar el Plan extraordinario correspon-
diente:

- 1.- 1 Tapa Junta de 2" de diámetro FAS
- 2.- 1 Reducción de 3" a 2" Bifurcación
- 3.- 2 Junta Jugal de 2" para FAS

- a Tu Fecha No se cuenta con suficiente
Presupuesto para ejecutar los trabajos por lo
que se solicita se vea la Solución de este
Problema a la Mayor Brevedad Posible

Nota. NO-70 2 mayo 2016

a la Fecha No se han terminado de
colocar las bases debido a que no hay anclas

Se trabaja de la c. 10 a la C. Orcampo en
constitución de zonas domiciliarias con
tubo plus de la planta de vivienda

Se dejan zonas domiciliarias a futuro en
este mismo tramo así como de zonas a
futuro con tubo plus con tubo y tubopios

(17)

Nota. NO-71 4 mayo 2016 Miércoles

De Calle Decana a Ave Orcampo se trabaja
en campo de guardaciones de banquetas
se rellenan con caliche las zonas que se
hicieron nuevas.

Se coloca banqueta de la C. 14 adyacente
a la c. 14 No 1400.

Se tabirán anclas para el colado de las
bases faltantes de la C. 14 a la C. 12 y de la
C. 12 a la C. 10.

(17)

Nota. NO-72 6 mayo 2016

A la Fecha No se ha trabajado de la zona
13 a la c. 14 debido a que no se
ha proporcionado por parte de proyectos
la planta arquitectónica definitiva
lo mismo sucede con los trabajos que se van
a ejecutar de la Ave. Orcampo a la C. 11

(17)

Nota. NO 73 9 mayo 2016

Se trabaja en excavaciones para colocación de
policloro etileno, grúas de 2^a para trabajos
de Telmex en Tramo de C. 10 a la
Orcampo

(17)

NOTA NO 74 11 Mayo 2016 Miércoles.

Se le indica al Contratista el colado de las bases para colocar arbotante, en las sig. calles: C. Juárez y decima 2 piezas, calle decima 1 base y calle 14 y Juárez una pieza.

Al día de hoy nuevamente no hay suficiente fuerza de trabajo para atender los trabajos pendientes por ejecución de B/xb. días ordaz a C. Ocampo solicitándole a la mayor brevedad posible se solución este problema.

Nota NO. 75 18 mayo 2016 Miércoles.

Se le solicita al Residente el colado de la base para arbotante de alumbrado público que se omitió en el Tramo de C. Juárez Entre C. 10 a Ave. Ocampo.

Se ubicaron el día de hoy físicamente las bases a colar en C. 10, C. 12 y C. 14. Se le indicó que no se trabajará aún la banquetta Norte de C. 10 a C. Ocampo debido a que no han terminado de demoler los edificios localizados en ese Tramo.

Se hace entrega del inventario de Mobiliario Urbano y colocación de árboles de 1 Blvd. Díaz Ordaz a Ave. Ocampo.

Se le solicitó la colocación de un Paradero de camión en parada ubicada al costado de la Entrada de estación del VibeBus.

Nota NO. 76 19 Mayo 2012 Jueves.

Se solicita Presentar Precio Unitario de Tapones Foto Para Tubos sanitarios de 4" ubicados en banquetas del Blvd. Díaz Ordaz a C. Ocampo lado Sur.

Nota. No. 77 19 Mayo 2016

Se hace entrega de Trazo de la Calle 13 a la calle 21 tanto Digital como Impreso. Este es definitivo.

Se le indica al Residente que antes de demoler las banquetas de C. 13 a C. 21 se deberá generar conjuntamente el levantamiento de las instalaciones existentes. Estas demoliciones se harán de noche. 2 cuadras consecutivas, después de las 9:00 Pm y se retirará el escombro esa misma noche para que al día siguiente esté listo el tramo para colado de Guarnición.

También se le informa que el Proyecto Arquitectónico de C. Juárez de C. 13 a C. 21 Norte y Sur. aún no se define. Por lo que en cuanto esté terminado se le hará la entrega.

CM

20 mayo 2016 Nota. No. 78 Jueves

Se colaron bases de C. 10, C. 12, C. 14, se colaron banquetas de granzón lavadas de C. 10 a C. 12 y banqueta acabada a Vuelta de plaza de C. 14.

Al día de hoy no se ha colocado adoquín de C. 10 a C. Ocampo y el Tramo Faltante de C. 14 a Calle 12, debido a que no hay en existencia Adoquín color gris oscuro.

- se le indica al Residente que en el sótano de la cafetería de C. Juárez No. Entre C. 10 y Ocampo se colocará antes de colocar el adoquín un impermeabilizante debido a que se está filtrando el agua de lluvia por la losa existente.
