

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Tratamiento y Aforo de Pozo para
Agua Potable

CONTRATISTA: Pyansa

CONTRATO: 208/2016

MONTO: 45,008.00 incl. IVA

FECHA DE INICIO: 12 Sept al 30 Sept 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: _____


FIRMAS

Jesus m. Franco
RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

000001

Nota NÚM. 1 12-Sept-16
Con esta nota y Fecha Se da apertura a
la presente bitácora de obra, con el fin de
asentar todos los asuntos relacionados y que
se generen durante la ejecución de la obra
"TRATAMIENTO Y AFORO DE POZO PARA AGUA POTABLE
en G. Fco. I. Madero, que ejecutará la empresa
Contratista "Perforaciones y Aforos del Norte S.A.
de C.V." Representada por el Ing. Manuel Del Villar
Basurto, Amparado con el contrato NÚM. 208/2016
por un importe de 45,008.00 IVA incluido con
un periodo de ejecución del 12 de Septiembre
del 2016 al 30 de Sept. del 2016.
Las actividades o conceptos de obra consisten
EN



000000

NOTA NUM. 2 12-SEPT.-16

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN, ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN, NOMBRA COMO RESIDENTE DE OBRA AL ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTÍNEZ AUTORIZÁNDOLO A REALIZAR Y SUSCRIBIR ANOTACIONES EN ÉSTA, BITÁCORA, YA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRANDO COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA AL ING. HUGO DEL VILLAR ROMERO, AUTORIZÁNDOLO A FIRMAR Y REALIZAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES EN ÉSTA BITÁCORA PARA TAL EFECTO REGISTRAR SU NOMBRE Y FIRMA AL CAJAL.

Jesús M. Franco



Ing. Jesús Manuel Franco MIZ.

Ing. Hugo del Villar R.

000003

Nota Núm. 3 12/Sept./16

Con esta nota y fecha se establece que una vez asentada la nota la contra-parte estará obligada a Firmar en un plazo no mayor a 48 Hrs. En caso contrario se dará por aceptado el contenido de la misma; También se establece la obligación de ambas partes de asentar en esta bitácora los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, número Generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato así como lo relacionado a los Normas de Seguridad, Higiene y Protección al medio Ambiente vigentes.



000004

NOTA NUM. 4 12/Sept/16

Se pone a Disposición del Contratista el sitio
Para ejecución de la obra.

Jco.

L

NOTA NUM. 5 12/Sept/16

Suministro e instalación (colocar) 200 lts. de Dispensor
de Arcillas.

Jco.

L

NOTA NUM. 6 19/Sept/16

Suministro y colocar 220 Kgs. de Hielo Seco
como Tratamiento Para Limpieza y estimulación
del Acuífero. (Para en caso de que haya quedado
BENTONITA o lodo de perforación tapando Hacer.

Jco.

L

000005

Nota Num. 7 19/sept/16

Instalan Equipo para bombeo con columna de
255 mts. y 3" ϕ con Bomba S-mergible.

Jo.

A.

Nota Num. 8 19/sept/16

a LAS 15:15 HRS. Se da inicio con el Aforo
o desarrollo de Pozo de Ej. Fco. I. Madero
Nivel de 113 MTS. y un Castero de 1.0 LPS a
170 MTS. de N.D. con Recuperación en 2 Horas
y Castero de 73 MTS. quedando el nivel estatico
a 117 MTS. (en ese periodo de Recuperación).

Jo.

A.

000006

NOTA NÚM. 9 30-SEPT-16

Se Recibe estimación número 1 (Única)
y Números Generadores, Para Revisión y Trámite

Jh.

A

NOTA NÚM. 10

Se Autoriza estimación y se ingresa Para
trámite de pago.

Jh.

A


NOTA NÚM. 11

Por no haber otros Asuntos Técnicos
Relacionados con la obra se cierra la
Presente bitácora

Jh.

A

000007

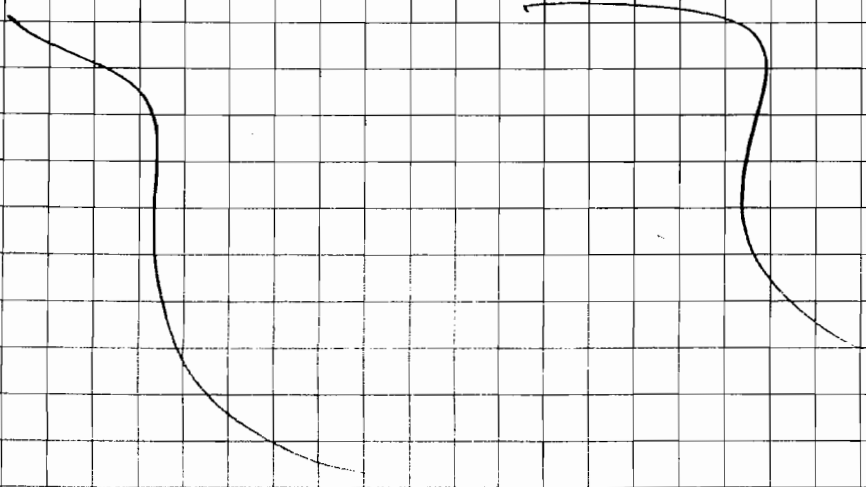

000002

Nota Num. 2 12-Sept.-16

La Dirección de Obras Públicas a través del Jefe del depto. de Construcción, Ing. Enrique Villarreal Alemán, nombra como Residente de obra al Ing. Jesús Manuel Franco MARTINEZ Autorizándolo a Realizar y Suscribir ANOTACIONES en esta bitácora, ya empresa contratista nombra como Residente de Construcción en la obra al Ing. Hugo del Villar Romero, Autorizándolo a Firmar y Realizar las ANOTACIONES PERTINENTES EN esta bitácora, para tal efecto registran su nombre y firma al calce.

Jesús m. Franco

Ing. Jesús Manuel Franco MIZ

Ing. Hugo del Villar R.
