



Factura

FOLIO: 769

FECHA: 5/6/2017 15:17:47

Documento Válido

Expedido en: ESTRADA BOCANEGRA 1702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS
SA DE CVMET0411185E7 ESTRADA BOCANEGRA No. 1702
SAN FELIPE,
CHIHUAHUA 31203
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICORégimen Fiscal :
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORALCliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: MINA No. 408 Teléfono:
Colonia: CENTRO C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Cantidad	Unidad de medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No. 1 (UNICA) DEL PERIODO 02 DE MAYO DE 2017 AL 05 DE MAYO DEL 2017 OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES GRAL. RINCON, MONTE PICO, GRANJAS DE LA BOVINA, Y COBALTO DE ESTA CIUDAD CONTRATO No.- 039/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$560,798.59 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$1,121.60 0.2% C.M.I.C. \$1,121.60 SUMA DESCUENTOS \$2,243.20 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$560,798.59 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 DESCUENTOS \$2,243.20 SUB - TOTAL \$558,555.39 I.V.A. \$89,727.77 SALDO NETO PARA PAGO \$648,283.16 CON LETRA: (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.)	560,798.59	560,798.59

Importe con letra
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 36/100 M.N.
Información de Pago
Forma de pago: Otros Cuenta : Condiciones :

SUBTOTAL:	560,798.59
I.V.A.:	89,727.77
TOTAL:	650,526.36


Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404399972
Folio fiscal:	AA9D6C39-FD5C-4025-968F-CDBE22CA034D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 5 2017 - 16:17:52

Sello digital del CFDI
EprFX2ylSNzryOTPy98weNuS+zhbmnfwyIYBPJfJcBM8B2ucQkNK8/BgT47LoGL9Ih6Yf8QxANnJoDQ3uy3CS XxyZROud/S8ZgeBqUIZM57rzvDAD1CPV2CKVCVefhhu82yRX01qxOOIS9Y5mfMux3RzEaOmviEDDbHfmjbeY9Z L0sth/w/X8Z5Zk/Tq9DZL4+nbhp31PMgaITxcHN/G4mo/fxEkMU2y/r9iLVS4dqXV3yP2fgSTek+owhGjRtYZH vjFeX1Lan2cOQTRv1ZFFSDb4Phi3XV3smSnNd5xPpDMDqduS3uVDJpz5IA5br40wma/EMVgEtuzJOuvDDOdQ==

Sello del SAT
SG8MqI65YQS9mhw1sEKGAB/3Ph6cgRRDYE1IXW8TDveOlycsBEFCq89wugB5qzNVm0uOBjMz6PnaSl1J 1tg11+9NjnXjRmY7Dv4N47rv3GGP3bHE2rz8Aa8gd9I2Ccs2NrcWPhigdVvxYOPg4cy9EdyCuqq2CsY6 xzIEaAci5JCb/BgfnWMDPh/76+GL6DkWWiMvNpRisFM1P7OsUk+oSVBbqheYVjqSWnDPMUNUmihXDbmG y9Fu7SRhhW7+tzH3PWWGwKmiXylDN2/4kPGkNbgQxVwe8jDUM/j/GQkE40j8QJW+esfRgKHTTh0Qrp4 Mi2qPcg6bXJQRffFUzjhFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 AA9D6C39-FD5C-4025-968F-CDBE22CA034D 2017-06-05T16:17:52 EprFX2ylSNzryOTPy



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

MET0411185E7

Folio Fiscal

AA9D6C39-FD5C-4025-968F-
CDBE22CA034D

Total del CFDI

\$650,526.36

Nombre o Razón Social del Emisor

MERP EDIFICACIONES Y
TERRACERIAS SA DE CV

Fecha de Expedición

2017-06-05T15:17:47

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-06-05T16:17:52

Estado CFDI


Vigente

Nombre o Razón Social del
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir


 CHIHUAHUA GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2015 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICA E INFRAESTRUCTURA		HOJA DE RESUMEN FINAL No. <u>1</u>	
PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL 2017		CONTRATO No.- 039/2017	
OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES GRAL. RINCON, MONTE PICO, GRANJAS DE LA BOVINA Y COBALTO DE ESTA CIUDAD.		CONTRATADO \$ 604,128.00	
ESTIMACION No. 1(UNICA)			
PERIODO : 02 DE MAYO AL 05 DE MAYO DEL 2017			
CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.		IMPORTE ESTIMADO \$ 560,798.59	
R.F.C. MET-041118-5E7		IMPORTE ACUMULADO \$560,798.59	
C O N C E P T O		I M P O R T E O B S E R V A C I O N E S	
PAVIMENTOS			
OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES GRAL. RINCON, MONTE PICO, GRANJAS DE LA BOVINA Y COBALTO DE ESTA CIUDAD.		\$ 560,798.59	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 560,798.59	
DESCUENTOS:			
0.2% C.M.I.C.		\$ 1,121.60	
0.2% D.I.F.		\$ 1,121.60	
SUMA DESCUENTOS		\$ 2,243.20	
RESUMEN:			
SUMA ESTA ESTIMACION		\$ 560,798.59	
AMORTIZACION ANTICIPO		\$ 0.00	
DESCUENTOS		\$ 2,243.20	
SUB - TOTAL		\$ 558,555.39	
I.V.A.		\$ 89,727.77	
SALDO NETO PARA PAGO		\$ 648,283.16	
CON LETRA: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.			
FORMULA:		ACEPTO:	
RESIDENTE DE OBRA		EL CONTRATISTA	
ING. ADOLFO WILLACOBOS HERNANDEZ		MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.	
REVISOR		Vo.Bo.	
JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL		SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
ING. ANTONIO ARTURO GOMEZ BALLONA		ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	
AUTORIZO:		AUTORIZO:	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL		ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO VIAL DEPTO. MANTENIMIENTO VIAL			CONTRATO No. 039/2017 OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES GRAL. RIMCON, MONTE PICO, GRANJAS DE LA BOVINA Y COBALTO DE ESTA CIUDAD CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.			ESTIMACION No 1(UNICA) PERIODO 02 DE MAYO AL 05 DE MAYO DEL 2017			HOJA No 1 DE 1		
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	INCISO	C O N C E P T O			UNI	C A N T I D A D E S				PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
		DESCRIPCION	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION		HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION				
		PAVIMENTOS									
1		CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO		M2	7,890.26	7,890.26	0.00	7,890.26	50.80	400,825.21	
2		FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30 CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30		M3	63.00	63.00	0.00	63.00	2,539.26	159,973.38	
S U M A S											\$ 560,798.59
N O T A S					IMPORTA ESTA HOJA: QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 560,798.59						
					LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH. FECHA: jueves, 1 de junio de 2017 ESTIMO: Residente ING. ADRIANO VILLALOBOS HERNANDEZ REVISO: Jefe Depto. ING. CARLOS AGUILAR GARCIA ACEPTO: Contrajefe MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. Vo Bo. Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA						

GENERADORES

GRAL. RINCON
TRAMO 1 ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. MERCURIO
TODO EL ANCHO (2 CARRILES) TENDIDO

NO.	CAD 1	ANCHO	A1 + A2	LARGO PROM.	AREA (M2)
0	0+000	9.09			
1	0+050	9.22	18.31	25.00	457.75
2	0+100	9.09	18.31	25.00	457.75
3	0+150	9.12	18.21	25.00	455.25
4	0+200	9.11	18.23	25.00	455.75
5	0+250	9.12	18.23	25.00	455.75
6	0+300	9.12	18.24	25.00	456.00
7	0+350	9.14	18.26	25.00	456.50
	0+354	8.00	17.14	2.00	34.28

SUBTOTA 3229.03

CALLE MONTE PICO
TRAMO 2 ENTRE CAMINO A LA CALERA Y CALLE POTRERO HONDO
TODO EL ANCHO (2 CARRILES) TENDIDO

NO.	CAD 1	ANCHO	A1 + A2	LARGO PROM.	AREA (M2)
0	0+000	8.96			
1	0+050	8.97	17.93	25.00	448.25
2	0+100	8.93	17.90	25.00	447.50
3	0+150	8.95	17.88	25.00	447.00
	0+180	8.95	17.90	15.00	268.50

SUBTOTA 1611.25



CALLE GRANJA DE LA BOVINA
TRAMO 3 ENTRE C. GRANJA DE LA CAPRINA Y C. GRANJA DE LA BALLENA
TODO EL ANCHO (2 CARRILES) TENDIDO

NO.	CAD 1	ANCHO	A1 + A2	LARGO PROM.	AREA (M2)
0	0+000	6.32			
1	0+050	6.31	12.63	25.00	315.75
2	0+100	6.30	12.61	25.00	315.25
3	0+150	6.35	12.65	25.00	316.25
4	0+200	7.20	13.55	25.00	338.75
5	0+250	7.65	14.85	25.00	371.25
6	0+300	8.2	15.85	25.00	396.25
7	0+350	7.8	16.00	25.00	400.00
8	0+400	7.05	14.85	25.00	371.25
	0+433	6.6	13.65	16.50	225.23

SUBTOTAL 3049.98


TOTAL MORTERO M2 7890.26

TOTAL RENIVELACION COMPACTA M3 63.00




CROQUIS


TRAMO 1: CALLE GRAL. RINCON ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. MERCURIO (TODO EL ANCHO DE CALZADA) MORTERO

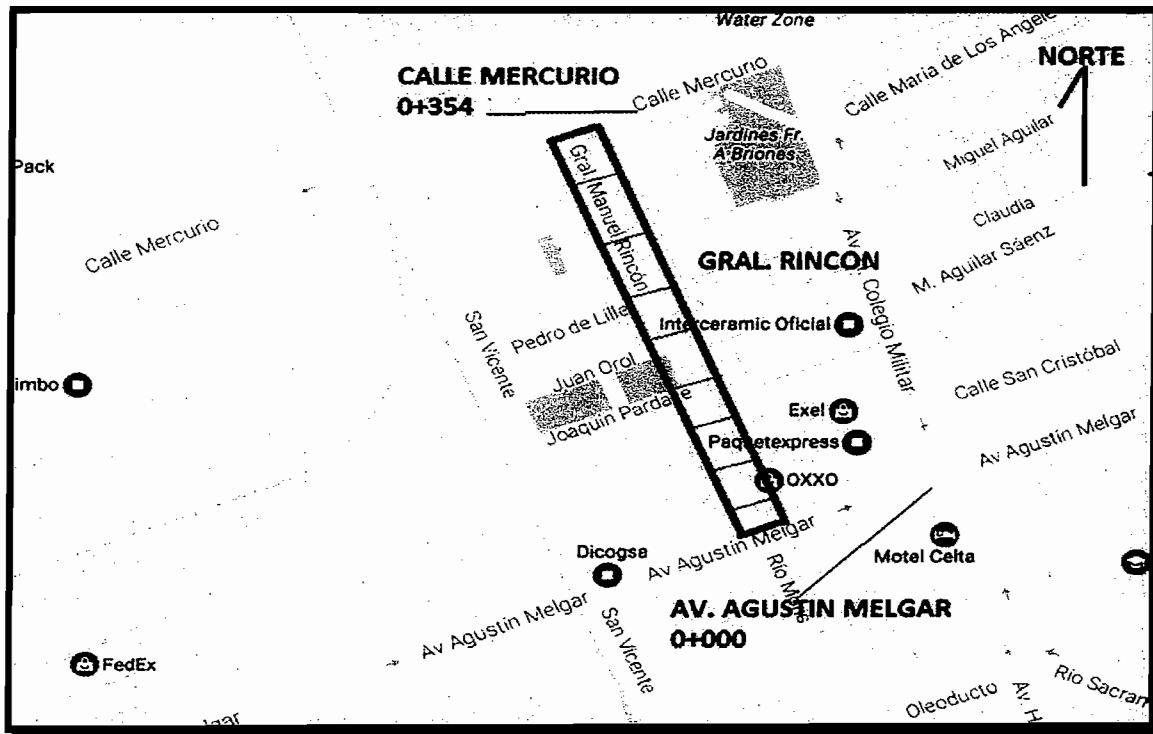

TRAMO 2: CALLE MONTE PICO ENTRE CALLE CAMINO A LA CALERA Y CALLE POTRERO HONDO (TODO EL ANCHO DE CALZADA) MORTERO

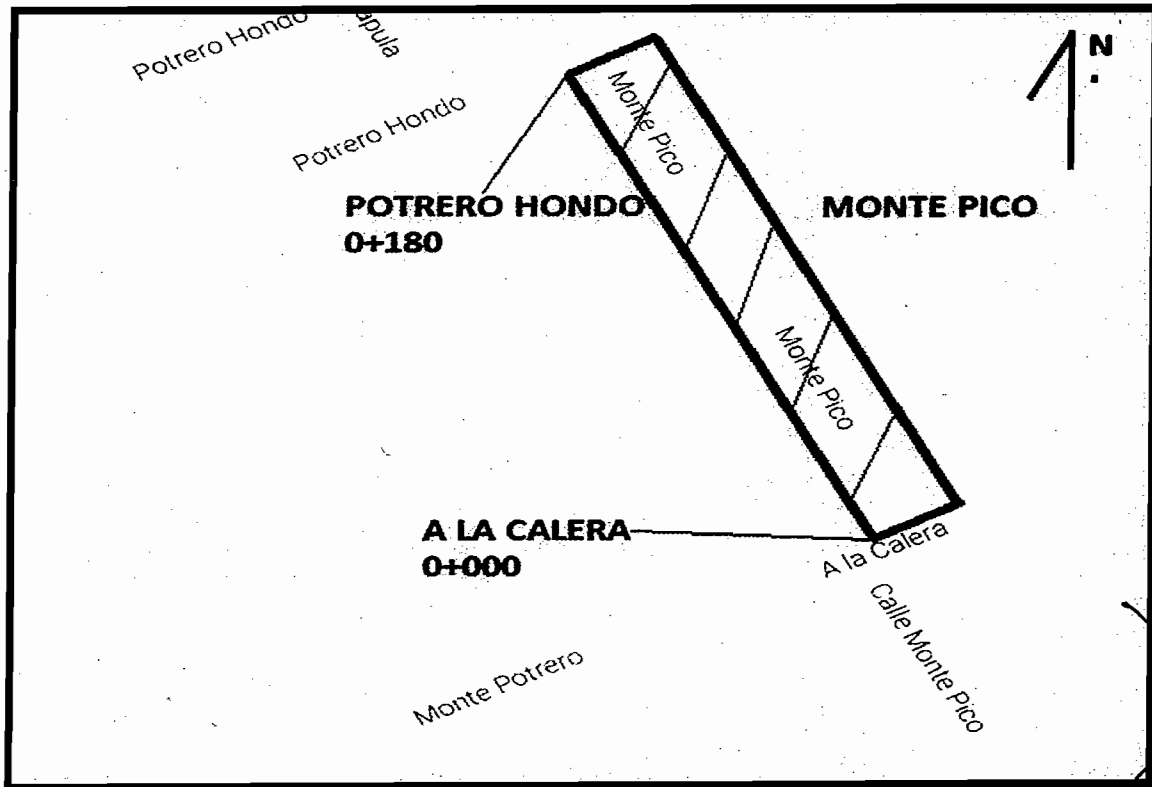

TRAMO 3: CALLE GRANJA DE LA BOVINA ENTRE CALLE GRANJA DE LA CAPRINA Y CALLE GRANJA DE LA BALLENA (TODO EL ANCHO DE CALZADA) MORTERO

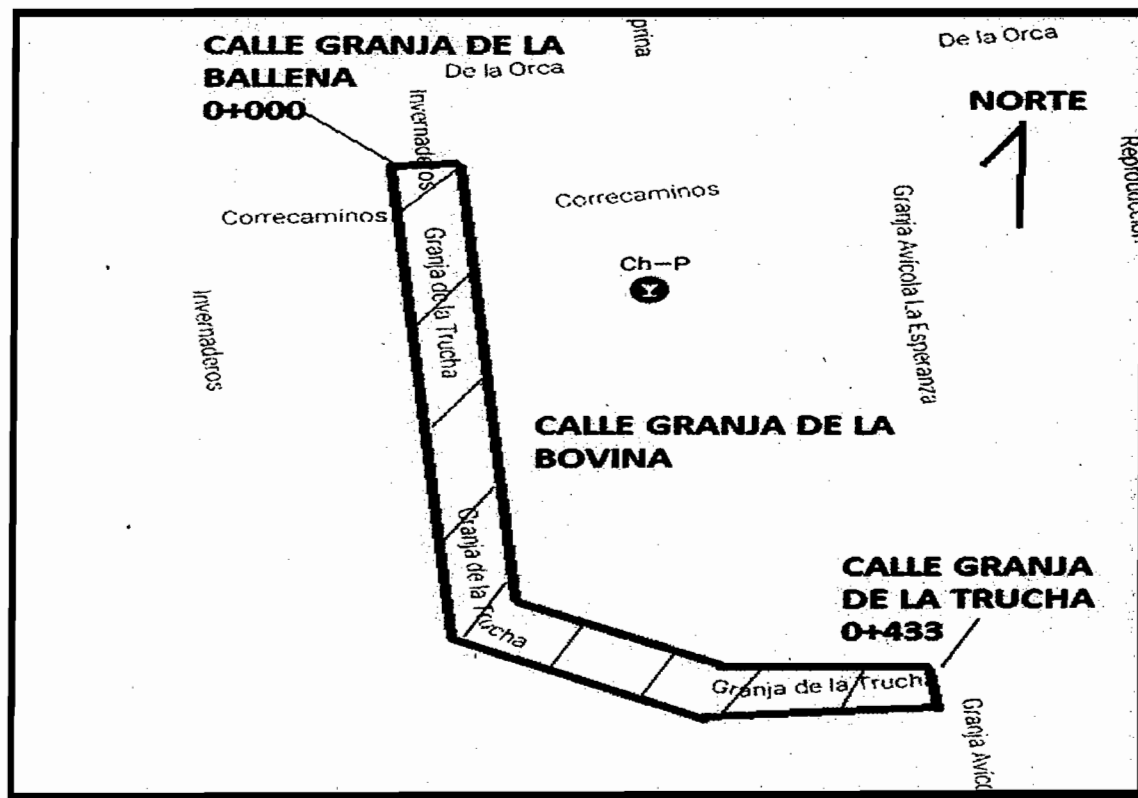

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten X mark]



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA REHABILITACION PAVIMENTO CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 2-may.-17
FECHA INFORME 6-may.-17

TENIDA EN CALLE GENERAL RINCON ENTRE AV. AGUSTIN MELGAR Y AV. MERCURIO
TODO EL ANCHO DE LA CALLE)

MUESTRA MORTERO ASFALTICO 3/8"

DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS


UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA

CARPETA ASFALTICA

MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	100	
1/2"	100	
3/8"	100	
1/4"	78	
Núm. 4	66	
Num. 10	37	
Núm. 20	21	
Núm. 40	16	
Núm. 60	11	
Núm. 100	8	
Núm. 200	4	
RET. MALLA		%

COMPOSICION GRANULOMETRICA

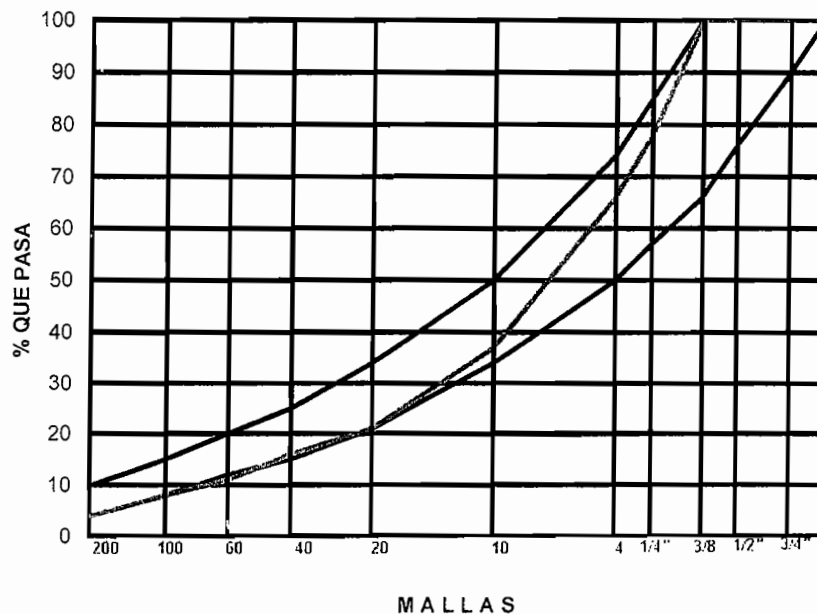

P.V. SECO SUELTO Kg/m ³	
ABSORCION %	
DENSIDAD	
DESGASTE %	
PART. ALARGADAS %	
PART. LAJEADAS %	
EQUIV. ARENA %	
CONTRACCIÓN LINEAL %	


CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2354	
ESTABILIDAD, kg.	1117	817.5
FLUJO, mm	3.0	2 - 3.5
VACIOS, %	4.2	DE 3 A 5
VAM, %	16.8	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.0	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC -30
PENETRACION, 25°C, 100 gr. 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811. COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA REHABILITACION PAVIMENTO CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 3-may.-17
FECHA INFORME 6-may.-17

TENDIDA EN CALLE MONTE PICO ENTRE CAMINO A LA CALERA Y CALLE PROTRERO HONDO

TODO EL ANCHO DE LA CALLE)

MUESTRA

MORTERO ASFALTICO 3/8"

DESCRIPCION DEL MATERIAL

ROCA CALIZA

TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO

TRITURACION TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO

EN LA PLANTA DE ASFALTOS

UBICACION DEL BANCO DEL PETREO

MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA

CARPETA ASFALTICA

MALLAS	% PASA	PROYECTO
1"	100	
3/4"	100	
1/2"	100	
3/8"	100	
1/4"	86	
Núm. 4	70	
Num. 10	39	
Núm. 20	24	
Núm. 40	17	
Núm. 60	13	
Núm. 100	10	
Núm. 200	6	
RET. MALLA		%

P.V. SECO SUELTO Kg/m³

ABSORCION %

DENSIDAD

DESGASTE %

PART. ALARGADAS %

PART. LAJEADAS %

EQUIV. ARENA %

CONTRACCION LINEAL %


CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO

TIPO AC -30

PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.

VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL. seg

COMPOSICION GRANULOMETRICA

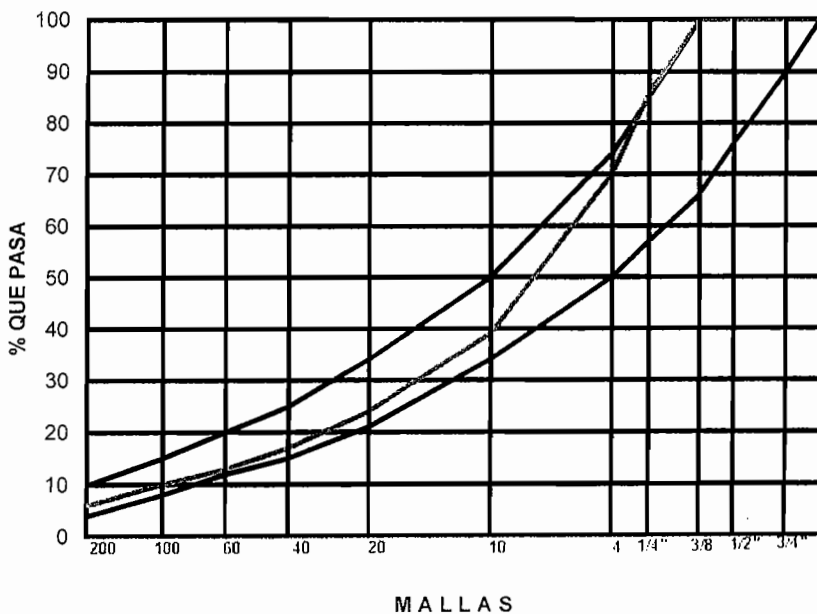

MALLAS

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2354	
ESTABILIDAD, kg.	1100	817.5
FLUJO, mm	2.7	2 - 3.5
VACIOS, %	3.9	DE 3 A 5
VAM, %	17.1	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO

C. FAUSTO CHAVEZ RASCON



CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA REHABILITACION PAVIMENTO CALLES DE LA CIUDAD PLANTA MERP
LOCALIZACION CHIHUAHUA, CHIH. FECHA RECIBO 4-may.-17
FECHA INFORME 6-may.-17

TENDIDA EN CALLE GRANJA DE LA BOVINA ENTRE CALLE GRANJA DE LA BALLENA Y CALLE GRANJA DE LA CAPRINA

TODO EL ANCHO DE CALZADA

MUESTRA MORTERO ASFALTICO 3/8"

DESCRIPCION DEL MATERIAL ROCA CALIZA


TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO TRITURACION TOTAL

CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO EN LA PLANTA DE ASFALTOS

UBICACION DEL BANCO DEL PETREO MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	100	
	3/8"	98	
	1/4"	82	
	Núm. 4	67	
	Num. 10	39	
	Núm. 20	23	
	Núm. 40	15	
	Núm. 60	10	
	Núm. 100	7	
	Núm. 200	4	
RET. MALLA			%
P.V SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART ALARGADAS %			
PART LAJEADAS %			
EQUIV. ARENA %			
CONTRACCIÓN LINEAL %			

COMPOSICION GRANULOMETRICA

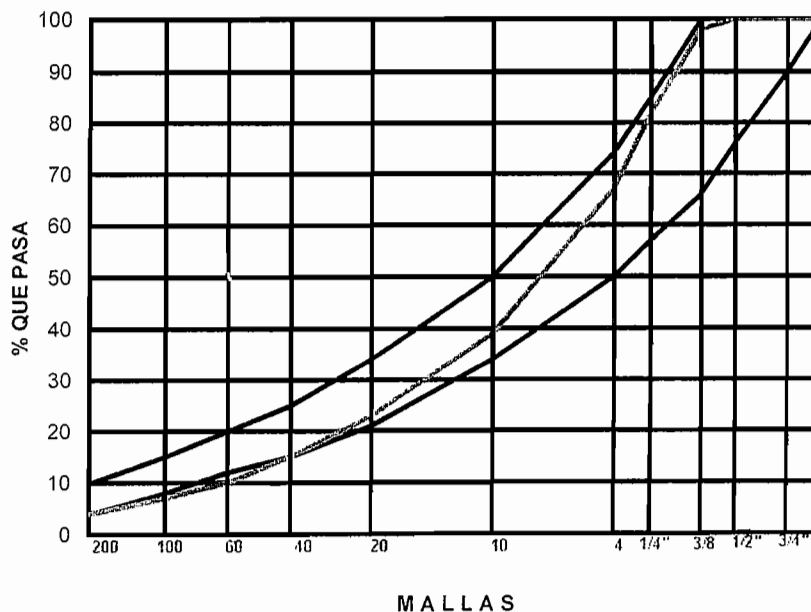

MALLAS

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³		2331
ESTABILIDAD, kg.		1096 817.5
FLUJO, mm		3.1 2 - 3.5
VACIOS, %		4.2 DE 3 A 5
VAM, %		17.4 16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %		5.1 5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC -30
PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg	

OBSERVACIONE

LA MEZCLA ANALIZADA ES ADECUADA PARA SU EMPLEO

EL JEFE DEL LABORATORIO
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES GRAL. RINCON, MONTE PICO,
GRANJAS DE LA BOVINA Y COBALTO DE ESTA CIUDAD'.



MORTERO



RENIVELACION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: "REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES GRAL. RINCON, MONTE PICO,
GRANJAS DE LA BOVINA Y COBALTO DE ESTA CIUDAD".



MORTERO




RENIVELACION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: "REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES GRAL. RINCON, MONTE PICO,
GRANJAS DE LA BOVINA Y COBALTO DE ESTA CIUDAD".

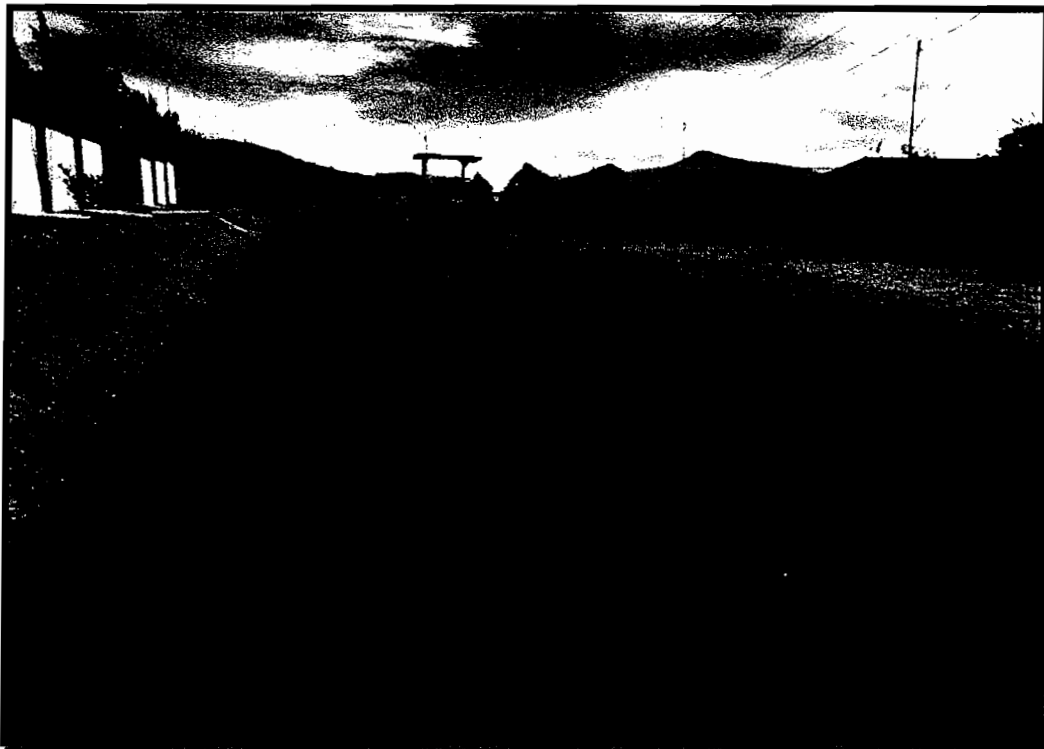

MORTERO



RENIVELACION

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

#Torno 01

02 Mayo - 17

- Se iniciaron los trabajos del contrato No 025/2017 en C. Gral. Riquelme entre Av. Agustín Melgar y Av. Héroles, tendiendo carpeta asfáltica de 3/8" en todo el ancho de calzada.

Jayal.

03 Mayo - 17

- Se tendió carpeta asfáltica de 3/8" en calle Monte Pico entre camino a la calera y calle Pichas Hondo; Todo el ancho de calzada.

Jayal.

04 Mayo - 17

- Se tendió carpeta asfáltica de 3/8" en C. Gral. de la Brava entre calle Gral. de la Brava y C. Gral. Capriles, todo el ancho de calzada.

Jayal.

05 Mayo - 17

- Se hicieron trabajos de limpieza en las áreas terminando así los trabajos del contrato al 100%; La calle Caballo no se valló debido a estar con árboles picados de la calle, no eran adecuados.

Jayal.
