

**Factura**

Serie:

Folio: 901

Fecha: 16/12/2017 13:14:52

Tipo: I Ingreso

Lugar de Expedición: 31203

Documento Válido**MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV**

MET0411185E7

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Uso CFDI:

P01 - Por definir

Clave SAT	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
72103301	1.00	Unidad de servicio	Servicio o reparaciones o mantenimiento de calles ESTIMACION 6 (SEIS) DEL PERIODO 18 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO DEL 2017 OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. CONTRATO No.- 056/2017 IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$251,175.81 DESCUENTOS: 0.2% D.I.F. \$502.35 0.2% C.M.I.C. \$502.35 SUMA DESCUENTOS \$1,004.70 RESUMEN: SUMA ESTA ESTIMACION \$251,175.81 AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00 DESCUENTOS \$1,004.70 SUB - TOTAL \$250,171.11 I.V.A. \$40,188.13 SALDO NETO PARA PAGO \$290,359.24 CON LETRA: (SON DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)	251,175.81	251,175.81

Importe con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.

Información de Pago

Forma de Pago: 99 Moneda: MXN

Método de Pago: PPD

SUBTOTAL:	251,175.81
I.V.A.:	40,188.13
TOTAL:	291,363.94
I.C. Y O.P.	0.00
RETENCION	0.00
SALDO NETO PARA PAGO	291,363.94

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404399972
Folio fiscal:	43EA93A8-E0CB-4B8B-B43F-DBFC3B05C417
UUID Relacionado:	
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 16 2017 - 14:14:56

Sello digital del CFDI

RJn5vqZQMgXdys+C5A9KzgueeDddY6646U9klWe8sbvz4JuR8ocImtGhzT5/R4lyTtmU993hHvxSWSa9/otnY3rhdBZ/16FnfkI2nyn7FD6tzSrZk3IHtu687PEM45WItop3xkVRtnqb9IjIRy2XDaTvPBZ0IBkC56ZpXd9Fdi0Rs6EnZmLdlWTgcUcJw/09ZAfVldUzJloEEKfelQ2DoHW8Rf+p5sJR6d7703kFrXPKuAH9oBaIugQkaaXOVbiNzI56D9963JnX8D83HccGVMDxbCcSA/HJ0kBMkgneoiGPE9u5+2QKEhvpLJII09ca/kBDhGctf8Sfdsui8gULQ==

Sello del SAT

i7xPVQevZaNkglHQCQRNRPSYmLwEP06M83ReaSjTBkwaMfxDQ8DEc4yXoRs4MVEQtTOnUYRNOPIJRdm6S2J3LmT8PmasKfKJSgvr39FGGg3iDf9Xhv05bX55LeVruvmlyzaoppVRyQ1Zj5CzUECYv/YyE4YyxBiaoqBla1wbY/VhId8tdqZAmc5BoMjPmkDO7EQkU75DzGUouMnUC7mvQXBRwTMw41TBMWSPslrK7d0i6Kon7afSKOAVgxQHif0CcUPdEfr6qat8QDB5TQuGX/G8zyTnym4Hj+L1T2xJASdctFM+74EHMm78SNaT/X1X2x3n2L/Evxpg2WKsNY6JVvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43EA93A8-E0CB-4B8B-B43F-DBFC3BDEC417|2017-12-16T14:14:56|MAS0810247C0|RJn5vqZQMgXdys+C5A9KzgueeDddY6646U9klWe8sbvz4JuR8ocImtGhzT5/R4lyTtmU993hHvxSWSa9/otnY3rhdBZ/16FnfkI2nyn7FD6tzSrZk3IHtu687PEM45WItop3xkVRtnqb9IjIRy2XDaTvPBZ0IBkC56ZpXd9Fdi0Rs6EnZmLdlWTgcUcJw/09ZAfVldUzJloEEKfelQ2DoHW8Rf+p5sJR6d7703kFrXPKuAH9oBaIugQkaaXOVbiNzI56D9963JnX8D83HccGVMDxbCcSA/HJ0kBMkgneoiGPE9u5+2QKEhvpLJII09ca/kBDhGctf8Sfdsui8gULQ==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MET0411185E7	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43EA93A8-E0CB- 4B8B-B43F- DBFC3BDEC417	2017-12- 16T13:14:52	2017-12- 16T14:14:56	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$291,363.94	Ingreso	Vigente	

Imprimir



HOJA DE RESUMEN FINAL

No.1

CONTRATO No. 056/2017	CONTRATADO
EST. 6 (SEIS)	
PERIODO: 18 DE MAYO AL 23 DE AGOSTO DEL 2017	

CONTRATO No. 056/2017

CONTRATADO \$6.115.940.62

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL

TRAMO: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHITHUAHUA."

CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MET 041118 5E7

\$ 251,175.81

\$ 5,694,283.52

CONCEPTO

PAVIMENTOS

IMPORT

\$ 251,175.81

OBSERVACIONES

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 251,175.81

DESCUENTOS:

0.2 % I.C.I.C.;

0.2 % D.I.F. MUNICIPAL

SUMA DESCUENTOS

36 203 4

SE 205 \$
CC:70C \$

CC:70C &
\$ 1 004.50

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30%

DESCUENTOS

SUB - TOTAL

I.V.A.

SALDO NETO PARA PAGO

CON LETRA:

SON: (DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL**

CONTRATO No. 056/2017
OBRA: MEJORAMIENTO VIAL

Km. A Km.

Km.	A Km.	ORIGIN:
EST. 6 (SEIS)		HOJA No.

1 DE 1

TRABAJO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.*

O B R A (ESTACIÓN Y DESCRIPCIÓN)	INCISO	C O N C E P T O		UNI	C A N T I D A D E S					PRECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
		DESCRIPCIÓN	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION				
1	1)	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "	2,027.50	1,888.00	1,804.72	83.28				\$3,016.04	\$251,175.81

S	U	M	A	S
N	O	T	A	S

IMPORTE ESTA HOJA

\$ 251,175.81

SON: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 01/10/2014 N.)

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2017

ESTIMOS:

Residente: **ARQ. CESAR JAVIER LEIVA FRANCO**

REVISION:

Jefe Depto. **ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN**

ACCEPTED:

Contratista MERP EDIFICACIONES

Vo. 80.

Subdirector: **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**

BITACORA DE OBRA

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON BACHEO
 EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C.V.
 No. DE CONTRATO 056/2017

FECHA	CUAD.	MEZCLA	TRAMO
		M3	
18-MAY.-17	2	7	SOTO KM. 19 SOTO KM. 19 SE ATENDIERON 124 BACHES
19-MAY.-17	1	4	SOTO KM. 19 SE ATENDIERON 74 BACHES
20-MAY.-17	1	4	LOC. SOTO KM 0+000 A ENTRONQUE SE ATENDIERON 86 BACHES
22-MAY.-17	1	4	RAMAL DEL CHARCO A SOTO RAMAL DEL SOTO SE ATENDIERON 86 BACHES
03-JUN.-17	1	4	COLONIA SOTO SE ATENDIERON 84 BACHES
05-JUN.-17	1	4	ENTRONQUE KM 14 EL CHARCO-SOTO SE ATENDIERON 84 BACHES
06-JUN.-17	1	4	CAMINO SOTO-LA NORIA SE ATENDIERON 102 BACHES
07-JUN.-17	1	4	CAMINO ENTRONQUE KM 7 SOTO SE ATENDIERON 84 BACHES
08-JUN.-17	2	8	KM 0+000 AL 7.00 SOTO KM 0+000 AL 7.00 SOTO SE ATENDIERON 132 BACHES
07-JUL.-17	1	0.62	CAMINO RURAL ORTIZ-PALO BLANCO Y TRILLO SE ATENDIERON 6 BACHES
12-JUL.-17	2	6	EL SAUZ CAMINO A CALABACILLAS SE ATENDIERON 80 BACHES
31-JUL.-17	1	4	CAMINO A PUNTA DE AGUA ENTRE CARRETERA JUAREZ Y P. DE AGUA SE ATENDIERON 38 BACHES
01-AGO.-17	1	4	CAMINO DEL TORREON A CALABACILLAS SE ATENDIERON 48 BACHES
02-AGO.-17	1	4	CAMINO AL FARO SE ATENDIERON 37 BACHES
03-AGO.-17	1	5	EL SAUZ SE ATENDIERON 61 BACHES
07-AGO.-17	1	4	CAMINO A CALABACILLAS SE ATENDIERON 61 BACHES
08-AGO.-17	1	3	CARRETERA A CALABACILLAS SE ATENDIERON 59 BACHES
17-AGO.-17	1	4	CAMINO DEL CHARCO A LA NORIA SE ATENDIERON 84 BACHES
21-AGO.-17	1	3.19	CAMINO A LA NORIA SE ATENDIERON 55 BACHES
23-AGO.-17	1	2.47	EL CHARCO A LA NORIA SE ATENDIERON 84 BACHES
	TOTAL	83.28	

BITACORA DE OBRA

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON BACHEO
 EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S. A. DE C.V.
 No. DE CONTRATO 056/2017

FECHA	CUAD.	MEZCLA	TRAMO
		M3	
15-MAY-17	2	7	SOTO KM. 19 SOTO KM. 19 SE ATENDIERON 124 BACHES
15-MAY-17	1	4	SOTO KM. 19 SE ATENDIERON 74 BACHES
20-MAY-17	1	4	LOC. SOTO KM 0+000 A ENTRONQUE SE ATENDIERON 86 BACHES
22-MAY-17	1	4	RAMAL DEL CHARCO A SOTO RAMAL DEL SOTO SE ATENDIERON 86 BACHES
03-JUN-17	1	4	COLONIA SOTO SE ATENDIERON 84 BACHES
05-JUN-17	1	4	ENTRONQUE KM 14 EL CHARCO-SOTO SE ATENDIERON 84 BACHES
06-JUN-17	1	4	CAMINO SOTO-LA NORIA SE ATENDIERON 102 BACHES
07-JUN-17	1	4	CAMINO ENTRONQUE KM 7 SOTO SE ATENDIERON 84 BACHES
08-JUN-17	2	8	KM. 0+000 AL 7.00 SOTO KM. 0+000 AL 7.00 SOTO SE ATENDIERON 132 BACHES
07-JUL-17	1	0.52	CAMINO RURAL ORTIZ-PALG BLANCO Y TRILLO SE ATENDIERON 6 BACHES
12-JUL-17	2	8	EL SAUZ CAMINO A CALABACILLAS SE ATENDIERON 80 BACHES
31-JUL-17	1	4	CAMINO A PUNTA DE AGUA ENTRE CARRETERA JUAREZ Y P. DE AGUA SE ATENDIERON 36 BACHES
01-AGO-17	1	4	CAMINO DEL TORREON A CALABACILLAS SE ATENDIERON 48 BACHES
02-AGO-17	1	4	CAMINO AL FARO SE ATENDIERON 37 BACHES
03-AGO-17	1	5	EL SAUZ SE ATENDIERON 61 BACHES
07-AGO-17	1	4	CAMINO A CALABACILLAS SE ATENDIERON 51 BACHES
08-AGO-17	1	3	CARRETERA A CALABACILLAS SE ATENDIERON 59 BACHES
17-AGO-17	1	4	CAMINO DEL CHARCO A LA NORIA SE ATENDIERON 84 BACHES
21-AGO-17	1	3.19	CAMINO A LA NORIA SE ATENDIERON 55 BACHES
23-AGO-17	1	2.47	EL CHARCO A LA NORIA SE ATENDIERON 54 BACHES
TOTAL		83.28	



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20244

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 8 Mayo 17

CANTIDAD	CONCEPTO
#. 105345 4m ³	mezcla Asfáltica
ED-63768 3m ³	mezcla Asf
7m ³	mezcla Asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20245

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 19/05/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345 4m ³	Mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20246

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 20/05/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345 4m ³	Mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20247

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 22/05/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345 4m ³	Mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 23248

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 03/06/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4m3 Mezcla Asfaltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 23249

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 05/06/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4m3 Mezcla Asfaltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 23250

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 06/06/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4m3 Mezcla Asfaltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 23251

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 07/06/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4m3 Mezcla Asfaltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20252

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 02/06/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4 m ³ Mezcla Asfáltica
ED-63568	4 m ³ MEZCLA ASF.
	8 m ³ MEZCLA ASF.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20253

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 07/07/17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	0.62 m ³ Mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20254

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 12 Julio 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	3 m ³ mezcla Asf.
ED-63768	3 m ³ mezcla Asf.
	6 m ³ mezcla Asf.

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20255

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MERP FECHA 31 de Julio 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4 m ³ mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20256

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 1 Agosto 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-05345	4m ³ mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20257

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 2 Agosto 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4m ³ mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20258

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 3 Agosto 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	5m ³ mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20259

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD MEPP FECHA 7 Agosto 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4m ³ mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20260

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD IVERP FECHA 8 Agosto 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	3m ³ mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20262

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD IVERP FECHA 21 Agosto

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	3.19 mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20261

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD IVERP FECHA 17 Agosto 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	4m ³ mezcla Asfáltica

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ



Chihuahua
AYUNTAMIENTO 2004-2007

VALE DE BACHEO

No. 20263

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD IVERP FECHA 22-Ago 17

CANTIDAD	CONCEPTO
CH-105345	247m ³ DE MEZCLA ASFALTICA

AUTORIZÓ

RECIBÍÓ

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
URBANA

REHABILITACIÓN DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHES

PERÍODO

10 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO
DE 2017

ESTIMACIÓN NO

1 TS1819

CONTRATACIÓN

056/2017

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA

FECHA	LOCALIZACIÓN CALLE	Nº DE BACHES	DIMENSION DE BACHE ÁREA	VOLUMEN
18-may-17	SOTO KM 15	77	115.84	4.00
	SOTO KM 16	47	54.57	3.00
	SUBTOTAL	124	170.41	7.00
19-may-17	SOTO KM 16	74	127.63	4.00
	SUBTOTAL	74	127.63	4.00
20-may-17	LDC SOTO KM 04000 A ENTRONQUE	85	166.88	4.00
	SUBTOTAL	85	166.88	4.00
22-may-17	RAMAL DEL CHARCO A SOTO	41	57.6	4.00
	SUBTOTAL	42	57.60	4.00
03-jun-17	COLONIA SOTO	84	106.96	4.00
	SUBTOTAL	84	106.96	4.00
05-jun-17	ENTRONQUE KM 14 EL CHARCO-SOTO	84	124.62	4.00
	SUBTOTAL	84	124.62	4.00
06-jun-17	CAMINO SOTO-LA NORIA	102	160.64	4.00
	SUBTOTAL	102	160.64	4.00
07-jun-17	CAMINO ENTRONQUE KM 7 SOTO	84	141.75	4.00
	SUBTOTAL	84	141.75	4.00
08-jun-17	KM 04000 AL 7.00	70	152.35	4.00
	KM 04000 AL 7.00	62	100.06	4.00
	SUBTOTAL	132	252.41	8.00
07-jul-17	CAMINO RURAL ORTE- PALO BLANCO Y TRILLO	6	1.4	0.62
	SUBTOTAL	6	1.40	0.62
12-jul-17	EL SAUC	39	90.95	3.00
	CAMINO A CALABACILLAS	43	85	3.00
	SUBTOTAL	82	175.95	6.00
31-jul-17	CAMINO A PUNTA DE AGUA ENTRE CARRETERA JUAREZ Y F. DE AGUA	35	147.91	4.00
	SUBTOTAL	35	147.91	4.00
01-ago-17	CAMINO DEL TORREON A CALABACILLAS	48	119.4	4.00
	SUBTOTAL	48	119.40	4.00
02-ago-17	CAMINO AL FARO	37	140.35	4.00
	SUBTOTAL	37	140.35	4.00
03-ago-17	EL SAUC	61	120.2	5.00
	SUBTOTAL	61	120.20	5.00
07-ago-17	CAMINO A CALABACILLAS	51	125.45	4.00
	SUBTOTAL	51	125.45	4.00
08-ago-17	CARRETERA A CALABACILLAS	56	107.15	5.00
	SUBTOTAL	56	107.15	5.00
17-ago-17	CAMINO DEL CHARCO A LA NORIA	84	87.26	4.00
	SUBTOTAL	84	87.26	4.00
21-ago-17	CAMINO A LA NORIA	55	55.43	3.15
	SUBTOTAL	55	55.43	3.15
23-ago-17	EL CHARCO A LA NORIA	84	36.53	2.47
	SUBTOTAL	84	36.53	2.47
GRAN TOTAL SUELTO		1414	1414.00	85.22

CONTABILISTA



ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ

POB SUPERVISIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO

COMUNIDAD

EL SAUZ


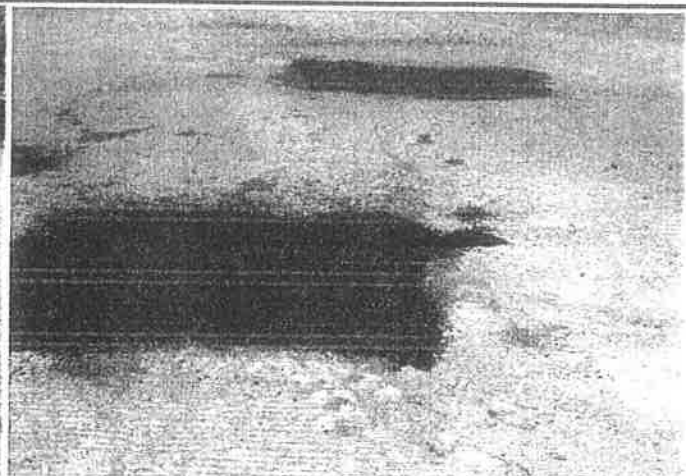
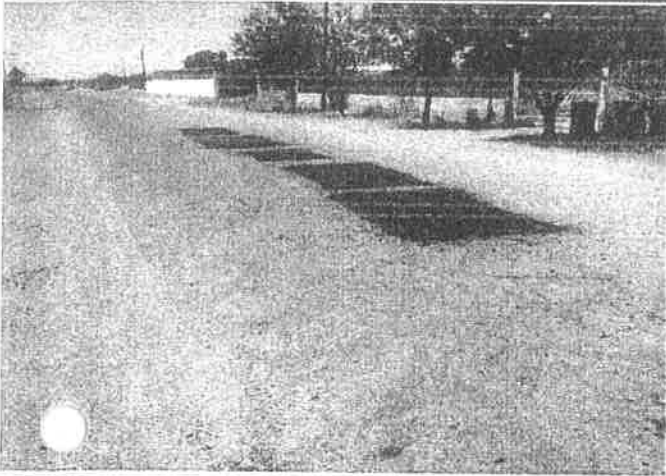


Handwritten signature and a large, stylized 'X' mark.

REPORTE FOTOGRAFICO

COMUNIDAD

EL FARO

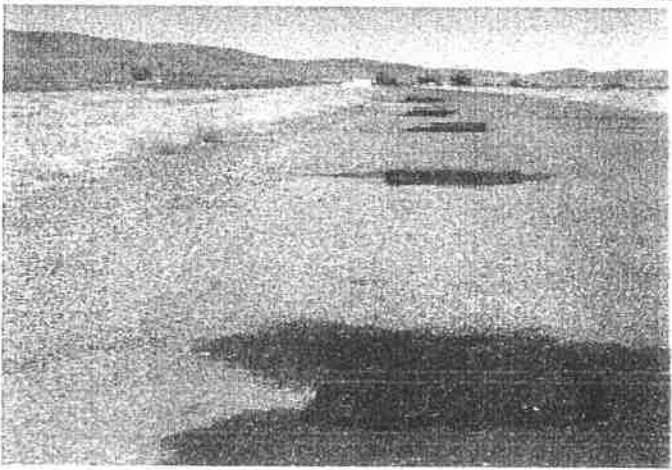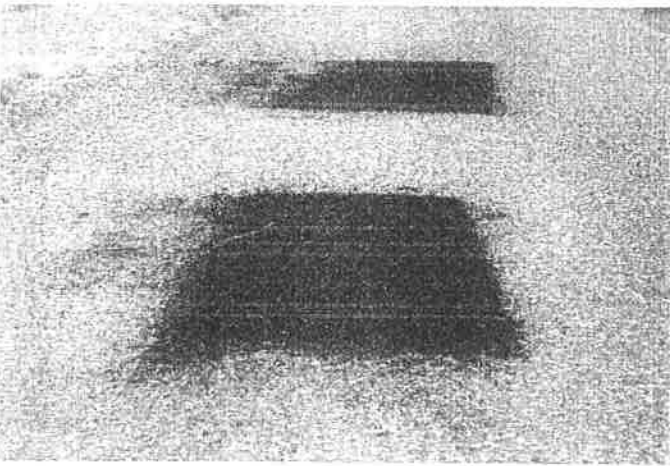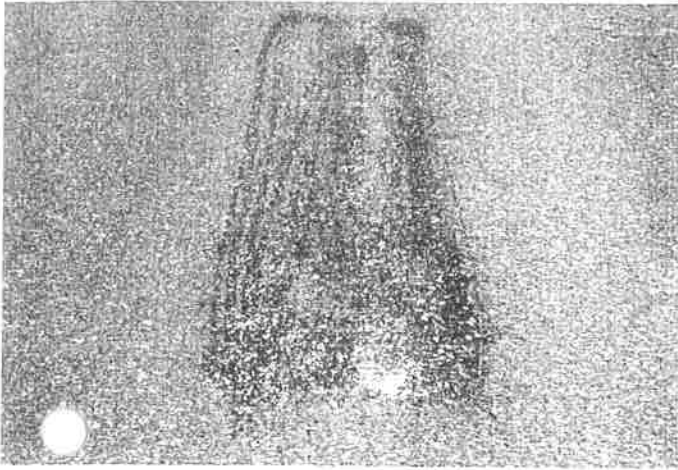


7/1/76

[Handwritten signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

COMUNIDAD

FRANCISCO Y MADERO

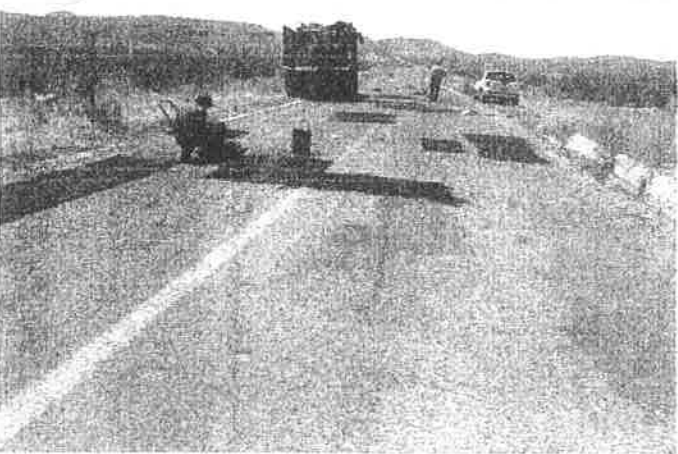



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

REPORTE FOTOGRAFICO

COMUNIDAD

PUNTA DE AGUA

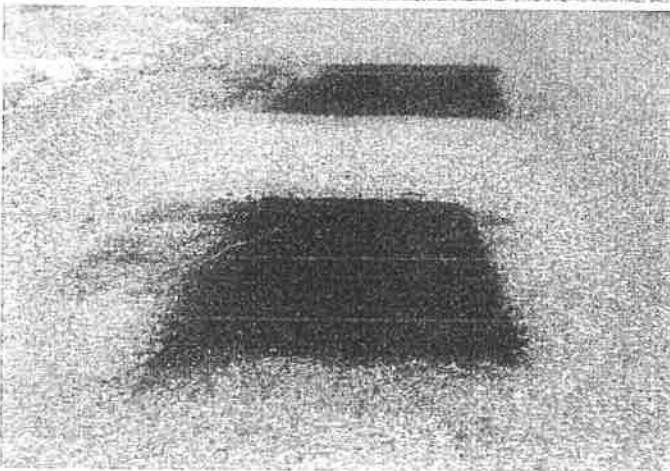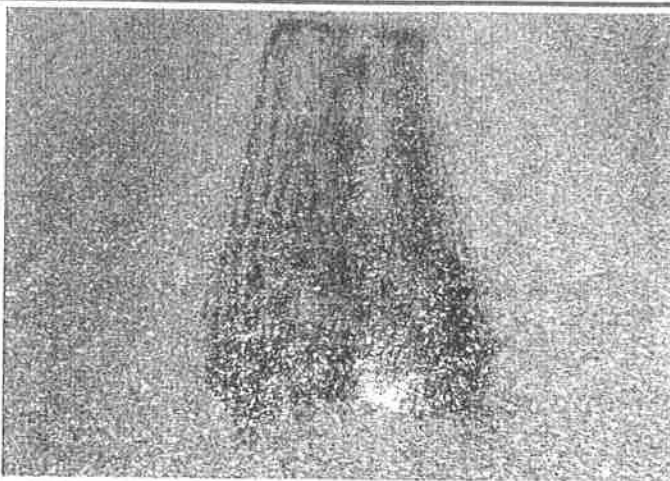



Handwritten signature or initials, possibly "JH" or "JL", written vertically.

Handwritten signature or initials, possibly "X" or "Y", written horizontally.

REPORTE FOTOGRAFICO

COMUNIDAD

LA NORIA


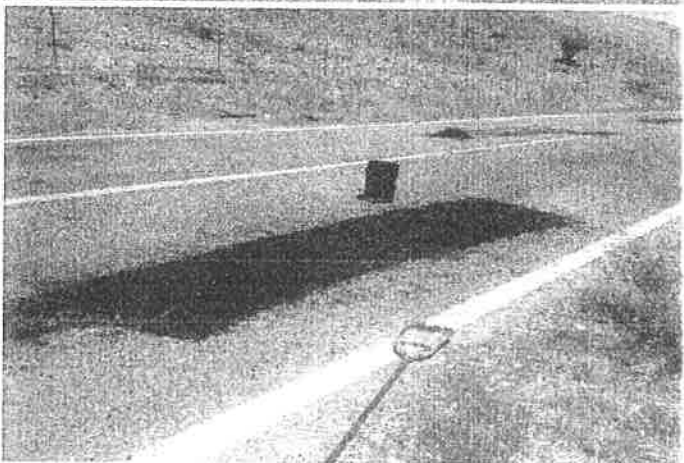
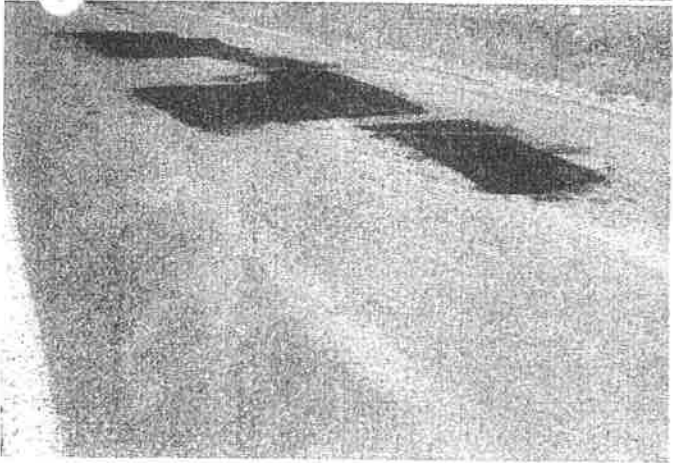


2

REPORTE FOTOGRAFICO

COMUNIDAD

CIENEGA DE ORTIZ

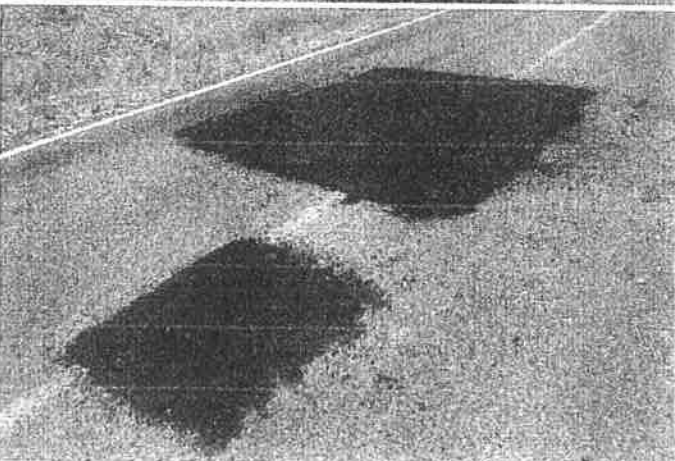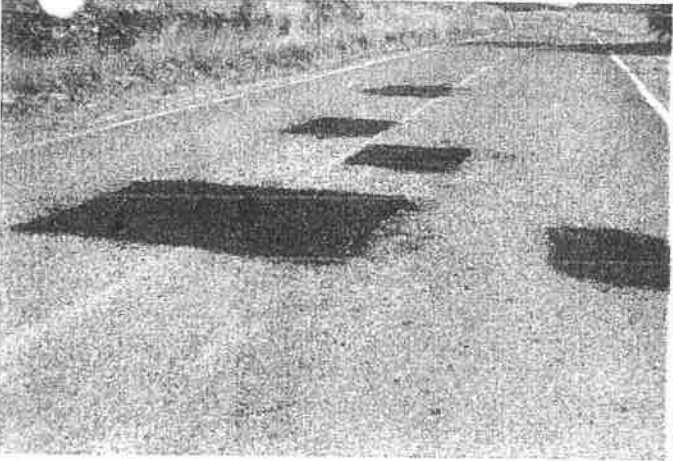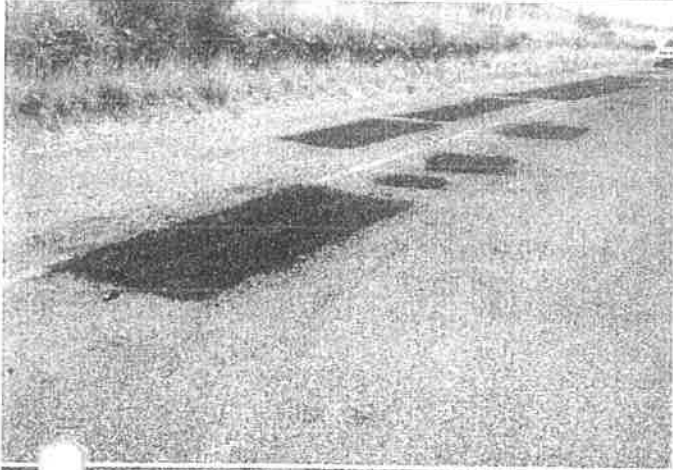


9/15

[Handwritten signature]

15 DE MAYO 2017


FOLIO 01

SE CARGAN LOS CAMIONES CON 4m³ Y OTRO CON 8m³ DE
MEZCLA ASFALTICA DE 3/4" PARA UTILIZARSE EN EL CAMINO DE
ACCESO A LOS CAMPOS EN EL CAMPESINATO DE COTE.
TAN EN LOS 14 EJES



16 DE MAYO 2017

SE CONTINUA EL TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE COTE EN LA SE
PARAN EL CILINDRO CON 4m³ DE MEZCLA ASFALTICA DE 3/4"
PARA CUBRIR 14 EJES



2. NAME -

Four (2)

5. CONTINUE THE TRACING OF EACH OF THE FIVE PAIRINGS BEGINS
IN THE FEET. THE DISTANCE BETWEEN THE FEET IS 1.5 M.
THE DISTANCE BETWEEN THE FEET IS 1.5 M.



二、附片 27

SE EN LA ENTRE DE 244 DE 1420 A 1270 SE CADA
1. LA DE LA CON 4.43 DE MEDULA EXTENSION DE 3/4 A 2/4
ROBE SE 1.45

13-2-2017


FOLIO CE

SE CONTINUA LA TRAZA DE BARRAS EN LAZOS DE 5-70
SE LLEVA A CABO LA TRAZA DE BARRAS EN LAZOS DE 5-70
SE LLEVA A CABO LA TRAZA DE BARRAS.





13-2-2017

SE CONTINUA LA TRAZA DE BARRAS EN LAZOS DE 5-70
SE LLEVA A CABO LA TRAZA DE BARRAS EN LAZOS DE 5-70
SE LLEVA A CABO LA TRAZA DE BARRAS EN LAZOS DE 5-70
SE LLEVA A CABO LA TRAZA DE BARRAS EN LAZOS DE 5-70



13




Estadística

FOLIO 24


SE TRABAJO EN EL EXAMEN EN CAMPO SOTC- JALISCO

PARALELO - 2000-01 LOS DATOS DE MEKLA Y = 34 PUNTOS
DEBIDAMENTE SE PUNTUO



SE TRABAJO EN

SE TRABAJO EN EL EXAMEN EN CAMPO ESTADÍSTICA KMF SOTC
DE PARALELO 2000-01 LOS DATOS DE MEKLA Y = 34 PUNTOS
DEBIDAMENTE SE PUNTUO




27/12

X

8-000 2017



FELIC OT

SE CONTINUA EL BACHEO EN LNI C-000 AL 7 EN DZ. 344000
CORRESPONDIENTE CON FIN P. 600000 (PA-00312) 132 BACHES



02-100 2017

SE TRABAJA EN EL BACHEO DEL CAMINO PORAL 02712-P. 400
BUNGO Y TALA, SE CHAPA 1 CAMION CON 62M³ DE MEZCLA
ASFALTICA DE BUNGO PARA COBRIR 6 BACHES Y REHABILITACIONES
DE CHAPETON




12 Mayo 2017

FOLIO 06


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE BARRIDO EN LAS LOCALIDADES.

PUENTES DE CERRILLO - AMEROS. SON EN EL DE MEDIO A PARTIR DE
DE 34 HRS. SE HAN DE BARRER EN SUO Y HAY QUE HACER
FALLA DEBIDA A LA LARGA



31 Mayo 2017

SE CONTINUA EL BARRIDO EN BARRIDO A PARTIR DE 34 HRS. EN
HAY QUE HACER A PARTIR DE 34 HRS. SE HAN DE BARRER




17/4

3. PROTECTOR



FOLIO 67

SE CONTINUA CON EL DISEÑO DE ANIMALES REALES DE CAJON EN
FORMA DE LINEA DE PUNTA ESTILO DE 3/4" PARA CADA
DE 3/4"



4. PROTECTOR

SE CONTINUA CON EL DISEÑO DE ANIMALES REALES DE CAJON EN
FORMA DE LINEA DE PUNTA ESTILO DE 3/4" PARA CADA
DE 3/4"



3-10-74



FO-C-EE

SE T-1-14 EN R-1-14 EN A-1-14 EN S-1-14 EN
S-1-14 EN S-1-14 EN S-1-14 EN S-1-14 EN
S-1-14 EN S-1-14 EN



7-1-14

SE SE-1-14 EN S-1-14 EN A-1-14 EN S-1-14 EN
S-1-14 EN S-1-14 EN S-1-14 EN S-1-14 EN
S-1-14 EN S-1-14 EN



21- MAR 2017



FOLIO 10


SE CONTINUA CON EL TRABAJO DE BARRIDO EN CARRIL A LA
NOCHA SE CARGA 1 CUBIERTA CON 3 $1\frac{1}{4}$ m³ DE MUELLA
RESISTENCIA DE $3\frac{1}{4}$ " PARA ATENDER 55 BICHES



23- MAR 2017

SE TRABAJA EN EL CARGO DE MUELLA CON BARRIDO DE CARGA
1 CUBIERTA CON 2 $1\frac{1}{4}$ m³ DE MUELLA RESISTENCIA DE $3\frac{1}{4}$ " DE
CUBIERTA 54 BICHES





CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.

R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.


LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

OBRA	BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD	PLANTA	MERP
LOCALIZACION	CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA RECIBO	19-may.-17
		FECHA INFORME	22-may.-17

MUESTRA	MEZCLA ASFALTICA 3/4"
DESCRIPCION DEL MATERIAL	ROCA CALIZA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO	TRITURACION TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO	EN LA PLANTA DE ASFALTOS
UBICACION DEL BANCO DEL PETREO	MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA

CLASIFICACION PETROGRAFICA			
CARPETA ASFALTICA			
COMPOSICION GRANULOMETRICA	MALLAS	% PASA	PROYECTO
	1/2"	100	
	3/4"	100	
	1/2"	97	
	3/8"	91	
	1/4"	78	
	Núm. 4	68	
	Num. 10	36	
	Núm. 20	26	
	Núm. 40	18	
	Núm. 60	12	
	Núm. 100	9	
	Núm. 200	5	
RET. MALLA			%
P V SECO SUELTO Kg/m ³			
ABSORCION %			
DENSIDAD			
DESGASTE %			
PART. ALARGADAS %			
PART. LAJEADAS %			
EQUIV ARENA %			
CONTRACCION LINEAL %			

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO

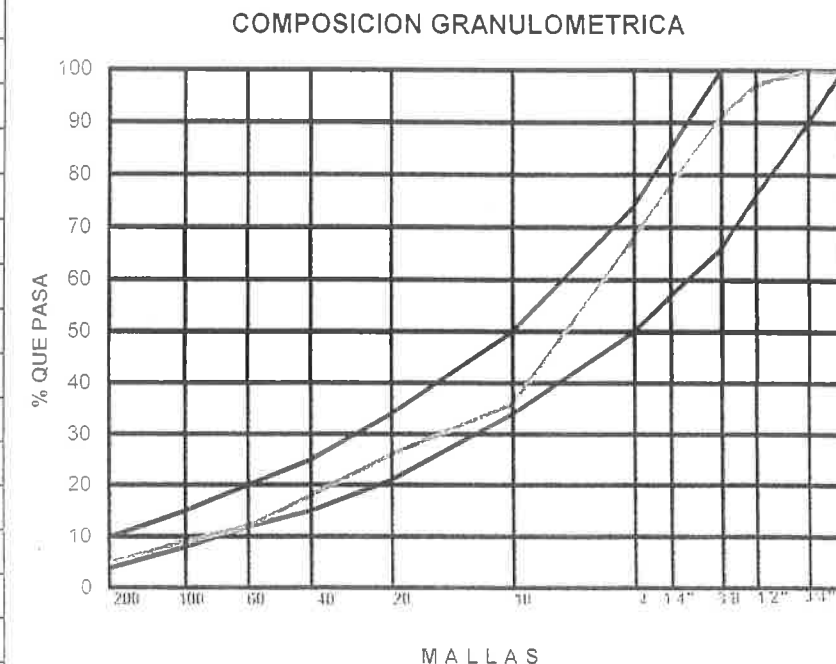

CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA		ESPECIFICACIONES
TEMP. DE ELABORACION, °C		
PESO VOLUMETRICO, Kg/cm ³	2318	
ESTABILIDAD, kg.	1114	817.5
FLUJO, mm	30.2	2 - 3.5
VACIOS, %	4.2	DE 3 A 5
VAM, %	15.9	16 MIN
CONT. CEM.ASF/PETREO, %	5.2	5.2
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD/ C.A.	
AFINIDAD	BUENA SIN ADITIVO	

CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO	
TIPO	AC-30
PENETRACION, 25°C. 100 gr 5 seg	
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL seg	

OBSERVACIONE
LA MEZCLA ASFALTICA ANALIZADA SATISFACE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO	
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON	

