

CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.
CRA850326UN6
Domicilio Fiscal
LAZARO DE BAIGORRI 422
Col. SAN FELIPE 31240
CHIHUAHUA Chihuahua México
Tel. 6144265906

Factura No: 377
FOLIO FISCAL (UUID):
CCE2B862-9700-4A4D-86CE-1AED886DB72C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000040535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404147641
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-09-11T14:55:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-09-11T14:50:33

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: MINA 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo

Fecha de Expedición: 11 septiembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ESTIMACION No. 1 (UNO) (UNICA) TRABAJOS CONSISTENTES EN " CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS , GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA " SEGUN CONTRATO NUM. 070/2017 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 427,800.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 128,340.00 SUBTOTAL \$ 299,460.00 I.V.A. \$ 47,913.60 TOTAL \$ 347,373.60 MENOS DEDUCCIONES: C.M.I.C. 0.2% \$ 855.60 DIF 0.2% \$ 855.60 SUMA \$ 1,711.20 NETO A RECIBIR \$ 345,662.40	\$ 299,460.00	\$ 299,460.00

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 299,460.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 47,913.60
TOTAL: \$ 347,373.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AUox9ISG0d72BVRSMUj2Kd8DGXANKBkbs+VeyOw2FMkQMcbQzPzOEvh1w1qXzwcH236/1VJBAMhcZxfco3ZRVLM0Scm1VTeUKqbjKtzb6nQ8IPdQTbnAI7OkZW+Z4RO5zSkB4J2fZmpM2AAJR6k3YsUd9rqW6OuoNjdB+ObJBqgr9M
Oyor3kl5wXvzcf1tECJoUmyrYdvCh2WWNKJG6A38kUyMGPd3PVWK4XNpMnc4dGfJG/SuXGKwTecuUO9ufxNphGhneZa8IfwFmBpOaGoY9kQyqgTkWSd0SQX/SAbtpO+93NFAnTG7RZxHP5LvMDd6F3Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

shsKXUp2C+Vv5uLrINJXar7VcVnqHGBJOx4D6z20CkaguAQTZE50FG0Lcn2DaxwKf+WemvWQ2KFNDf+HqSbtpwaJ7TZSOWrTeF6kjmUxTPau9IRzZXIKUSy8E+PFI0Ulg+SZ5LHWfRVGnm9H6cohrjuyLu05XQ0XNDaaaeXMC0JE
mc8HUAJVwz4LDwA41NkpU7RDBSJSdDwH0JhrRlyLpa5i3e8/x8CbMqjsCdV9UZR2zc7PUw7NwKf6Z65Kvey83VIFlagWfC0767RNSYNHjvaYx6W4vB3OUtvX6x3q6ZY4s5ctbmrnzl6kQx0Gw0+EA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CCE2B862-9700-4A4D-86CE-1AED886DB72C|2017-09-11T14:55:35|AUox9ISG0d72BVRSMUj2Kd8DGXANKBkbs+VeyOw2FMkQMcbQzPzOEvh1w1qXzwcH236/1VJBAMhcZxfco3ZRVLM0Scm1VTeUKqbjKtzb6nQ8IPdQTbnAI7OkZW+Z4RO5zSkB4J2fZmpM2AAJR6k3YsUd9rqW6OuoNjdB+ObJBqgr9M
Oyor3kl5wXvzcf1tECJoUmyrYdvCh2WWNKJG6A38kUyMGPd3PVWK4XNpMnc4dGfJG/SuXGKwTecuUO9ufxNphGhneZa8IfwFmBpOaGoY9kQyqgTkWSd0SQX/SAbtpO+93NFAnTG7RZxHP5LvMDd6F3Q==|000010000
00405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
  LugarExpedicion="CHIHUAHUA, Chihuahua" metodoDePago="02" tipoDeComprobante="ingreso" total="347373.60" Moneda="MXN" subTotal="299460.00"
  certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNDc2NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBFI
  noCertificado="00001000000404147641" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
  sello="AUox9I5G0d72BVRSMUrJ2KdBDGXANKBkbs+VeyOw2FMkQMcbQzPzOEvh1wv1qXzwcH236/1VjBAMhcZxffcO3ZRVLM0Scrn1VTelKqbjKitzb6nQ8iPdQTBnAI7OkZW+Z4RC
  fecha="2017-09-11T14:50:33" folio="377" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor nombre="CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V." rfc="CRA850326UN6">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31240" pais="México" estado="Chihuahua" municipio="CHIHUAHUA" colonia="SAN FELIPE" noExterior="422" calle="LAZARO DE
    BAIGORRI" />
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE CHIHUAHUA" rfc="MCI651010V22">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="31000" pais="MEXICO" estado="CHIHUAHUA" municipio="CHIHUAHUA" colonia="COL.CENTRO" noExterior="408" calle="MINA"
    localidad="CHIHUAHUA" />
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="299460.00" valorUnitario="299460.00" descripcion="ESTIMACION No. 1 (UNO) (UNICA) TRABAJOS CONSISTENTES EN " CALAFATEO DE JUNTAS
    CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA " SEGUN CONTRATO NUM. 070/2017 ALCANCE DE
    LA ESTIMACION $ 427,800.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 128,340.00 SUBTOTAL $ 299,460.00 I.V.A. $ 47,913.60 TOTAL $ 347,373.60 MENOS DEDUCCIONES:
    C.M.I.C. 0.2% $ 855.60 DIF 0.2% $ 855.60 SUMA $ 1,711.20 NETO A RECIBIR $ 345,662.40" unidad="NO APLICA" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="47913.60">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="47913.60" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      selloSAT="shsKXUrp2C+VV5uLRINJXar7VcVnqHGBJOx4Dtiz20C/kaguAQ TZFEs0/FG0LCn2Daxrwkf+WemyWQ2KFNDfxHgSpbpwA7TZSOWrTqF6bkjMtJxTPau9IRs/
      noCertificadoSAT="00001000000405535779"
      selloCFD="AUox9I5G0d72BVRSMUrJ2KdBDGXANKBkbs+VeyOw2FMkQMcbQzPzOEvh1wv1qXzwcH236/1VjBAMhcZxffcO3ZRVLM0Scrn1VTelKqbjKitzb6nQ8iPdQTB
      FechaTimbrado="2017-09-11T14:55:35" UUID="CCE2B862-9700-4A4D-86CE-1AED886DB72C"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>


```

Handwritten signature and initials, including a large 'C' and a stylized 'R'.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRA850326UN6	CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CCE2B862-9700-4A4D-86CE-1AED886DB72C	2017-09-11T14:50:33	2017-09-11T14:55:35	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$347,373.60	ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICA E INFRAESTRUCTURA		HOJA DE RESUMEN FINAL No. 1	
PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL 2017		CONTRATO No.- 070/2017	
OBRA: CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.		ESTIMACION No. 1 (UNICA) PERIODO : 22 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V. R.F.C. CRA-850326-UN6		IMPORTE ESTIMADO \$ 427,800.00 IMPORTE ACUMULADO \$427,800.00	
CONCEPTO		IMPORTE	
PAVIMENTOS		OBSERVACIONES	
OBRA: CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.		\$ 427,800.00	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 427,800.00	
DESCUENTOS:			
0.2% C.M.I.C.		\$ 855.60	
0.2% D.I.F.		\$ 855.60	
SUMA DESCUENTOS		\$ 1,711.20	
RESUMEN:			
SUMA ESTA ESTIMACION		\$ 427,800.00	
AMORTIZACION ANTICIPO		\$ 128,340.00	
DESCUENTOS		\$ 1,711.20	
SUB - TOTAL		\$ 297,748.80	
I.V.A.		\$ 47,913.80	
SALDO NETO PARA PAGO		\$ 345,662.40	
CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.			
FORMULO:		ACEPTO:	
RESIDENTE DE OBRA C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO		EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.	
REVISOR JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL		Vo.Bo. SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	
AUTORIZADOR ING. ANTONIO GOMEZ BALLENA		AUTORIZADO ARQ. CARLOS AGUIAR GARCIA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA		CONTRATO No. 070/2017		ESTIMACION No. 1(UNICA) HOJA No. 1 DE 1 PERIODO : 22 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO		OBRA: CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.			
DEPTO. MANTENIMIENTO VIAL		CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V.			
CONCEPTO		CANTIDADES			
INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR
				DE ESTA ESTIMACION	
					PRECIO UNITARIO (\$)
					IMPORTE (\$)
1	CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO PAVIMENTOS CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACIONES DE 0.80 A 1.00 CMS DE ANCHO Y 1.60 CMS DE PROFUNDIDAD A BASE DE ASFALTO AC-20 APLICADO EN CALIENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA CON AIRE A PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	9,300.00	9,300.00	0.00
				9,300.00	46.00
					427,800.00
UMAS				\$ 427,800.00	
OTAS					

IMPORTA ESTA HOJA: CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.
FECHA: Lunes, 04 de septiembre de 2017
ESTIMO: C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO
Residente: C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

ACEPTO: Contralista
CONSTRUCTORA RIO AROS S.A. DE C.V.

Vo.Bo. Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

REVISO: Jefe Depto. ING. AMADO ABELARDO GOMEZ BALLONA

CALAFATEO

GENERADORES

CALAFATEO CALLE 4a Y AV. INDEPENDENCIA
ENTRE AV. PASEO SIMON BOLIVAR Y AV. 20 DE NOVIEMBRE
TODO EL ANCHO DE CALLE


NO.	CALLE	TRAMO	ML
0	CALLE 4a	CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO MINA	1220.00
1	CALLE 4a	CALLE FRANCISCO MINA Y CALLE IGNACIO RAMIREZ	2560.00
2	CALLE 4a	CALLE IGNACION RAMIREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	2230.00
3	AV. INDEPENDENCIA	CALLE PRIV. RAMIREZ Y CALLE FRANCISCO MINA	1100.00
4	AV. INDEPENDENCIA	CALLE FRANCISCO MINA Y CALLE IRIGOYEN	2190.00

TOTAL 9300.00




CROQUIS

CALLE 4A ENTRE AV. PASEO SIMON BOLIVAR Y AV. 20 DE NOVIEMBRE

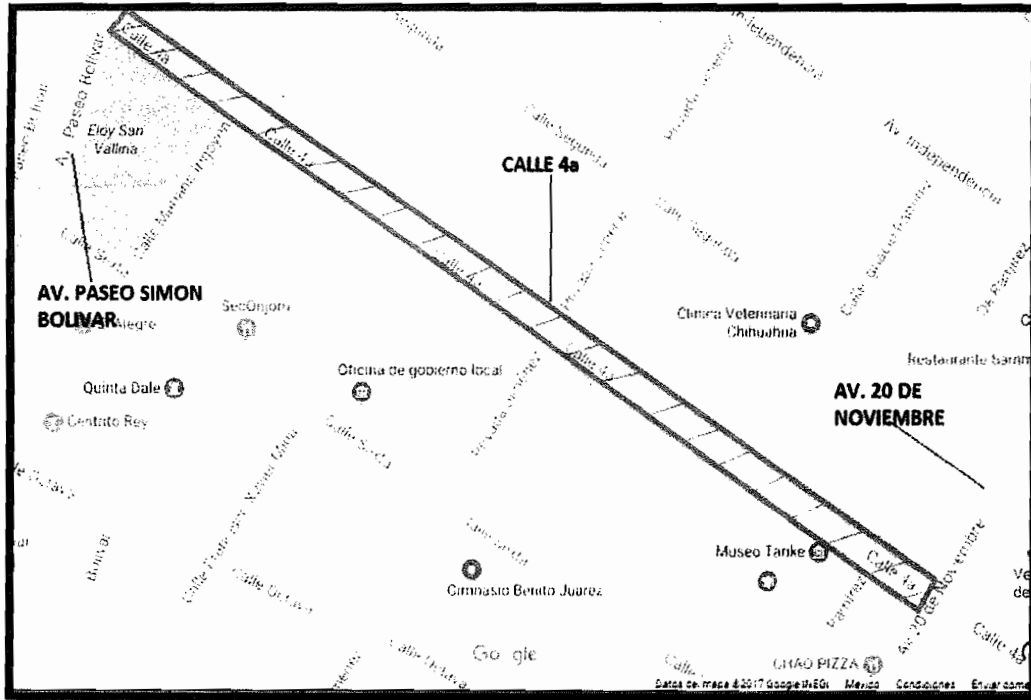


AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO MINA Y CALLE IRIGOYEN

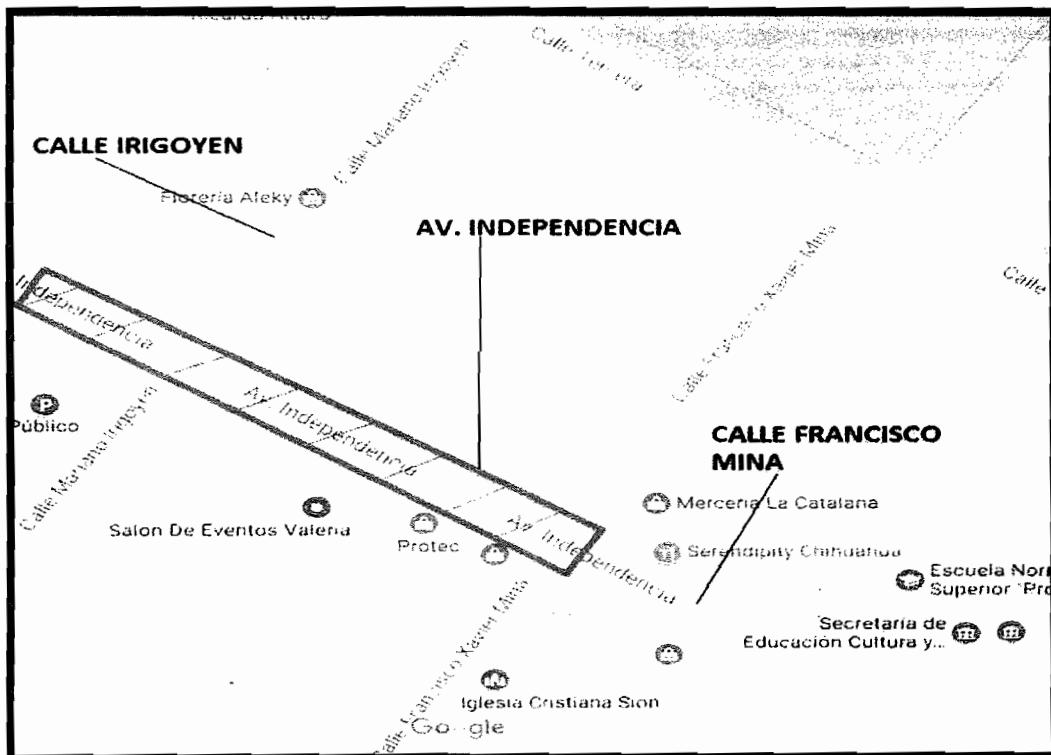


[Handwritten signature]


OBRA: 'CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.'

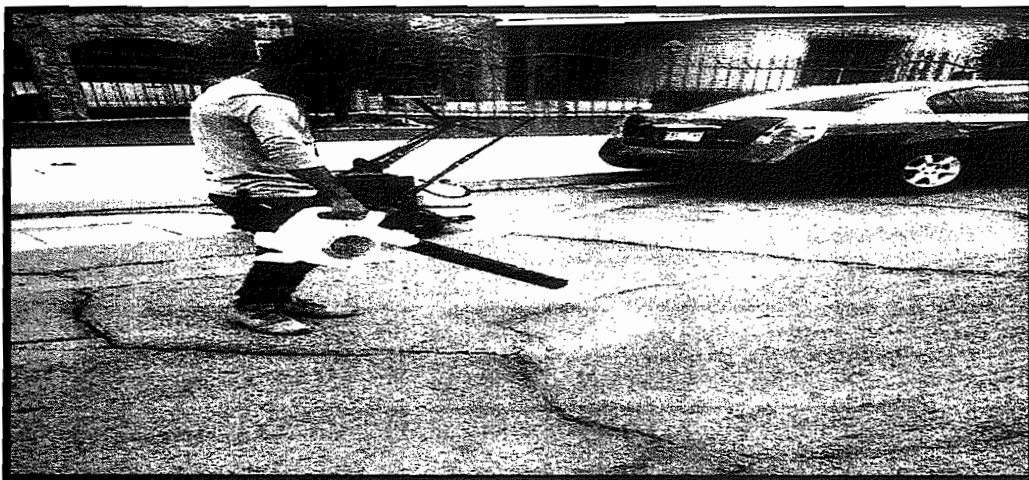

LIMPIEZA CALLE 4A

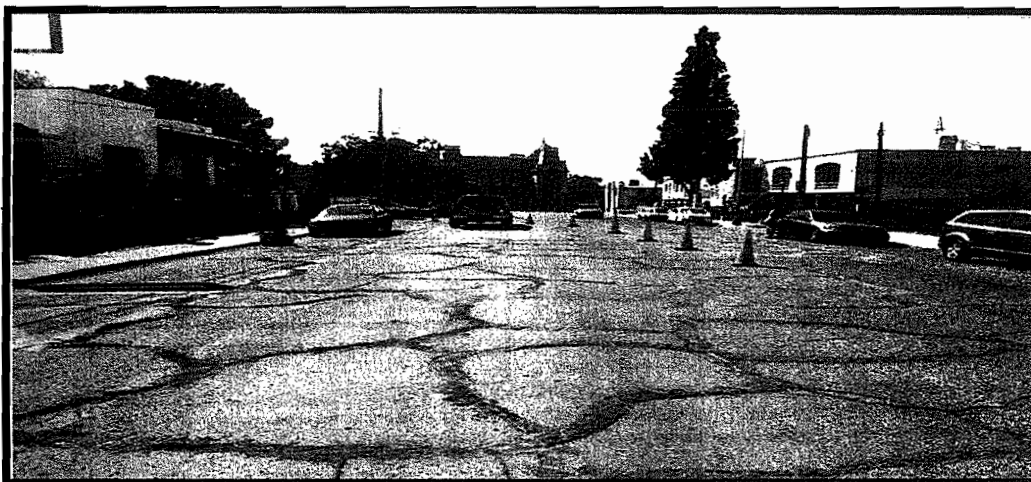

CALAFATEO CON ARENA CALLE 4 ENTRE PASEO SIMON BOLIVAR Y AV. 20 DE NOVIEMBRE

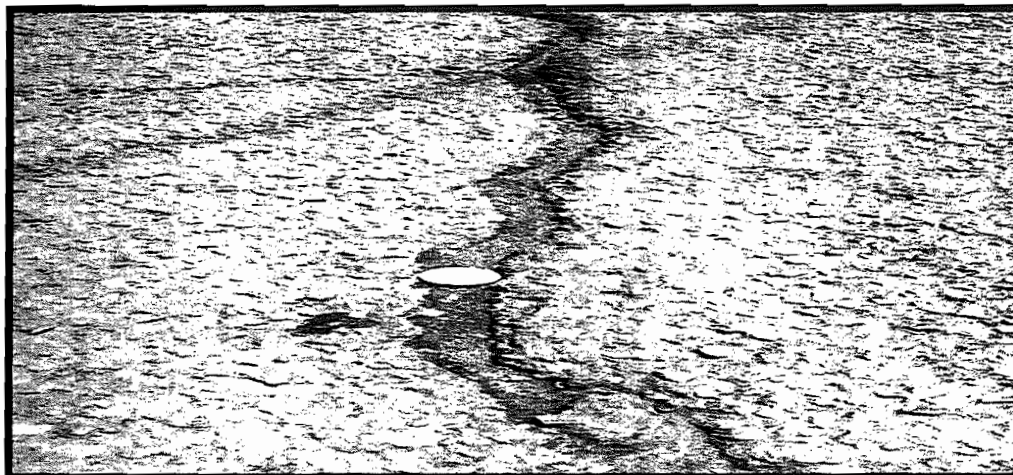

ANCHO DE GRIETAS TRABAJADAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**OBRA: "CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA."**



**CALAFATEO EN CALLE 4A ENTRE PASEO SIMON BOLIVAR Y AV. 20 DE
NOVIEMBRE**



CALLE 4A ANTES DE CALAFATEAR



CALLE 4A DESPUES DE CALAFATEAR

[Handwritten signature and scribbles]

OBRA: 'CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.'



CALAFATEO AV. INDEPENDENCIA




[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

OBRA: 'CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS Y REPARACION EN VIALIDADES Y CALLES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.'



CALAFATEO AV. INDEPENDENCIA

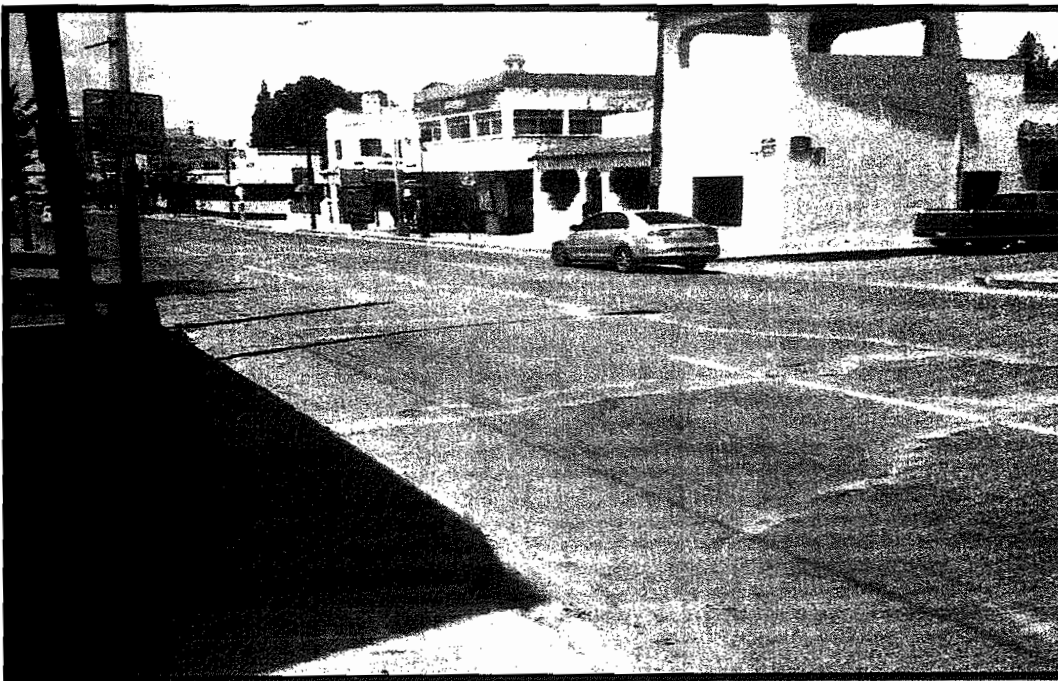


CALAFATEO AV. INDEPENDENCIA

[Handwritten signature]

01

22 de Julio 17

- Se ingresan los trabajos correspondientes al contrato 570/17 relativos al
 calpafos de tuberías de distribución, con el fin de que se realice el
 alta en el sistema de distribución, en la zona de la calle Francisco
 Alvarado y Calle de la Cruz. Se ingresan los datos en el sistema de
 datos de tuberías correspondientes a los trabajos realizados.



L

23 de Julio 17

- Se continúan con los trabajos de calpafos en la zona de la calle
 Francisco Alvarado y Calle de la Cruz. Se ingresan los datos en el sistema de
 datos de tuberías correspondientes a los trabajos realizados.




L

02


24-Agosto-17

- Se continúan con los trabajos de calpates en la calle 4^a entre
calle Francisco Milla y Calle Ignacio Romero.




25-Agosto-17

- Se continúan los trabajos de calpates en calle 4^a entre calle
Ignacio Romero y Av. 20 de Noviembre.



26-Agosto-17


- Se trabajó en calle 4^a entre calle Ignacio Romero y Av. 20 de
Noviembre hasta las 16:00 h.



83


29 Agosto - 17

- Se iniciaron los trabajos de alineación en el trazo de Av. Independencia entre calle Ruiz-Rosales y Calle Francisco Múgica.



30 Agosto - 17

- Se continuaron los trabajos en Av. Independencia entre calle Francisco Múgica y Calle Arce.



31 Agosto - 17

- Se terminaron los trabajos en Av. Independencia y con esto se terminó el 100% los trabajos contratados.



