



Factura

SERIE:

FOLIO: 296

FECHA: 26/10/2017 08:32:38

Documento Válido

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L DE C.V

GIC130712697

RAMON DOMINGUEZ No. 104 DEPORTISTAS,

CHIHUAHUA 31125

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio: CALLE:MINA No. 408

Teléfono:

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: COL: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000

País: MEXICO

Lugar de Expedición: RAMON DOMINGUEZ 104 , DEPORTISTAS, 31125, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No 1 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD, NUMERO DE CONTRATO No 150/2017. MONTO DE LA ESTIMACION \$997,147.99 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$299,144.40 SUMA \$698,003.59 IVA \$111,680.57 TOTAL \$809,684.16 DESCUENTOS 0.2% D.I.F (AL MILLAR) \$1,994.30 0.2% C.M.I.C (AL MILLAR) \$1,994.30 SUMA \$3,988.60 NETO A RECIBIR \$805,695.56	698,003.59	698,003.59

Importe con letra
OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.
Método de Pago
02 Cheque nominativo
Número de Cuenta:

SUBTOTAL:	698,003.59
I.V.A.:	111,680.57
TOTAL:	809,684.16

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301341784

Folio fiscal: 3EDB00B3-7589-42B5-9C47-FD071E0CB26D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2017 - 09:38:10

Sello digital del CFDI

2nhqo86KCM8LJ918dBIanKYC4cE22jK2OKdNtH8gNjTj4WzoY0uCRuMS3dtRshLgHlvJpryVQ1lw1oDU2h16BU
Djz9BK1ieRXgTV25issryLctgcyytTAxm880WBOQ/MFZztqx73Wu010NnsTYruwMxNIpG7gGY672EoEB0oLBo=

Sello del SAT

DUvInCgi+0Wys4ub28mbecDgbwmmDoC/9RO0E/HqNxH92pds/GHhLQY5vc+DibQUupnu9y1Re2x1Tty
MchSUGq6jKqohGEdQ31N+NeN8u0H+fjWchj67S1E2gKUMwbp9dt84oUsJmvdBEju1BOH961Me5APscs3
w/UPavtyw135jm2BFla+FdlqFxnYwrbJyT6JRYznuKICuyc5T17cyruuxf6frukvmo2RnvCvd56o6ik/R
6dHMKpMew5Qj3YMFm4GmlJl03AsCV1qN57d5Jd/Rabne13HefW0JHV4c552oKvD5sToXor:2PxDI
2xHEOKK7UIGXviudeowFFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.0]3EPB00B3-7589-42B5-9C47-FD071E0CB26D|2017-10-26T09:38:10|2nhqo86KCM8LJ918dBIanKYC4cE22jK2OKdNtH8gNjTj4WzoY0uCRuMS3dtRshLgHlvJpryVQ1lw1oDU2h16BU
Djz9BK1ieRXgTV25issryLctgcyytTAxm880WBOQ/MFZztqx73Wu010NnsTYruwMxNIpG7gGY672EoEB0oLBo=10000
1000000404486074|]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

33

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or a signature.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIC130712697	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L DE C.V	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3EDB00B3-7589-42B5-9C47-FD071E0CB26D	2017-10-26T08:32:38	2017-10-26T09:38:10	MAS0810247C0

Handwritten signatures and marks, including a large circular stamp with a signature and a smaller mark below it.

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$809,684.16	ingreso	Vigente

Imprimir



Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(<https://www.gob.mx/privacidad>)
[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(<https://www.gob.mx/terminos>)
[Marco Jurídico](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)
[Portal de Obligaciones de Transparencia](http://portaltransparencia.gob.mx)
(<http://portaltransparencia.gob.mx>)
[Sistema Infomex](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
(<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)
[INAI](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
(<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>)
[Mapa de sitio](https://www.gob.mx/sitemap)
(<https://www.gob.mx/sitemap>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)
[English](https://www.gob.mx/en/index)
(<https://www.gob.mx/en/index>)
[Temas](https://www.gob.mx/temas)
(<https://www.gob.mx/temas>)
[Reformas](http://reformas.gob.mx) (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado.
Suscríbete.



Síguenos en




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		CONTRATO No. 150/2017 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017			Km. A Km.		ORIGEN:			
		OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD			EST. No. 1		HOJA No.		1 DE 1	
		CONTRATISTA: GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.			PERIODO: DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017.					
O B R A		C O N C E P T O			C A N T I D A D E S				RECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
(ESTACION Y DESCRIPCION)		INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
1			PINTURA TRAFICO DE HULE CLORADO, GUIONES, LINEAS CONTINUAS SOBRE VIALIDADES	ML	63,016.80	48,449.90	0	48,449.90	\$ 8.15	\$ 394,866.69
2			PINTURA TERMOPLASTICA GUIONES EN CARRILES LINEAS CONTINUAS SOBRE VIALIDADES	ML	12,253.70	12253.70	0	12253.70	\$ 45.00	\$ 551,416.50
3			PINTURA TRAFICO HULE CLORADO SOBRE PASOS PEATONES.	M2	108.00	108.00	0	108.00	\$ 100.60	\$ 10,864.80
4			COLOCACION DE VIALETAS SOBRE VIALIDADES	PZS	3,500.00	1,000.00	0	1,000.00	\$ 40.00	\$ 40,000.00
										\$ 997,147.99




N O T A S		(NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 997,147.99 M.N.)	
		LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.	ACEPTO:
		FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2017	Contratista
		ESTIMO: ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDO	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.
		REVISO:	Vo.Bo.
		Jefe Depto. ING. VICTOR DOMESTICO DE LEON	Subdirector: ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE HIDALGO DE YUCATAN A ESCUDERO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	236	X5	1180
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		
			TOTAL DE ML	1180

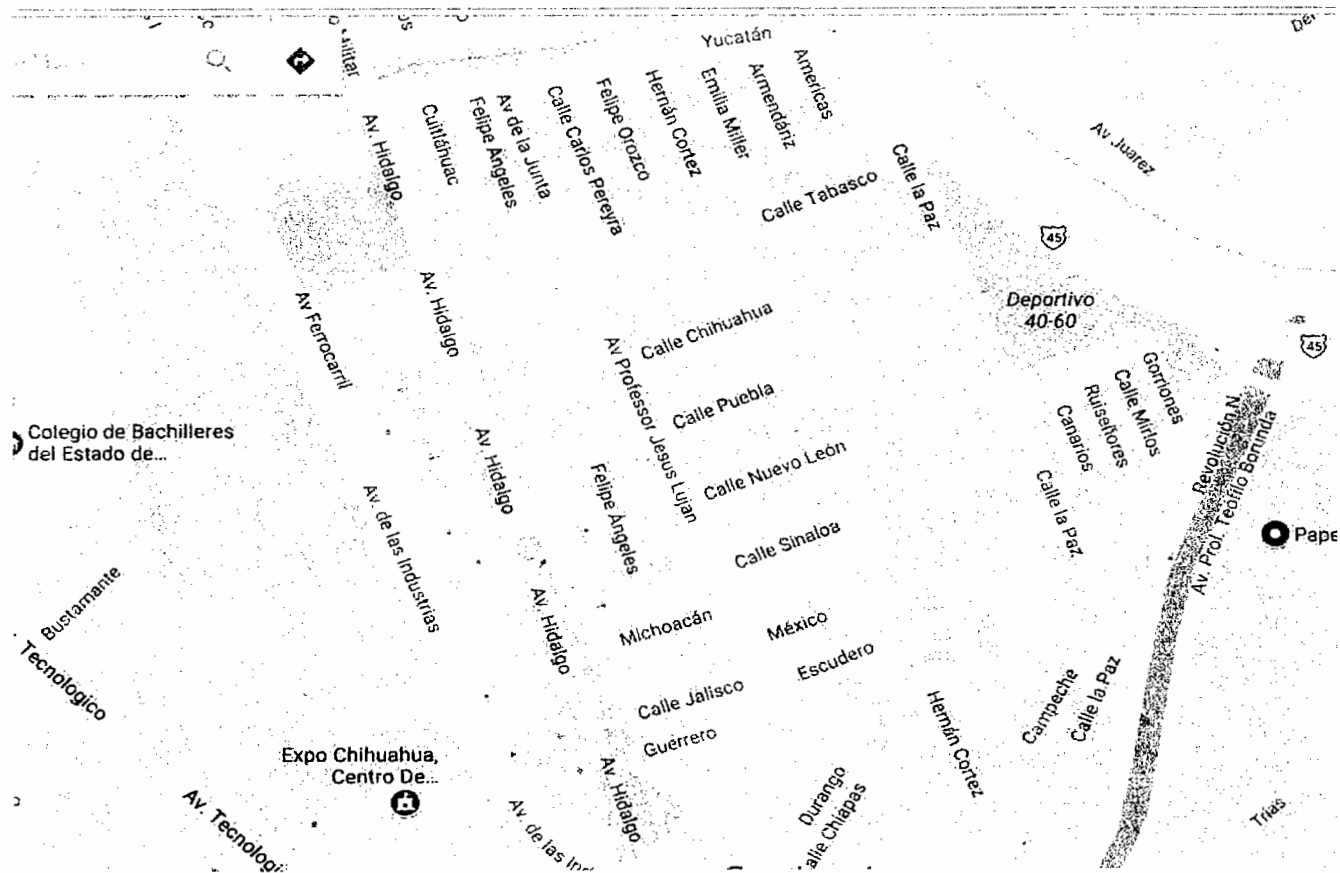

2

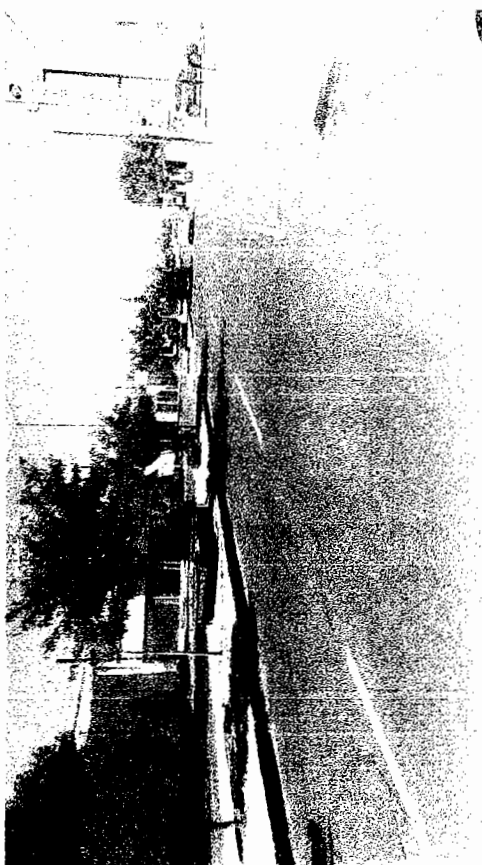


CALLE HIDALGO

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

[illegible]


AV. LA JUNTA

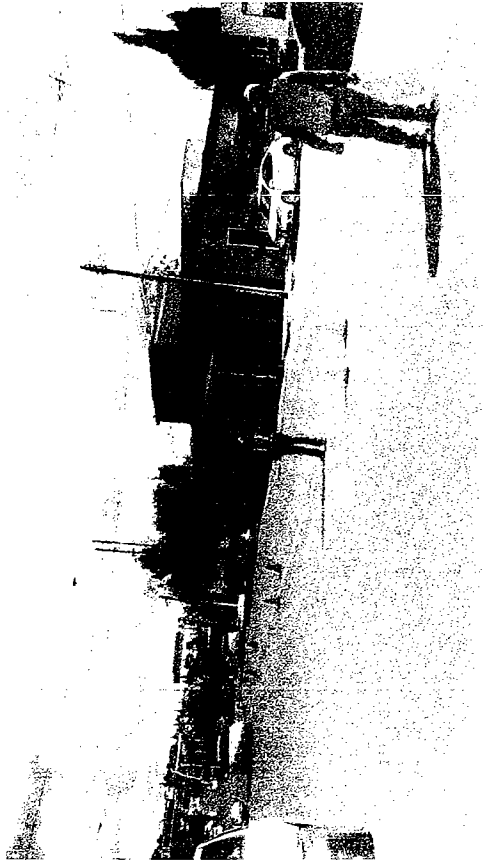



Q R

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AVENIDA AGUSTIN MELGAR DE AV. VALLARTA A AV. TECNOLOGICO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	208	X5	1040
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	105		105
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1572		1572
			TOTAL DE ML	2717

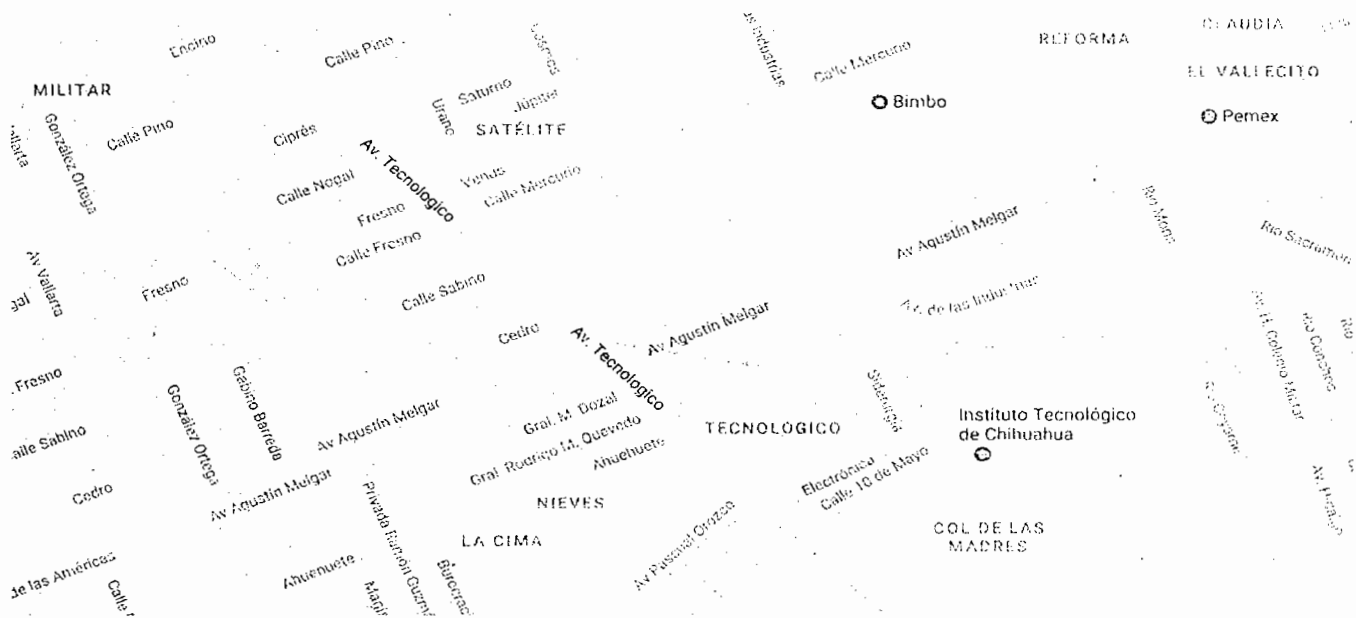

CALLE AGUSTIN MELGAR

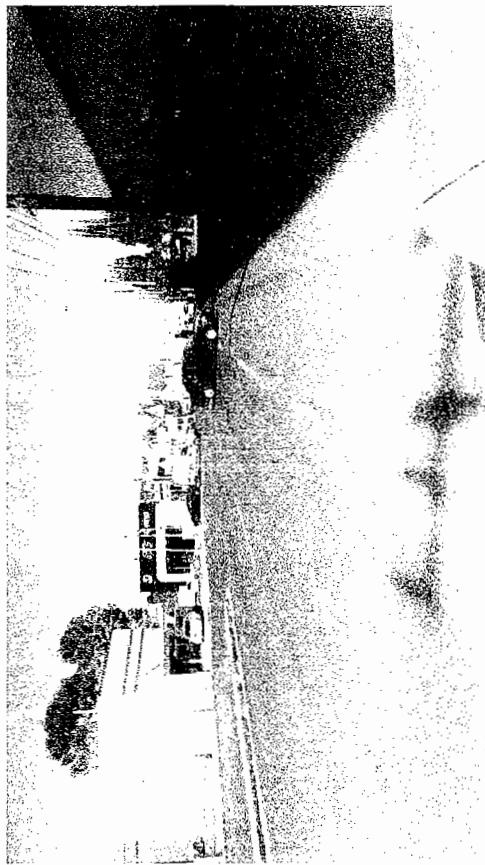

Q R

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.


PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE ESCUDERO DE AV. UNIVERSIDAD Y AV. LA JUNTA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	167	X5	835
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	219		219
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	844		844
			TOTAL DE ML	1898



Handwritten signature and initials.

CALLE ESCUDERO

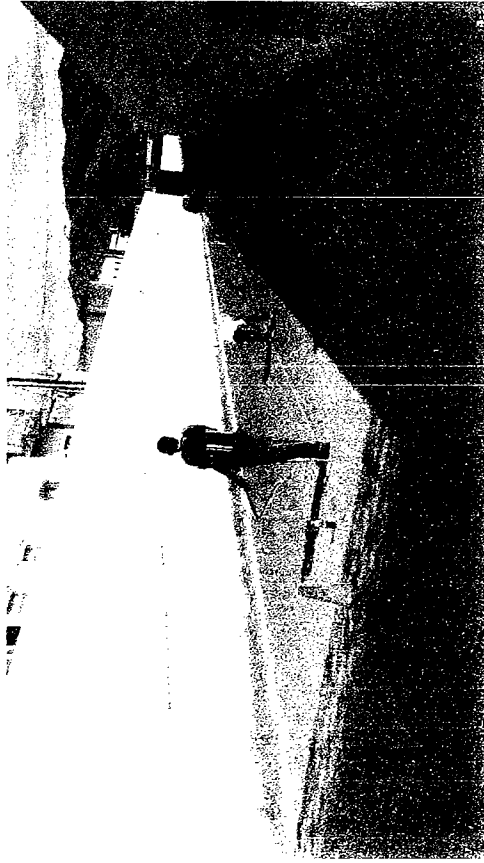


Q R

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO




CALLE	CALLE 25 DE DIVISION DEL NORTE A TEOFILO BORUNDA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	237	X5	1185
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	242		242
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
			TOTAL DE ML	1427

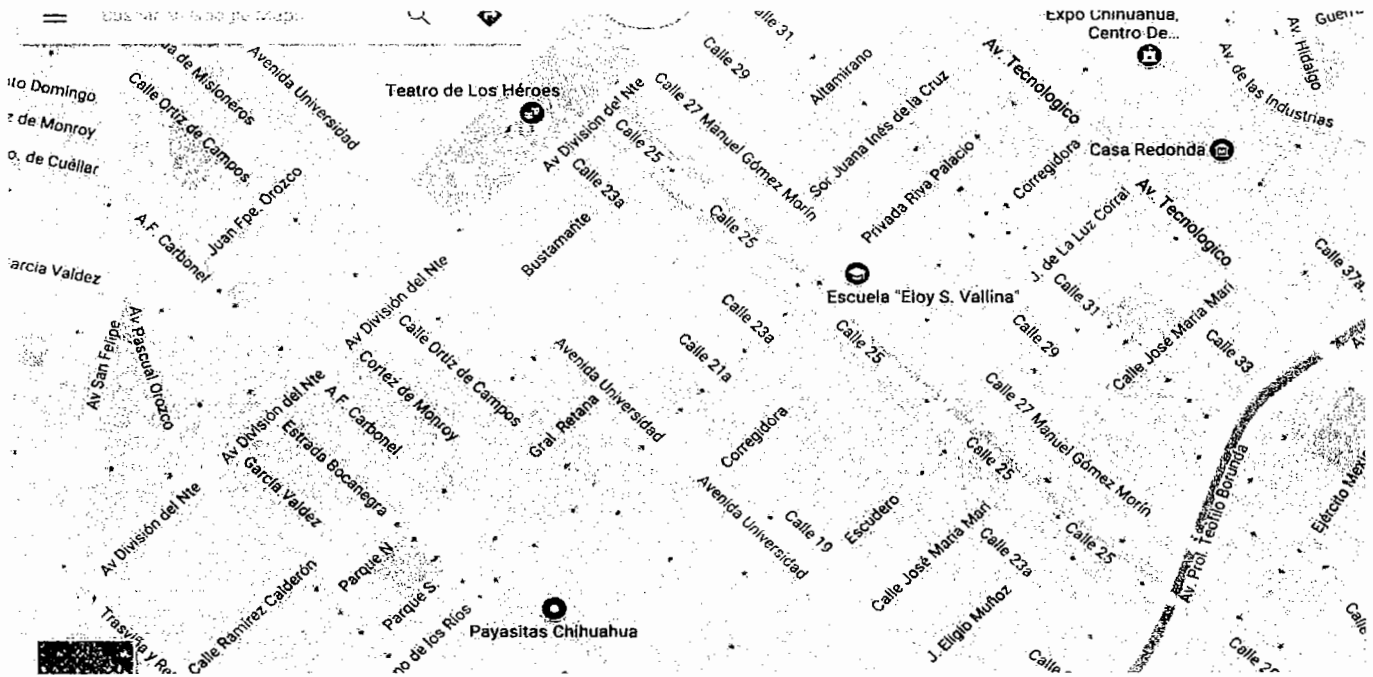

1

Q


CALLE 25

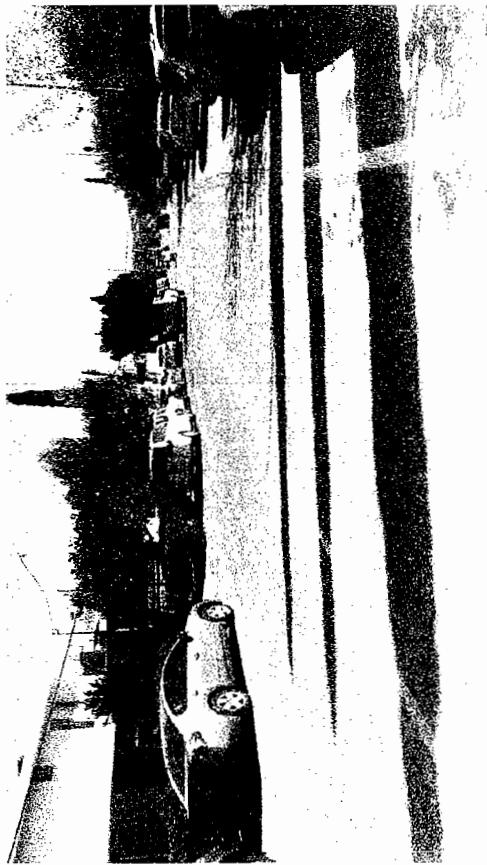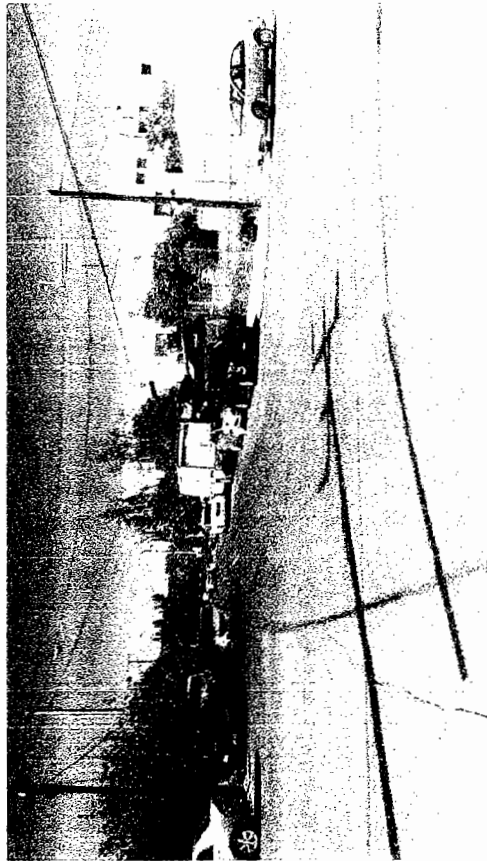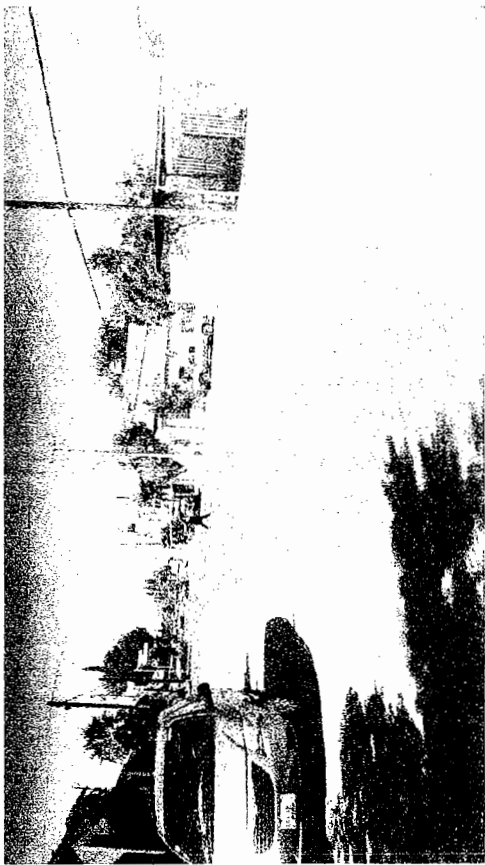



Q R

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. PASCUAL OROZCO DE AV. TECNOLOGICO A UNIVERSIDAD			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	179	X5	895
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	278		278
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1031		1031
			TOTAL DE ML	2204

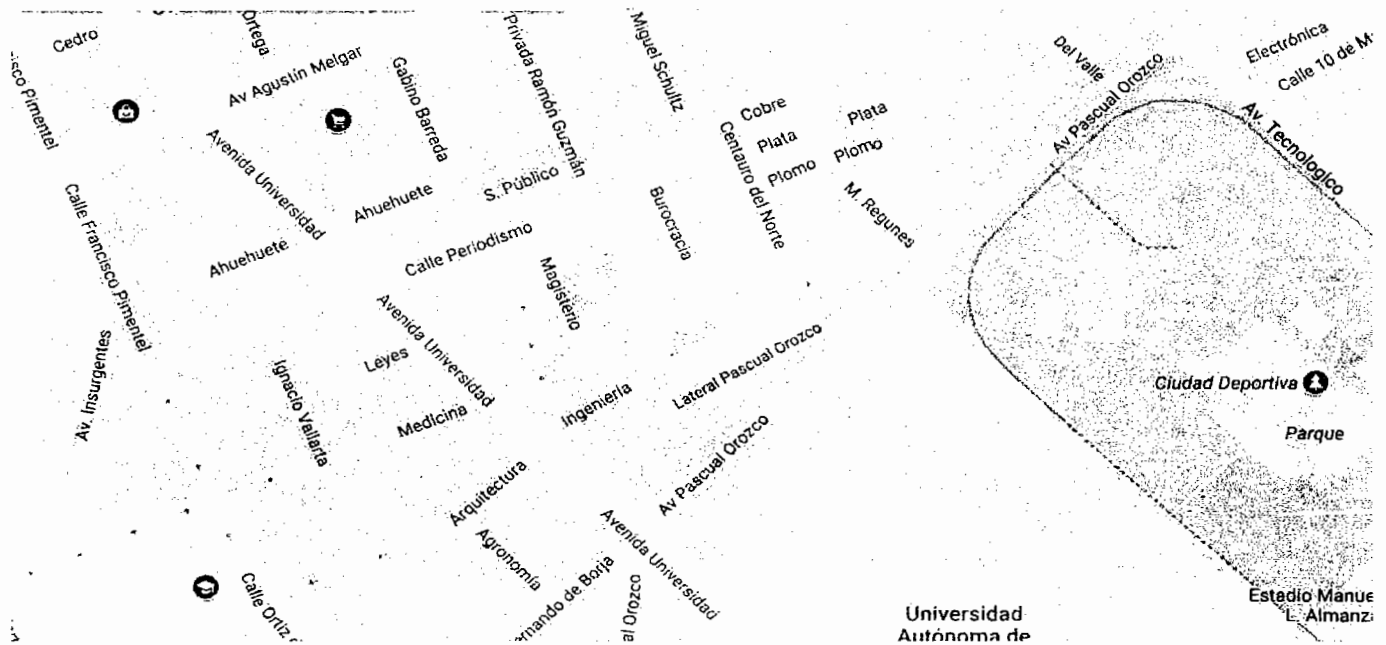

AV. PASCUAL OROZCO

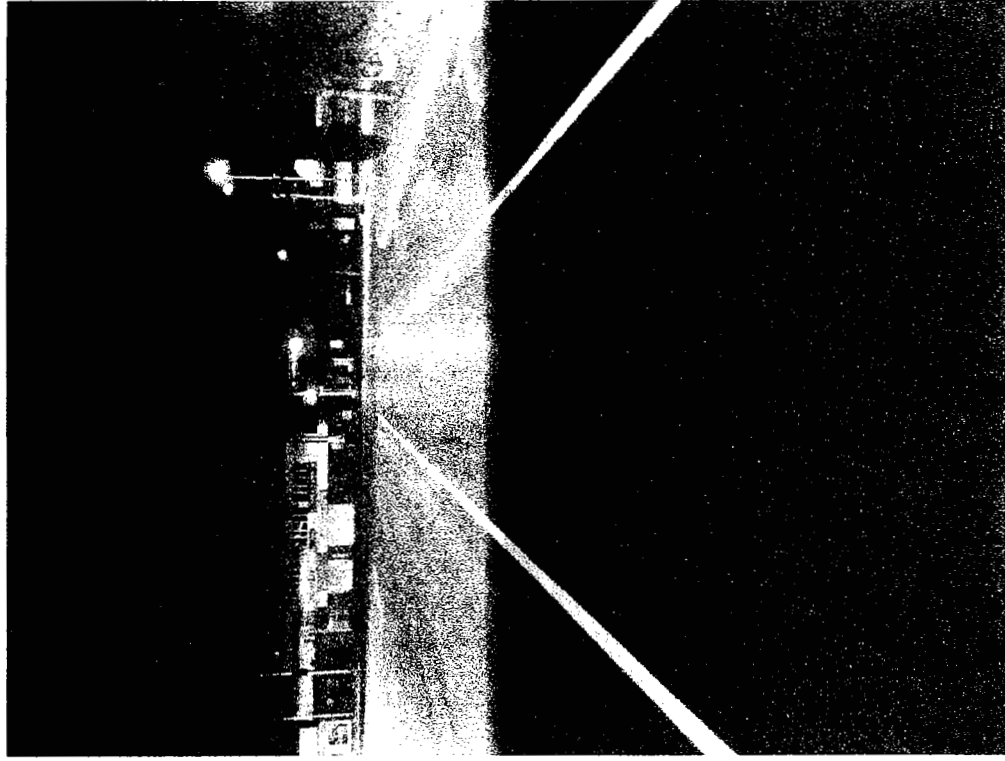


④ 1

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.



PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE 21 DE TEOFILO BORUNDA A DIVISION DEL NORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	152	X7	1064
LINEA CONTINUA BLANCA	ML			0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1021.4		1021.4
			TOTAL DE ML	2085.4

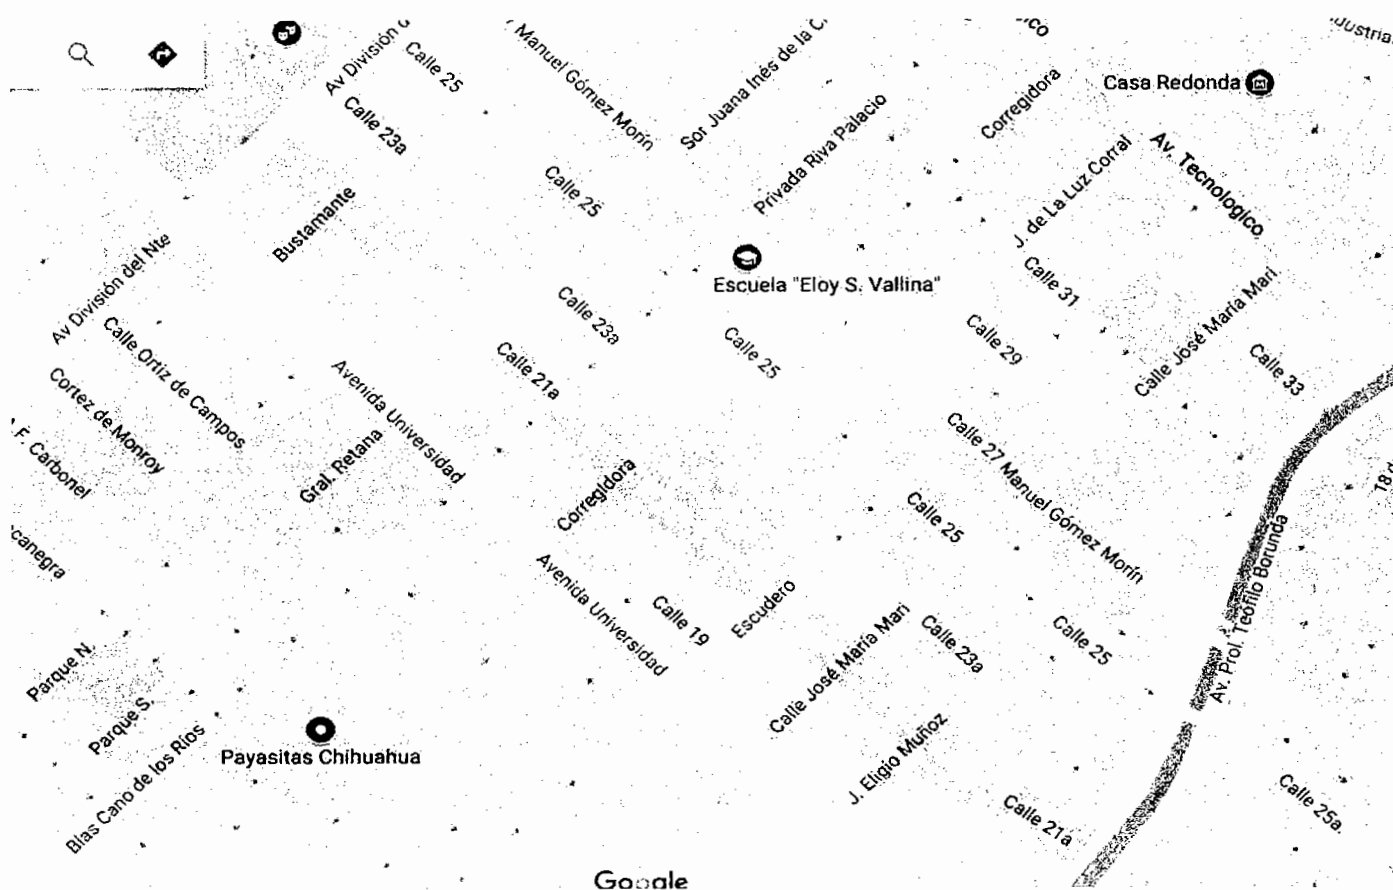

2

[Handwritten signature]

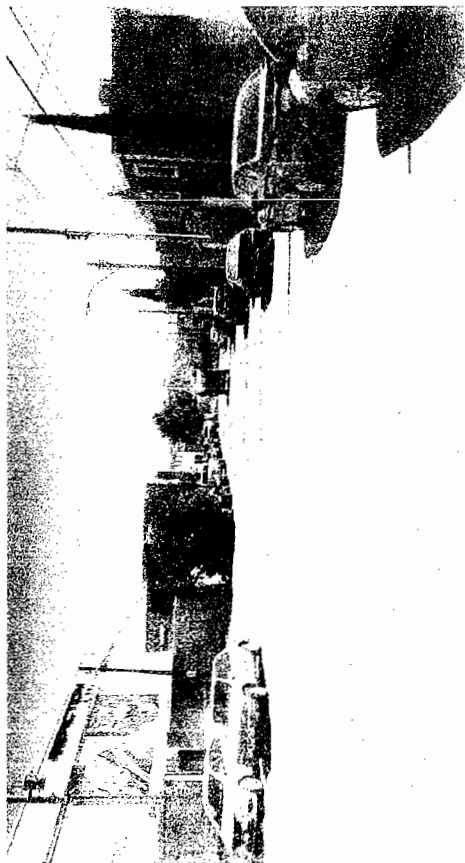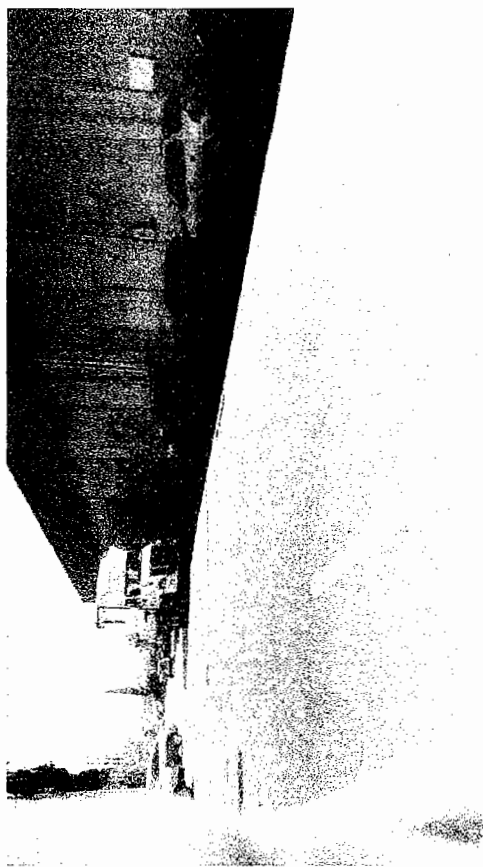


CALLE 21






[Handwritten signature]

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE RIVAPALACIO DE AV, COLON A AV. UNIVERSIDAD			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	198	X5	990
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	78		78
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
			TOTAL DE ML	1068

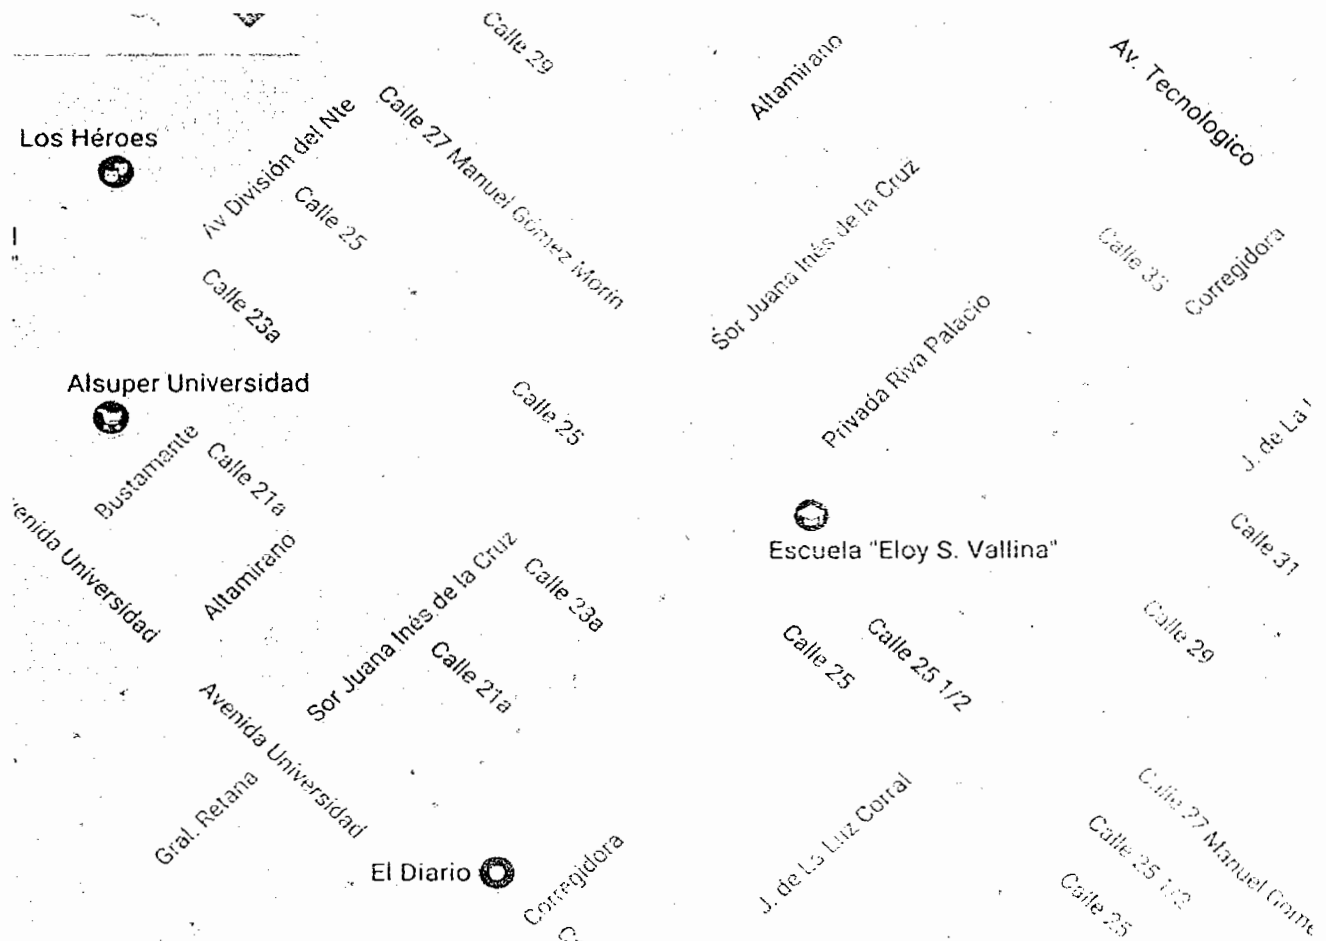

CALLE RIVAPALACIO

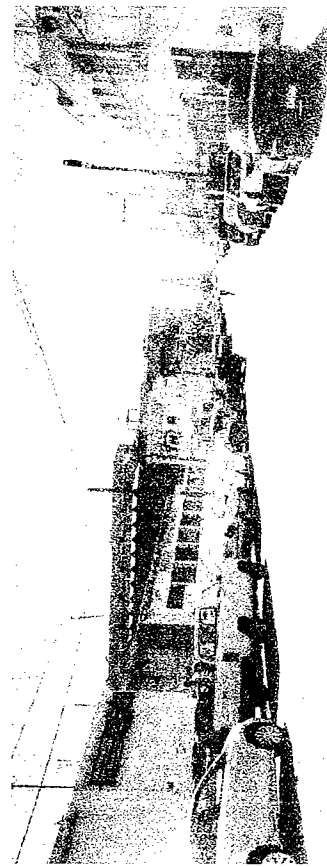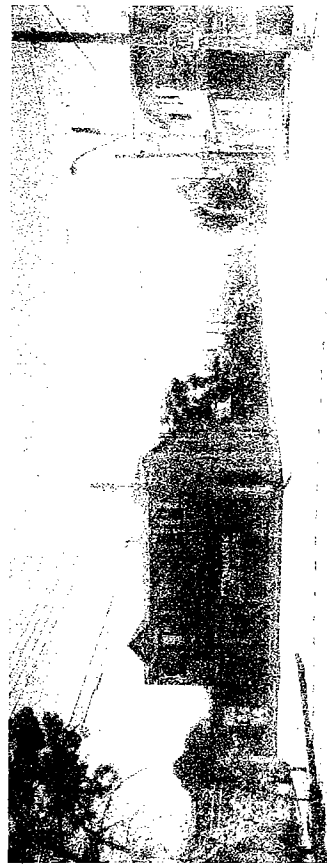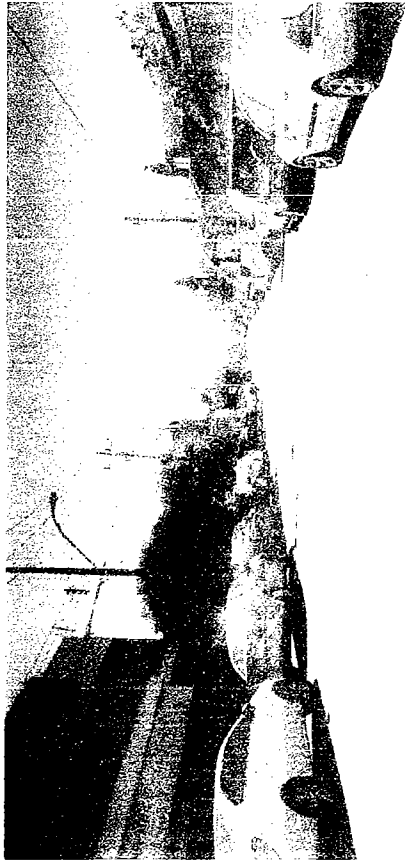

Handwritten signature and initials.


GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. INDUSTRIAS DE TEOFILO BORUNDA A GUILLERMO PRIETO LUJAN			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	170	X5	850
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	118		118
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	4266		4266
VIALETAS	PZS	506		
			TOTAL DE ML	5234



PINTURA TERMOPLASTICA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	1773	X5	8865
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	2086.7		2086.7
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	10951.7

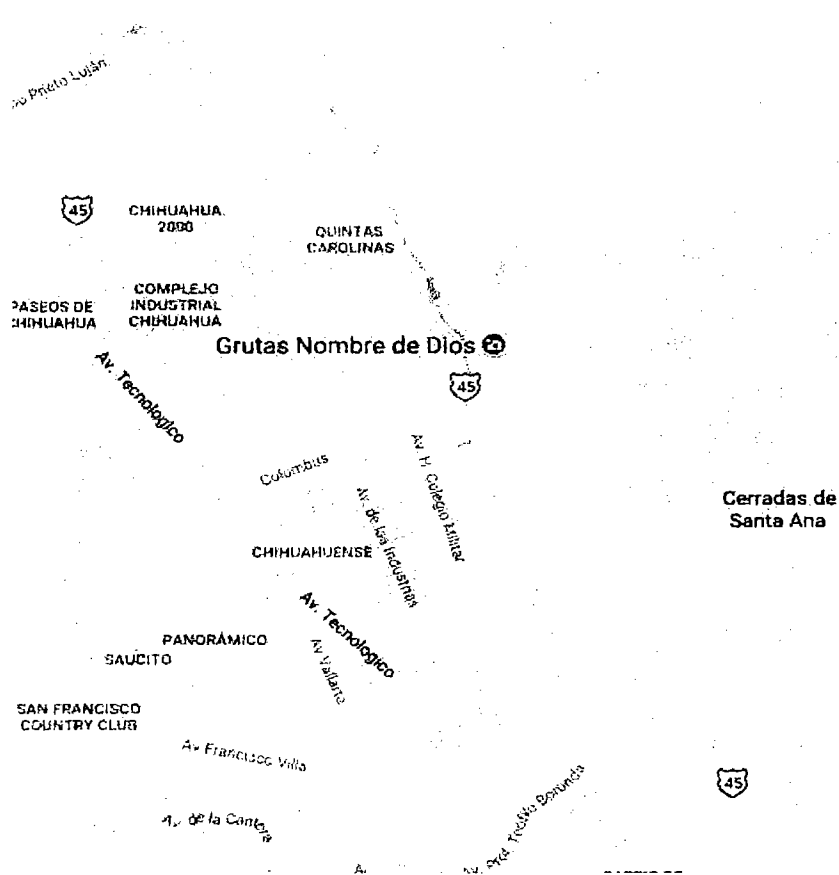




[Handwritten signature and initials]

AV. INDUSTRIAS/HULE CLORADO

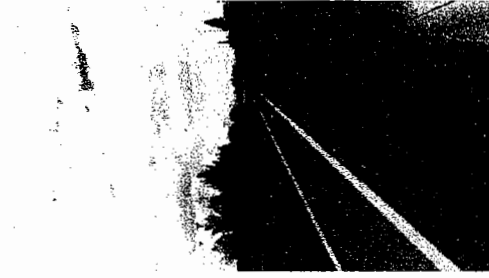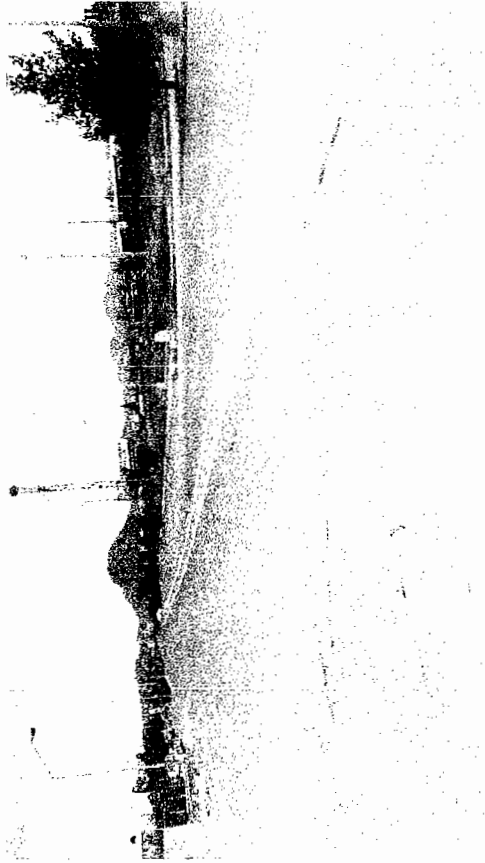

Handwritten marks: a circled 'X' and a checkmark.


AV. INDUSTRIAS/TERMOPLASTICA

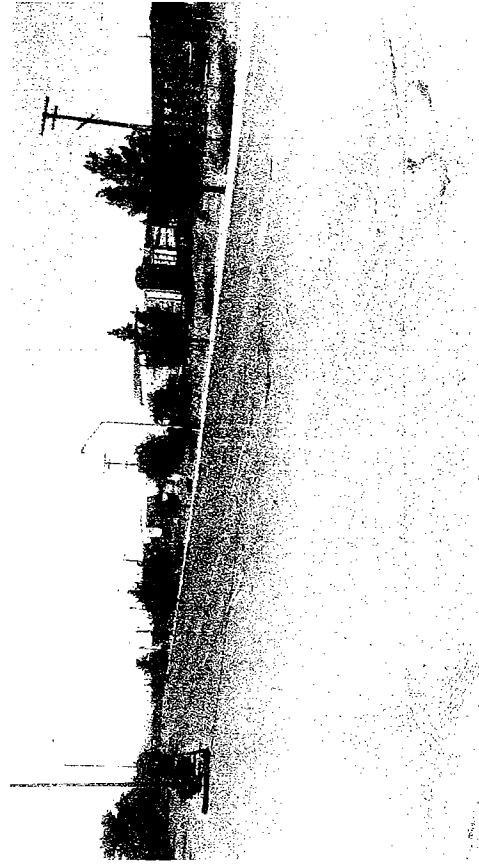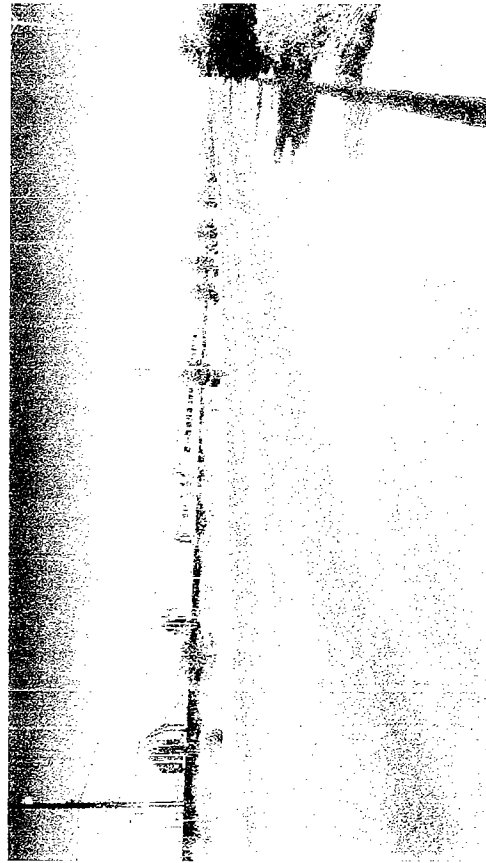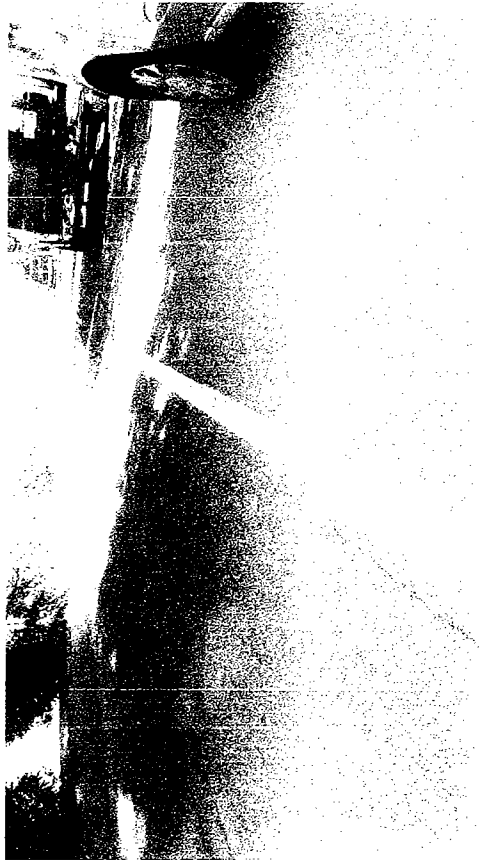

4 k

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO



CALLE	AV. LOS ARCOS DE AV. TECNOLOGICO Y AV. CHICOACEN			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	263	X4.5	1183.5
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	76.6		76.6
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1116		1116
			TOTAL DE ML	2376.1

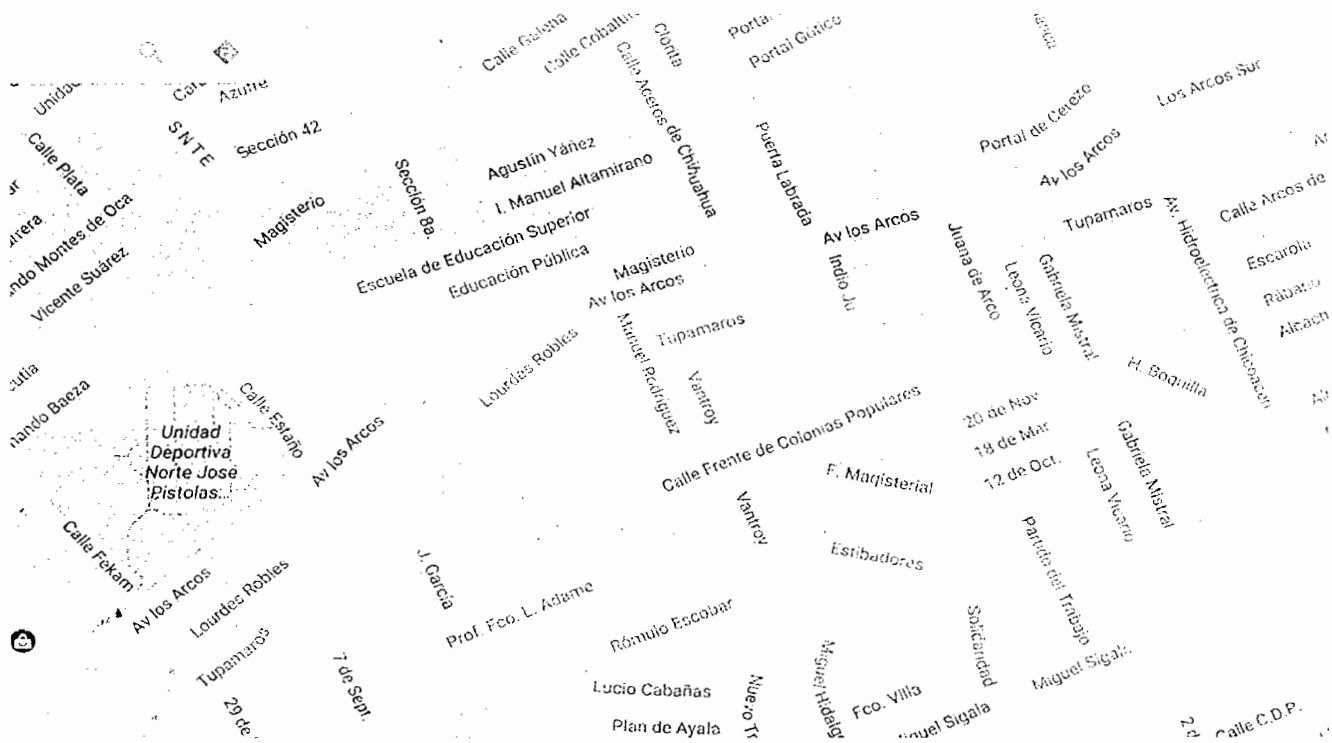

2




CALLE LOS ARCOS

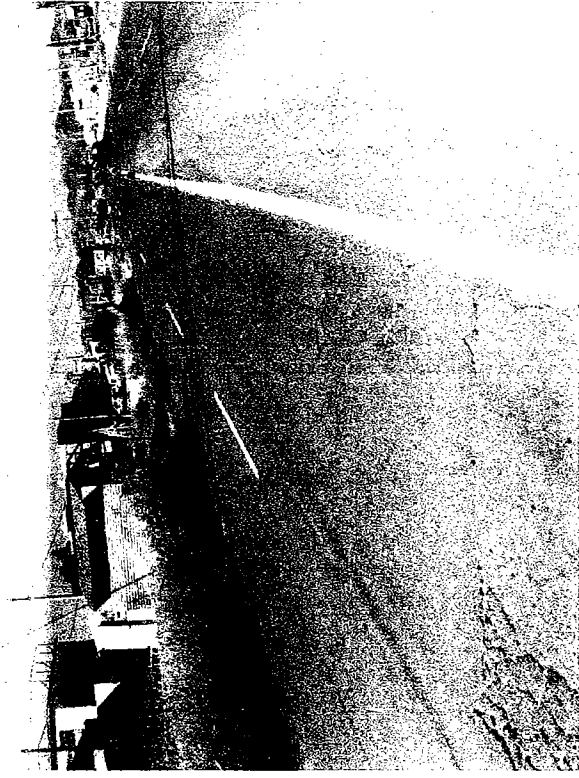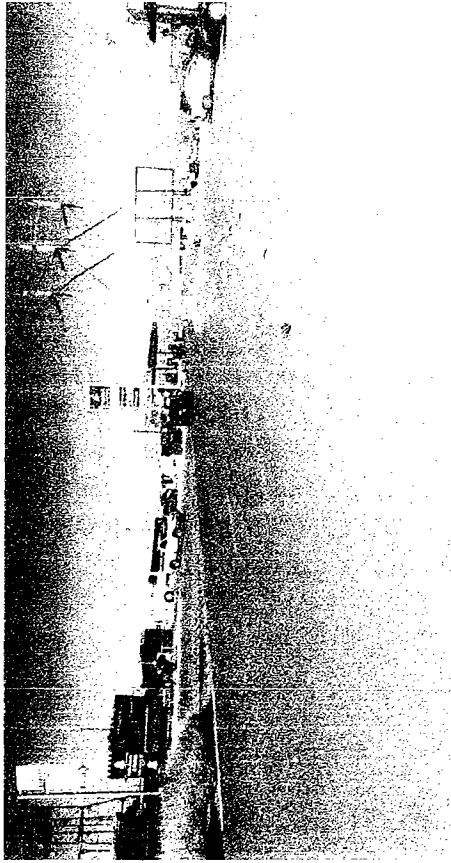



① r

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. TECNOLOGICO DE NIÑOS HEROES A JUAN ESCUTIA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	1675	X5	8375
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	5747		5747
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	2580		2580
VIALETAS	PZS	494		
			TOTAL DE ML	16702

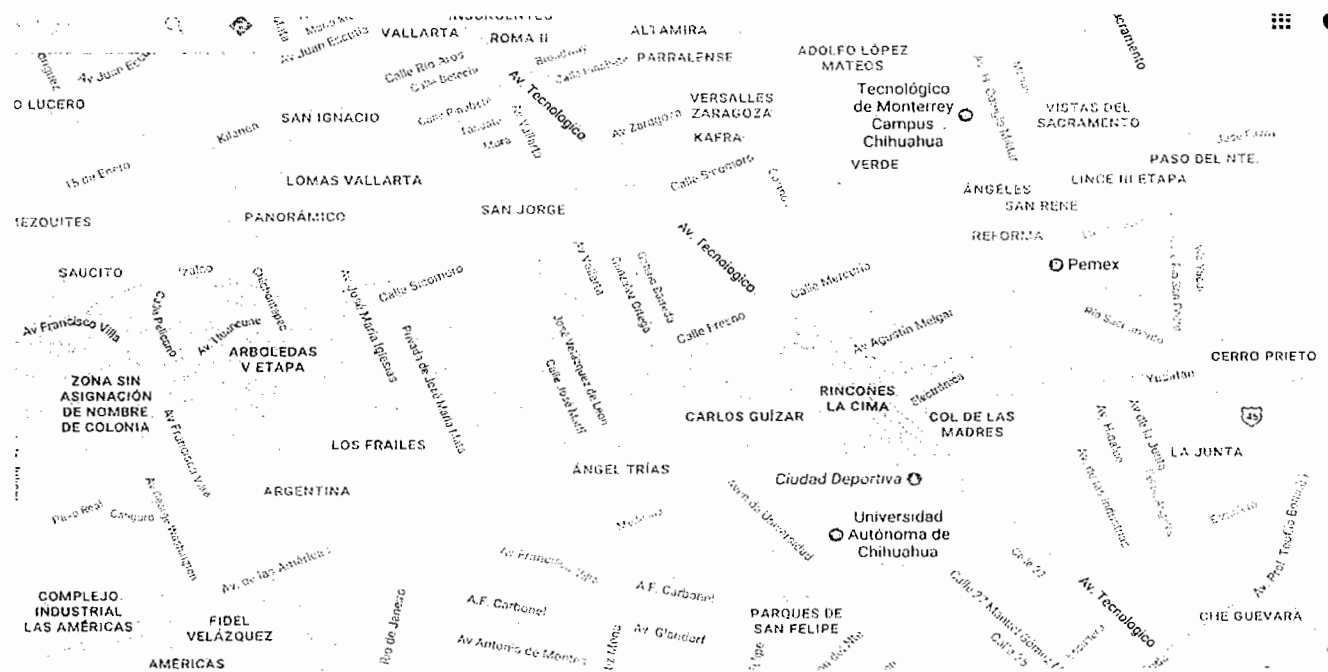

AV. TECNOLÓGICO/COLON

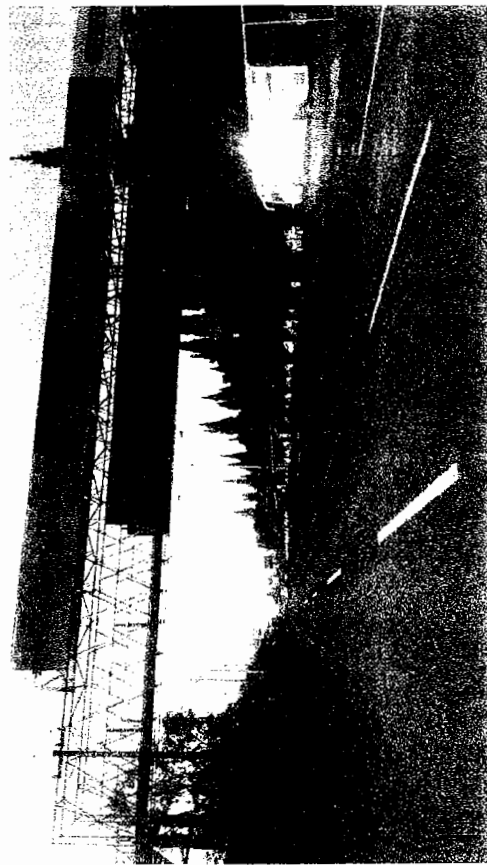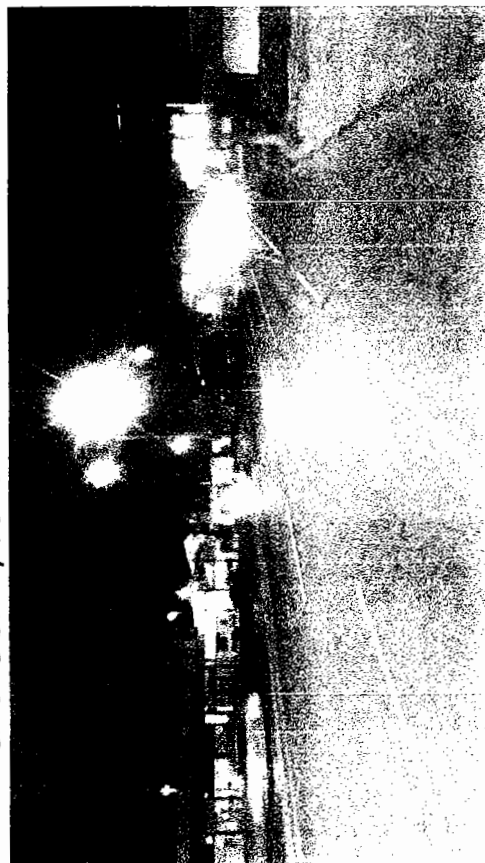


1

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO



CALLE	CALLE MERCURIO DE H. COLEGIO M Y AV. TECNOLOGICO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	127	X5	635
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	114		114
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	749

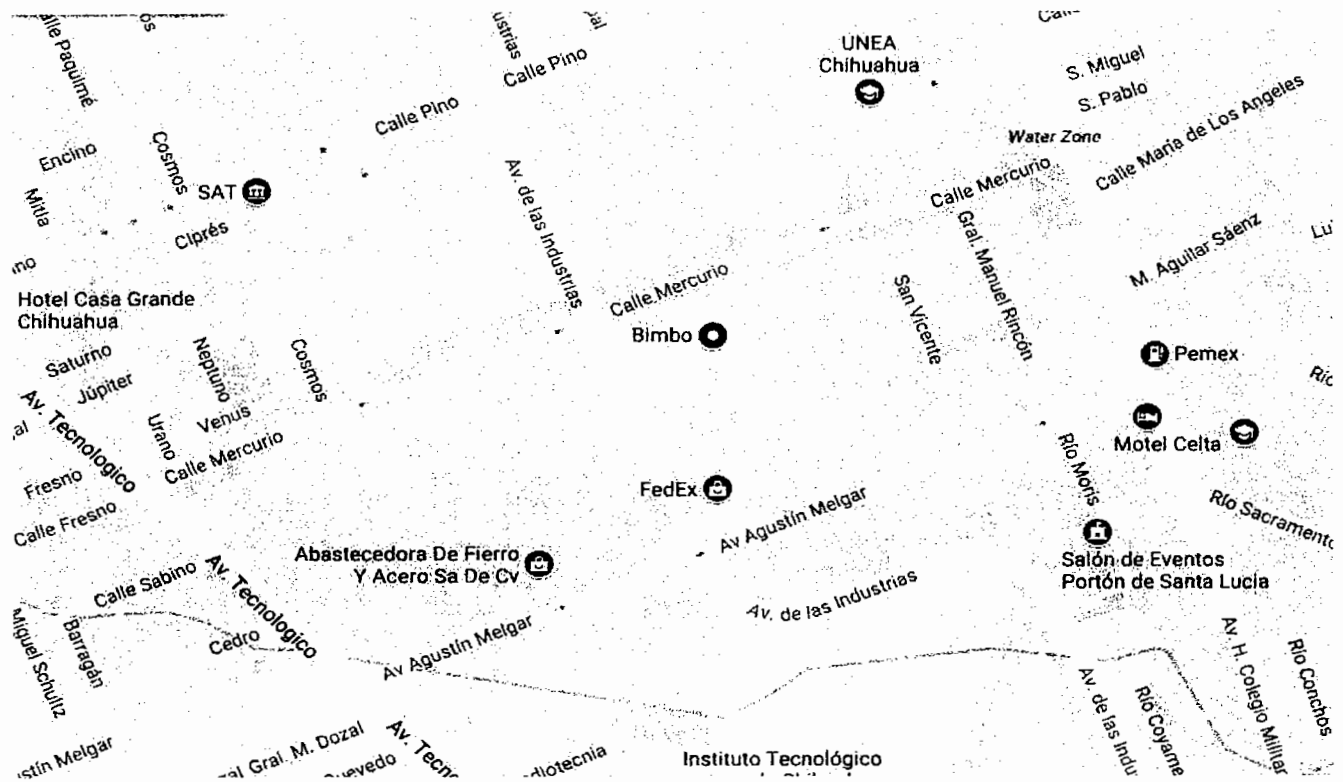

7

(Handwritten signature/initials)

CALLE MERCURIO

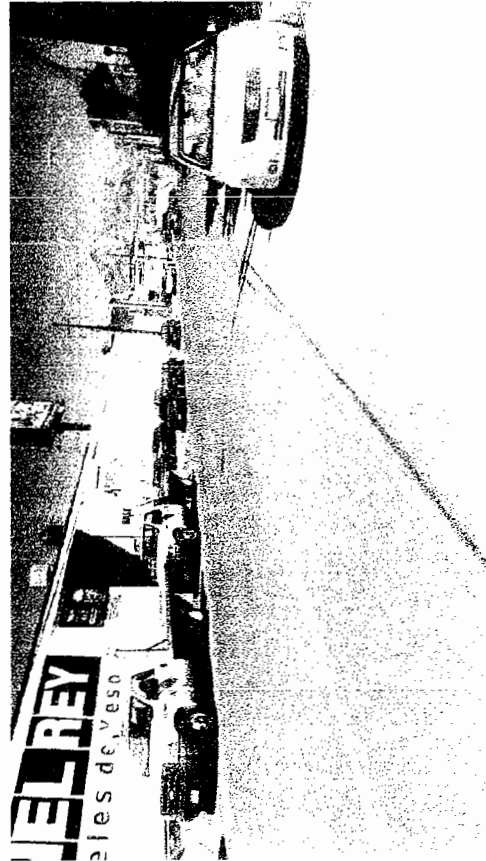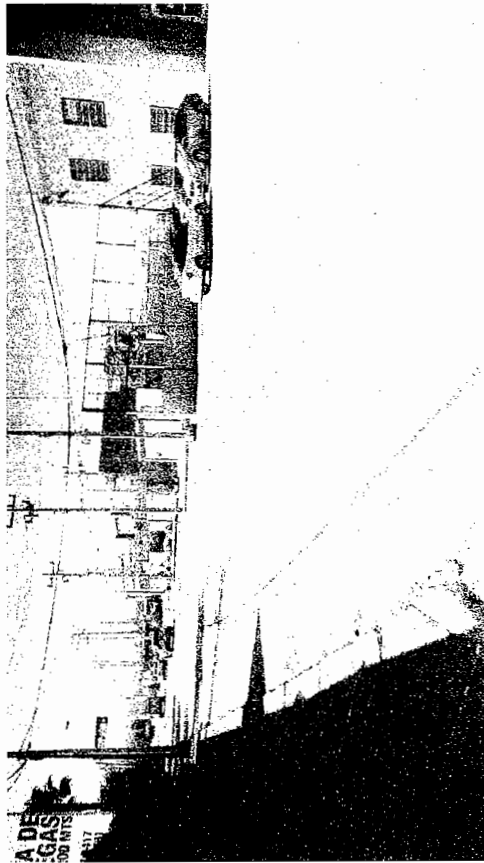


~~12~~ 1

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO


CALLE	AV. SICOMORO DE AV. INDUSTRIAS A AV. VALLARTA			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	212	X5	1060
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	150		150
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
TOTAL DE ML				1210

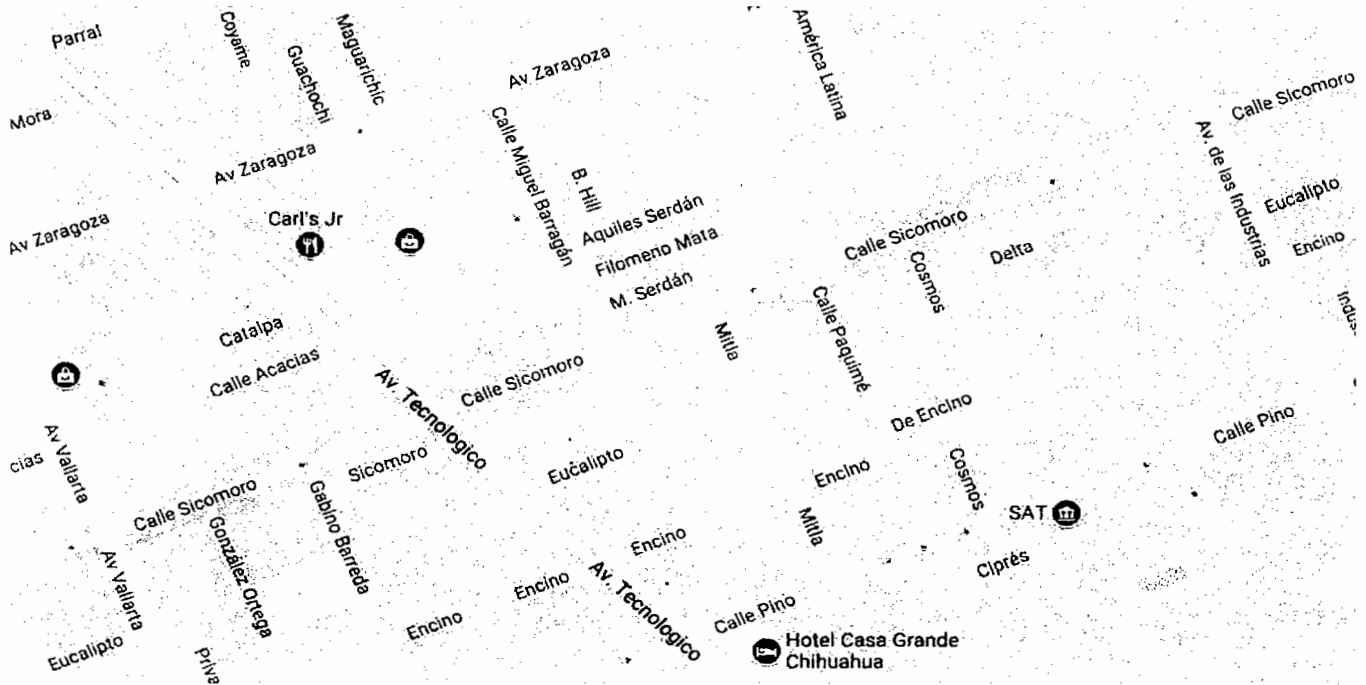



2

~~U~~

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or signature.

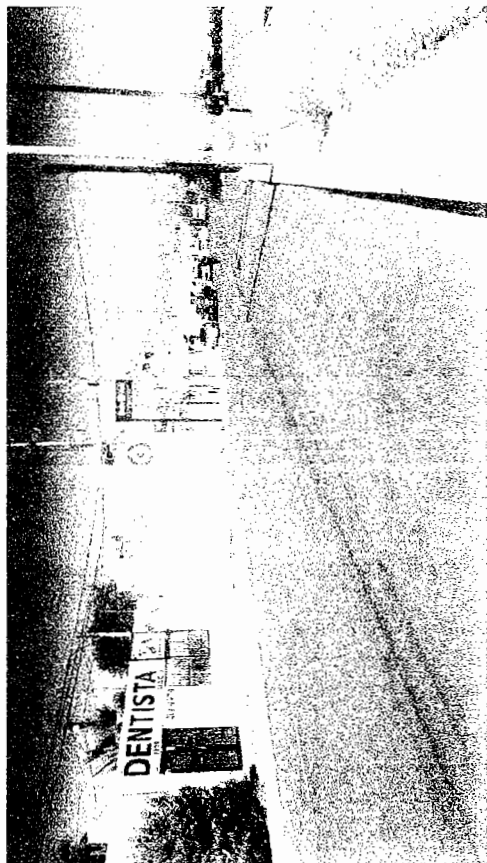

AV. SICOMORO

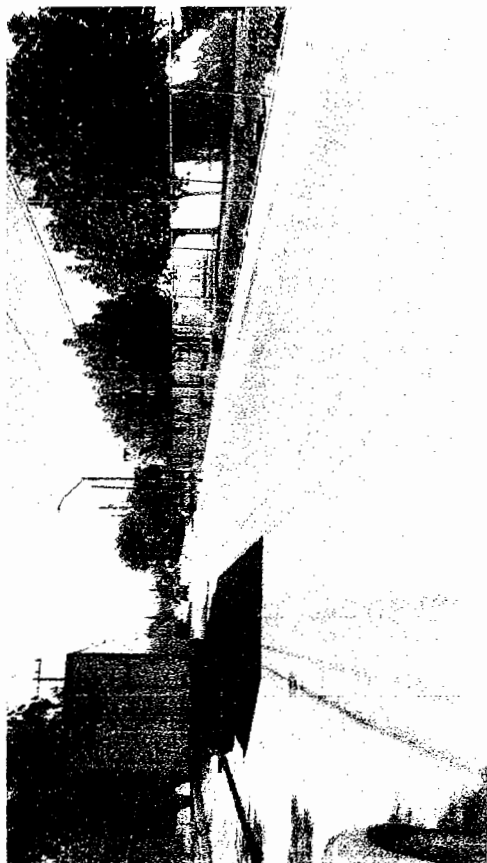



Handwritten mark resembling a stylized 'V' or signature.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

[illegible]

CALLE PASCUAL OROZCO

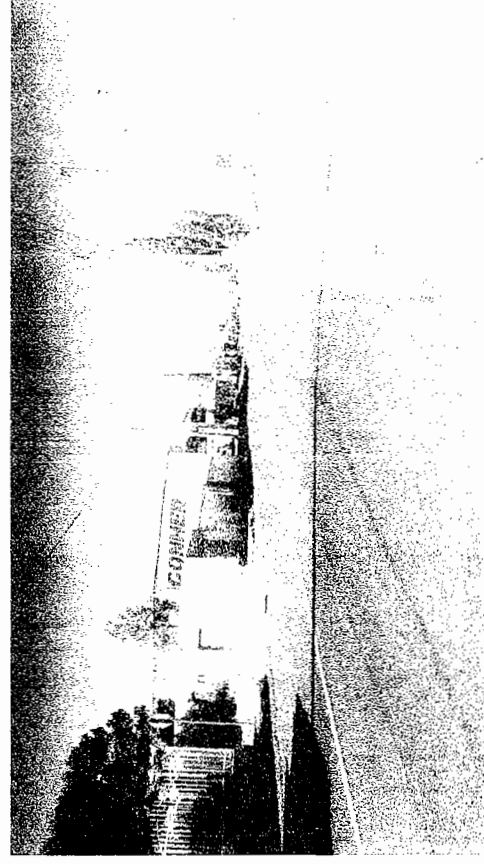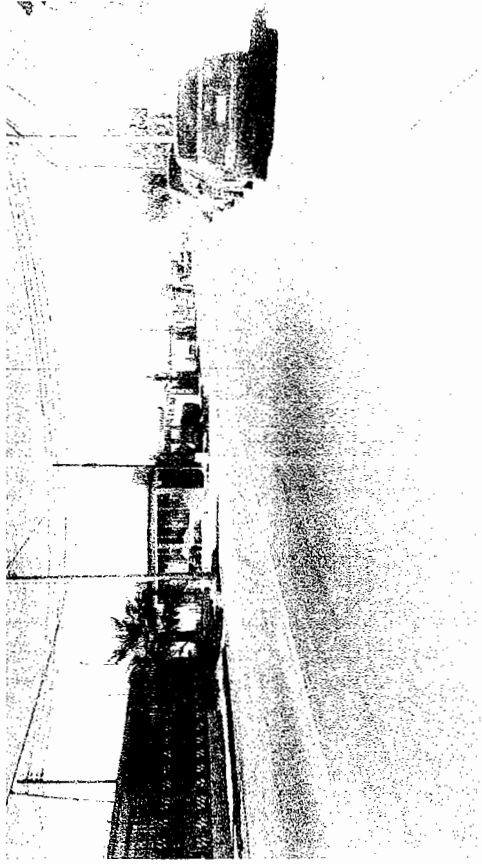


Q R

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.



PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. DIVISION DEL NORTE DE AV. UNIVERSIDAD A AV. TECNOLOGICO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	270	X5	1350
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	390		390
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	1740

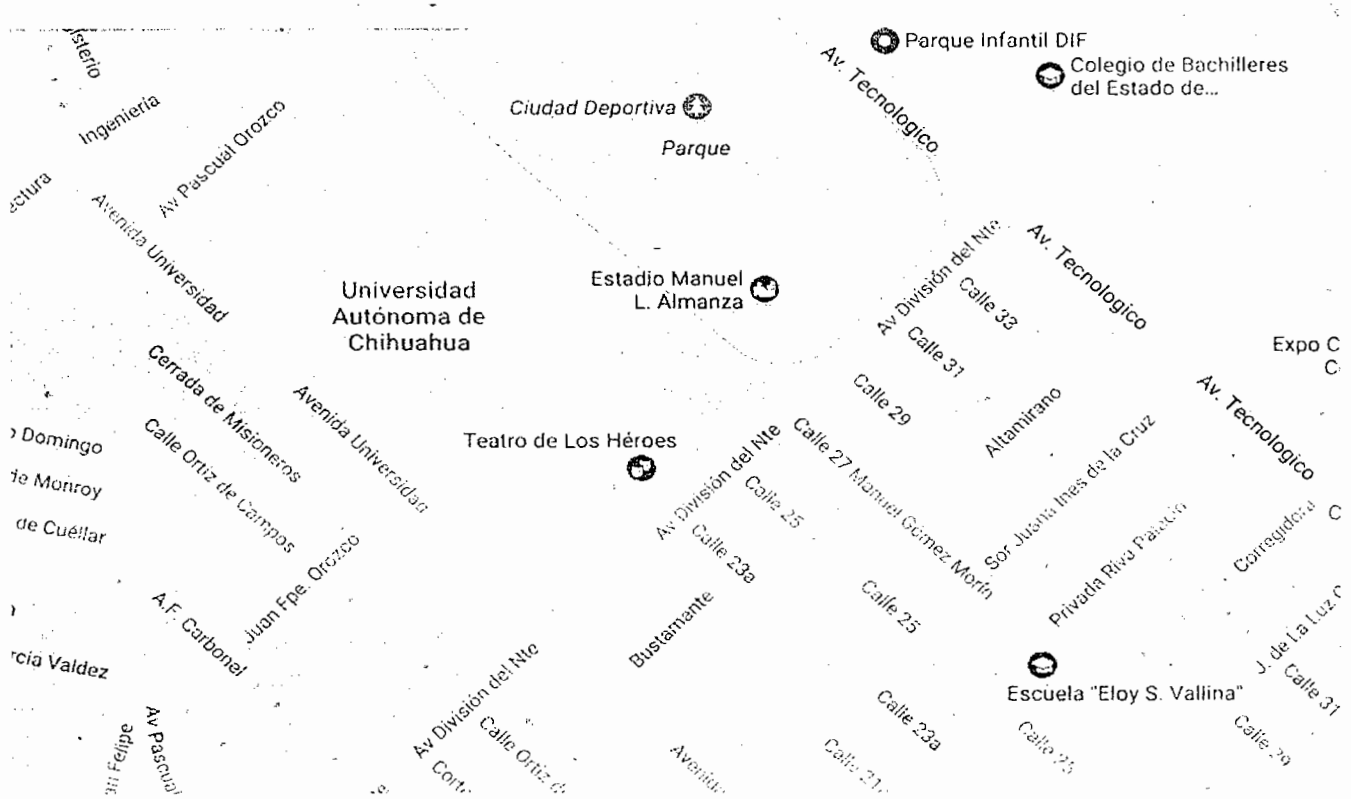

Handwritten signature and a large 'X' mark.

AV. DIVISION DEL NORTE

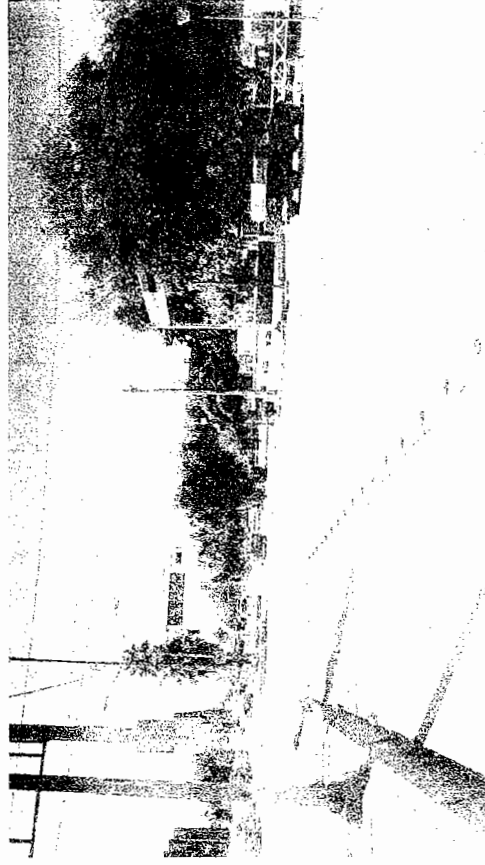


④ 12

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.



PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE 27 DE TEOFILO BORUNDA A AV. DIVISION DEL NORTE			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	275	X4	1100
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	232.4		232.4
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
			TOTAL DE ML	1332.4

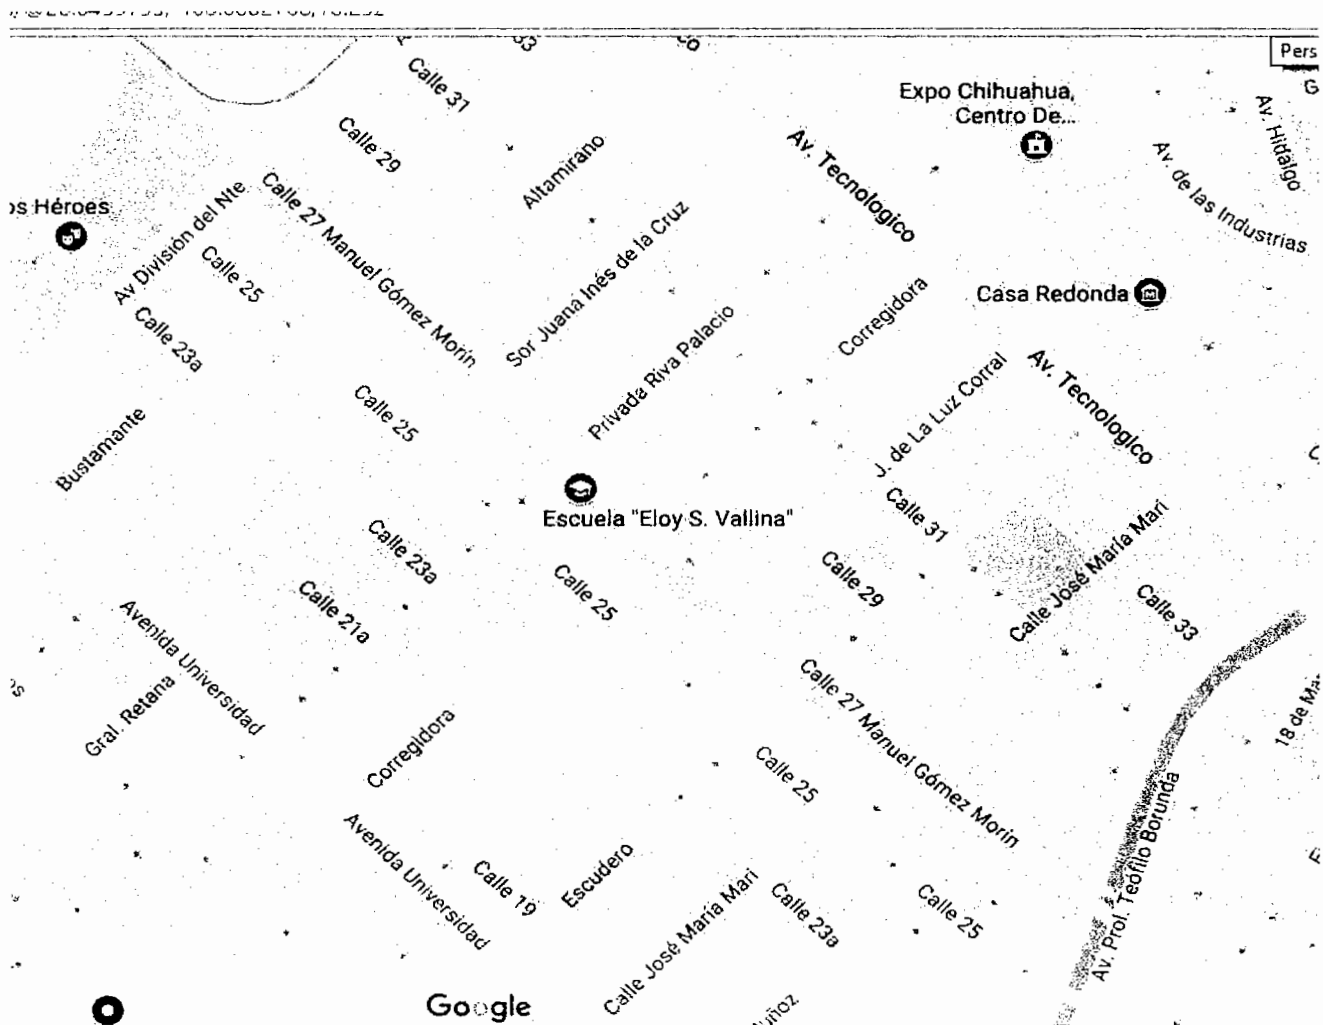

[Handwritten signature]

CALLE 27

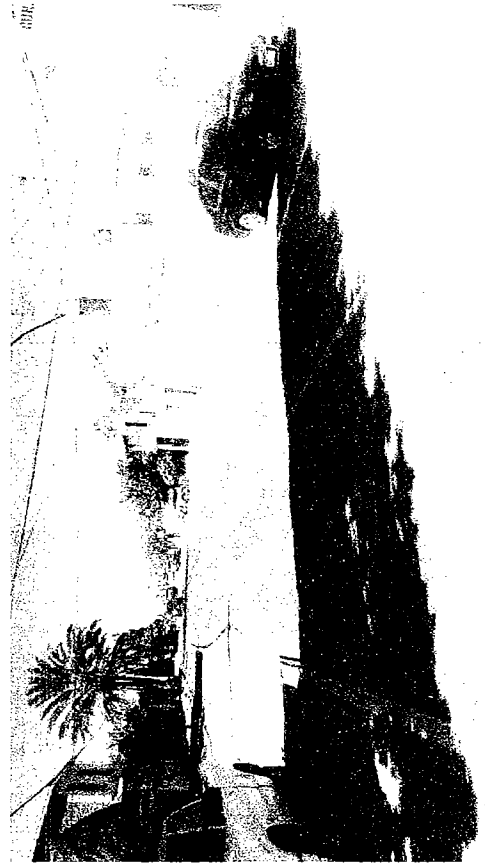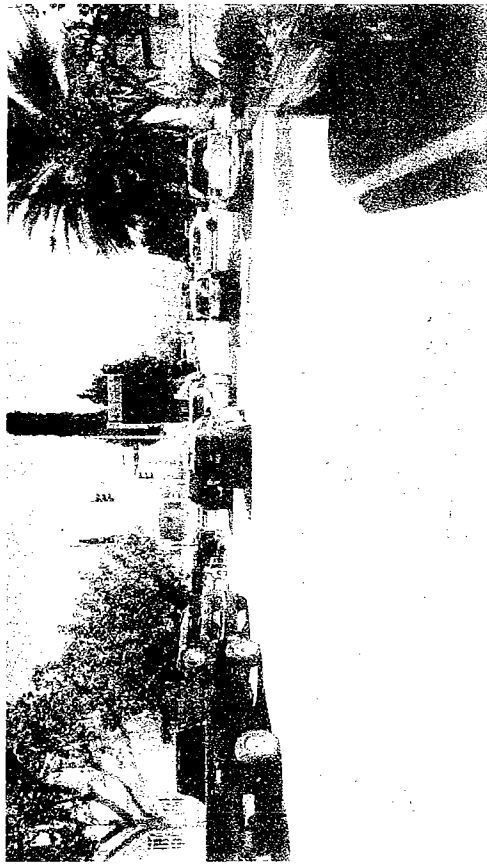

[Handwritten signature]


GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. JUAN ESCUTIA DE AV. INDUSTRIAS A AV. H. COLEGIO M.			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	0	X5	0
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	932		932
VIALETAS	PZS	0		
TOTAL DE ML				932




PINTURA TERMOPLASTICA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	205	X5	1025
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	277		277
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZS	0		
TOTAL DE ML				1302

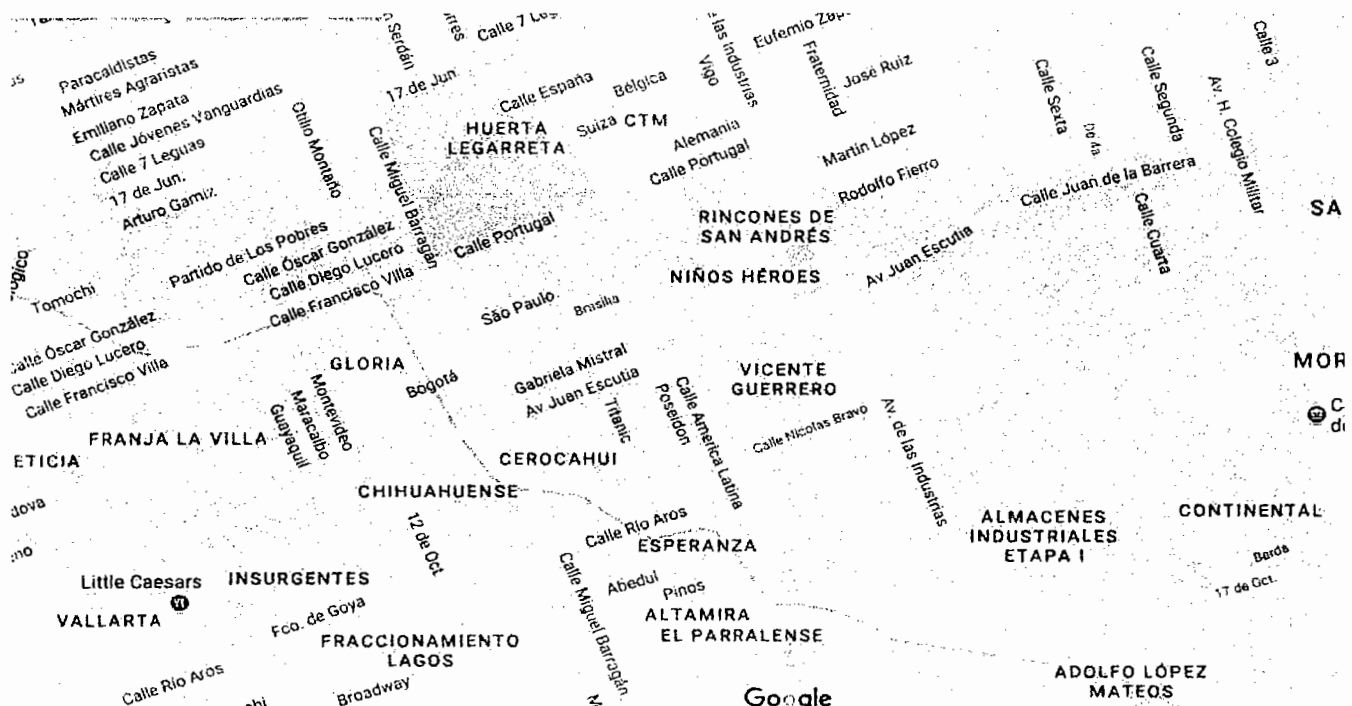





Handwritten signature and a large handwritten number '2'.

AV. JUAN ESCUTIA

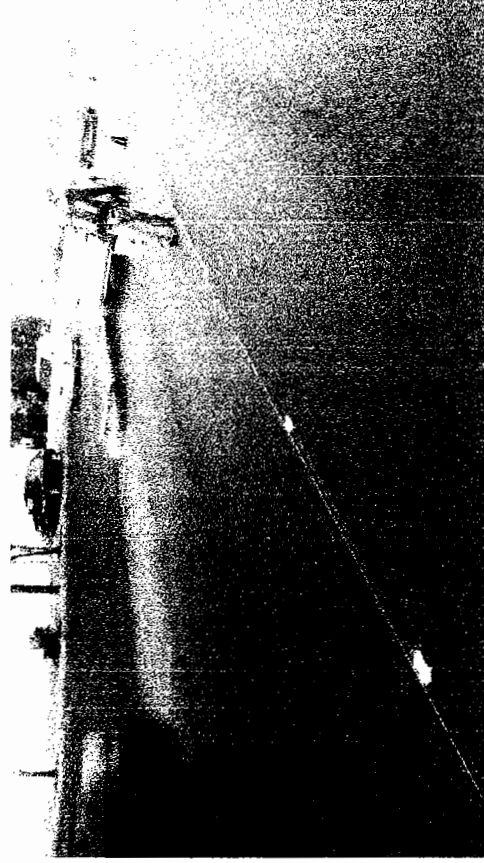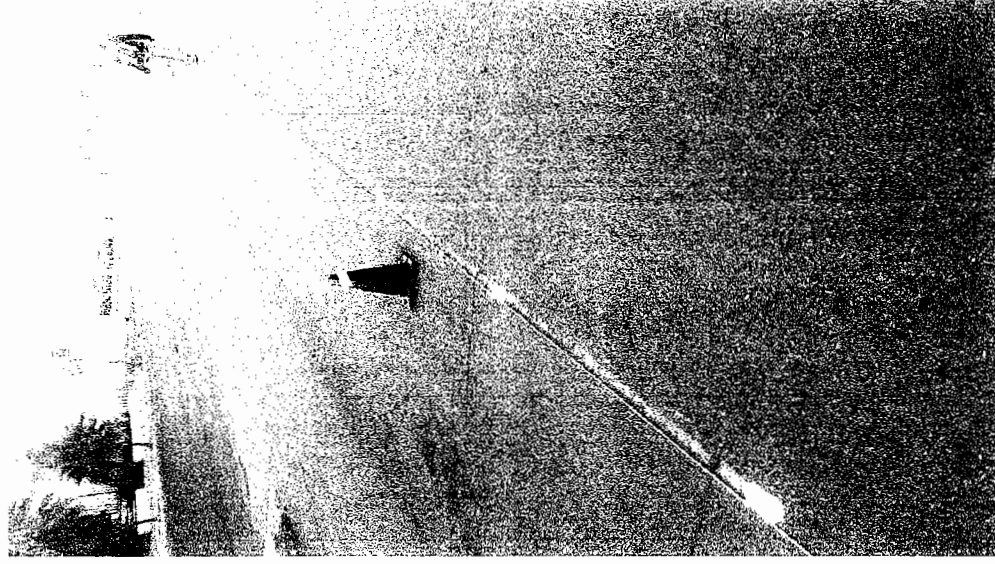

~~Q~~ 2

AV. JUAN ESCUTIA

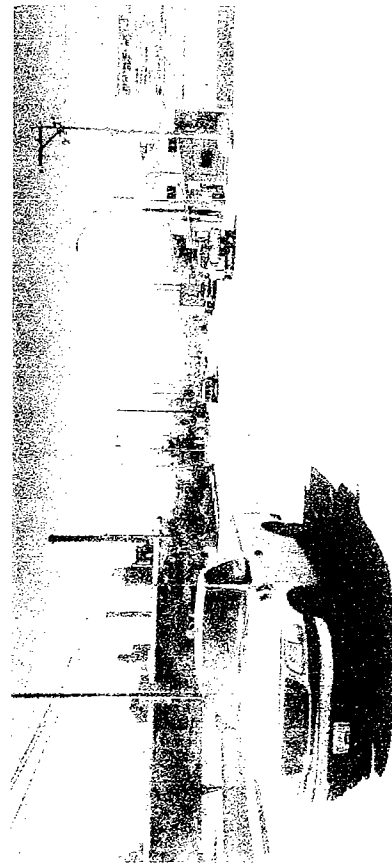

Handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or 'V' inside a circle.

FOLIO N° 001

29 Sept - 2017

CON ESTA FECHA SE INICIO LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO N° 150/2017 CON LA PINTURA BLANCA
EN LA CALLE 31^a ENTRE TEOFILO BONDURDI Y DIVISION
DEL NORTE. LOS TRABAJOS FUE DE PAUSE AL 100 %

30 Sept - 2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE LA PINTURA BLANCA
FUE DE NOCHE EN LA CALLE 31^a ENTRE TEOFILO
BONDURDI NORTE Y DIVISION DEL NORTE DE AMBOS LADOS
AL 100 %

2 OCTUBRE - 2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. SE PINTO
POR LA NOCHE EN LA CALLE 35^a ENTRE AV. TEOFILO
BONDURDI LITE Y DIVISION DEL NORTE. AL 100 %



FOLIO - N° 002

4 OCTUBRE 2017

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO N° 150/2017
CON LA PINTURA DE LA CALLE BROADWAY A LA CALLE
NIÑOS HEROES POR LO QUE AVE TECNOLÓGICA SE TIENE DE
AMBOS LADOS -

5 OCTUBRE 2017

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN AVE
TECNOLÓGICA ENTRE - DIVISION DEL NORTE A LA CALLE
BROADWAY Y SUR - A LA CALLE ESTOS TRABAJOS FUERON DE
NOCHE

6 OCTUBRE 2017

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE PINTURA FORMAS DE NOCHE
AVE TECNOLÓGICA ENTRE CALLE BROADWAY Y DIVISION DEL NORTE
ENTRE DE NOCHE A SUR

~~11~~

FOLIO N° 003

07- OCT- 2017

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, SE
PINTO DE NOCHE EN AVE DE LA JUNTAS ENTRE CALLE
BOJA CALIFORNIA Y CALLE YUCATAN AMBOS LADOS.
PINTURA BLANCA Y AMARILLA

09- OCT- 2017

CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE PINTURA FUERA DE
NOCHE, CALLE ESCUDERO ENTRE AVE. UNIVERSIDAD Y
AVE DE LA JUNTAS PINTURA BLANCA Y AMARILLA.
CALLE SICOLOLA ENTRE AVE. INDUSTRIAS Y AVE. USINARIA
PARA PINTURA BLANCA. CALLE MENONDO ENTRE AVE
INDUSTRIAS Y AVE TECNOLÓGICA PARA PINTURA BLANCA



Folio N° 004

10 Oct 2017

Continuamos con los trabajos de este contrato EN AVE DE
LOS INDUSTRIALES ENTRE AVE - TEOFILO BERNARDO Y AVE
JUAN ESCOBAR AMBOS LADOS ESTOS TRABAJOS FUERON
DIA Y SE UTILIZO PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA Y
PINTURA ACRILICA NORMAL

11 Oct - 2017

Continuamos con los trabajos de este contrato EN AVE
DE LOS INDUSTRIALES EN FFCC (JABIL) A C. GUILLERMO
PRIETO LUGAR DE SER-A-WORK Y DE GUILLERMO PRIETO
LUGAR A FRENTE A SENDERO (PLAZA) LOS TRABAJOS
FUERON A DIA Y SE UTILIZA PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA

~~4~~

FOLIO N° 005

12 OCT 2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO
EN AVE. JUAN ESCUTIA ENTRE AVE. DE LAS INDUSTRIAS
Y AVE. H. COLEGA MILITAR SE PINTO CON PINTURA
TECNORIAS HCA BLANCA Y PINTURA ANTIHUELLA NEGRO
EN AMBOS LADOS LOS TRABAJOS FUERON DE NOCHE.

AVE HIDALGO ENTRE C. EDUARDO Y CALLE YUCATAN PINTURA
BLANCA FUERON DE NOCHE. C. PASUAL ORCEN ENTRE
AVE REMONTEZA Y AVE UNIVERSIDAD SE UTILIZARON PINTURA
BLANCA Y ANTIHUELLA AMBOS LADOS SE REALIZO LOS
TRABAJOS DE NOCHE.

13 OCT 2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE NOCHE DE ESTE CONTRATO
EN AVE TECNOLÓGICO ENTRE CALLE VÍCTOR HERNÁNDEZ Y CALLE
DIVISION DEL NORDE AMBOS LADOS SE UTILIO PINTURA
BLANCA Y ANTIHUELLA

~~14~~

Folio N° 006

14 OCT-2017

Continuamos con los trabajos de este contrato se pinto en
CALLE RIVS PALACIO entre TECNOLÓGICA y AVE UNIVERSIDAD
Se utilizo pintura Blanca los trabajos fueron de noche

15 OCT-2017

Se continuo con los trabajos de pintura, de este contrato
en C. AGUSTIN MELGON entre AVE TECNOLÓGICA y AVE
UNIVERSIDAD ambos lados los trabajos fueron de noche
y se utilizo pintura Blanca y amarilla.

17 OCT-2017

Continuamos con los trabajos de este contrato se pinto
en AVE DE LAS INDUSTRIAS entre FRENTE A SEJADERO (Plaza)
y FFCL (JABIL) el resto de N-S fue trabajo de día
se utilizo pintura Blanca termoplastica

FOLIO N° 007

18 Oct 2017

Continuamos con los trabajos de este contrato N° 150/2017
AVE DE LOS FUNDACIONES ENTRE AVE HOMEROS Y FFCC
(JABIL) AMBOS LADOS SE UTILIZA PINTURA BLANCA LOS
TRABAJOS FUERA DE NOCHE. AVE DIVISION DEL NORTE ENTRE
AVE UNIVERSIDAD Y AVE TECNOLOGIA AMBOS LADOS SE
UTILIZA PINTURA BLANCA LOS TRABAJOS FUERA DE NOCHE
AVE TECNOLOGIA ENTRE CALLE BROADWAY Y JUAN ESCOBAR
AMBOS LADOS SE UTILIZA PINTURA BLANCA Y LA CARRETERA DE
NOCHE Y CALLE 27 ENTRE AVE TEFILO BOMBA WALK Y
DIVISION DEL NORTE. SE UTILIZA PINTURA BLANCA Y LA
CARRETERA DE NOCHE

19 Oct 2017

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE PINTO
EL AVE DE LOS ARCO ENTRE AVE TECNOLOGIA Y LA CHILICATON
AMBOS LADOS SE TRABAJA DE DIA Y SE UTILIZA PINTURA
BLANCA Y AMARILLA



FOLIO N° 008

20 OCT-2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DEL ASL CONTRATO EN
CALLE PASADAL ORCEA ENTRE AVE JUAN ESCOBAR Y AVE
HUMERO UNA SOLA LINEA ANARQUIA. EN EL CONTRA
LOS TRABAJOS LO HIGIENIZACION DE DIA SE PINTO CON PINTURA
AMARILLA EN EL LADO DE LA BARRERA INCORPORANDO ALA LA
CALLE MILITAR FUE TRABAJOS DE NOCHE

21 OCT-2017

SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE
COLOCARON 506 VIALITAS EN AVE DE LOS TENDEROS ENTRE
AVE PERFILES BARRERA Y AV. AGUSTIN MELGAR AMBOS LADOS
Y SE COLOCARON 494 VIALITAS EN AVE TECNOLÓGICA
ENTRE NIÑOS HERMES Y C- LINDERO AMBOS LADOS LOS
TRABAJOS FUERON DE DIA.

~~2~~
