



Factura

SERIE:

FOLIO: 315

FECHA: 1/12/2017 08:58:20

Documento Válido

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L DE C.V

GIC130712697

RAMON DOMINGUEZ No. 104 DEPORTISTAS,
CHIHUAHUA 31125
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: CALLE MINA No. 408
Teléfono:
Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: COL: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA

C.P.: 31000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: RAMON DOMINGUEZ 104, DEPORTISTAS, 31125, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Régimen Fiscal: Persona Moral Régimen General de Ley

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ESTIMACION No 2 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD, NUMERO DE CONTRATO No 150/2017. MONTO DE LA ESTIMACION \$218,688.86 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$65,606.65 SUMA \$153,082.21 IVA \$24,493.15 TOTAL \$177,575.36 DESUCENTOS 0.2% D.I.F (AL MILLAR) \$437.38 0.2% C.M.I.C (AL MILLAR) \$437.38 SUMA \$874.76 NETO A RECIBIR \$176,700.60	153,082.21	153,082.21

Importe con letra
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.
Método de Pago
02 Cheque nominativo
Número de Cuenta:

SUBTOTAL:	153,082.21
I.V.A.:	24,493.15
TOTAL:	177,575.36

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408187210
Folio fiscal:	C94120A6-9EB4-4493-80DF-E9CFFE73DCD2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 1 2017 - 09:59:23

Sello digital del CFDI

chTqf/3/K2L3vXhFoFj6WPPFP7ss3swzoleBvDmVhT8w9k98at/kygpfR+V4xB2QW0UPSc8CyzJ22ReuSxGtPF
aycwt9QHwh3NM6DqdbqGHK11TUKAF31axRyoFJXqmsE0bckf01jbX3YoTstIH01Vrw0evbZlma+Phg4HFj1tbhe
1YCRpN11MjmmYn1Op28rIdZ58W1wbKgJ9fJPDog+qg8+cr:30I/gEgVoBW9rS3A5yuQqxb+PKfzPdG+Q7VPyM+n
nJC4SzaRCjMggz7211Jy9Mw1PKX1qRGfhwISG+03h3LG6d01EdAuHaxqblTVgTKVTTaDSpSjywLkF4gHA3qy==

Sello del SAT

U2h/aKq8KovqMdv7yddQuFvGZPlwyzdGuyi4fyIqyOm0d5eoy1ViCwtorvaCePcut8OmK2C5yd/EIz4
07TRU2NVuTk1yRQ0roQgsNkkz/tnce3oiGH/rb6GmFYos0FAUWQAnzFT1TbcjZpW6EUpfj2Q18UNNTXL
VeNhe58g3cyxjyEB1EirQ8mUpA+qFbXaQ39GyTxJ1017/Q6tarUf/D1Fksvalocjmiwtf5q032dMDeX1
n5cL0wOk1/jGUwD4yOwOpI2b4EgKPI3eKGKxjv3WAx9VVdWkyPJRJJcpKeUom9Wu3/z4SniZ/PD0pohn

yAXfnBG/G95EtitmfaIn+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C94120A6-9EB4-4493-80DF-E9CFFE73DCD2|2017-12-01T09:59:23|chTqf/3/k213yXhFo
Fj6WPPFp7sx3swzo1EBvDmVhT6w9k9Sat/kyqpfr+V4xB2QW0UPSc8Cy-J2ZReuSxGtPfcycwt9QHwb3
NM6DqdhqGHK11TUKAF31axRyoFUXqmaE0bckfOiJbX5YoTstIH0IVrw0evb21m+fhg4HFjltbhelYCRp
N11M3mmYn1Op28rIdZ56W1wbKgJ9fJPDoq+qqS+cx30I/qEgVoBW9rS3A5yuQqXb+EXfzPdG+Q7VFyM+
nxJC4SzaRCjMggz72i1JySMw1PKX1qRGfhvISG+03h3LG6d02fdAnHaxqblTVgTKVTTaDSpsJywLkF4g
HA3qw==|00001000000404486074||

🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIC130712697	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L DE C.V	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C94120A6-9EB4-4493-80DF-E9CFFE73DCD2	2017-12-01T08:58:20	2017-12-01T09:59:23	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
----------------	------------------------	-------------

\$177,575.36

Ingreso

Vigente

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)

[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(<https://www.gob.mx/privacidad>)

[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(<https://www.gob.mx/terminos>)

[Marco Jurídico](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)

[Portal de Obligaciones de Transparencia](http://portal.transparencia.gob.mx)
(<http://portal.transparencia.gob.mx>)

[Sistema Infomex](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
(<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)

[INAÍ](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
(<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>)

[Mapa de sitio](https://www.gob.mx/sitemap)
(<https://www.gob.mx/sitemap>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

[English](https://www.gob.mx/en/index)
(<https://www.gob.mx/en/index>)

[Temas](https://www.gob.mx/temas)
(<https://www.gob.mx/temas>)

[Reformas](http://reformas.gob.mx) (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto



Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx


[Denuncia contra servidores públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)
(<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado.
Suscríbete.



Síguenos en





HOJA DE RESUMEN FINAL

No. 1

PROGRAMA:

CONTRATO No. 150/2017 CONTRATADO \$ 1.215,836.85

OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CALLES Y AVENIDAS EN ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD (termoplastica)

ING. MARIO ALBERTO GONZALEZ BERNAL
GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C.
GIC-130712-697

CONCEPTO

PINTURA SOBRE PAVIMENTOS

\$218,688.86

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

DESCUENTOS:

0.2 % DIF (AL MILLAR). \$ 437.38

0.2 % CMIC (AL MILLAR). \$ 437.38

SUMA DESCUENTOS	\$ 874.76
-----------------	-----------

RESUMEN:

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 218,688.86
----------------------	---------------

AMORTIZACION ANTICIPO (30%)

DESCUENTOS

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
12/31/2023	SUB - TOTAL	\$ 152,207.45

L.V.A.

SALDO NETO PARA PAGO

CON LETRA:

(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 60/100 M.N.)

FORMULO:

RESIDENTE DE OBRA

ING. ALEJANDRO PEREZ PINEDO

REV450

JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

NG, VICTOR AMADOR PONCE

AFQ. CARLOS AGUILAR GARCIA


SELEON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARIOS HUMBERTO CABELLO GIL

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. JUAN ESCUTIA TRAMO AV. TECNOLOGICO A AV INDUSTRIAS			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	468	X5	2340
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	416		416
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		
			TOTAL DE ML	2756

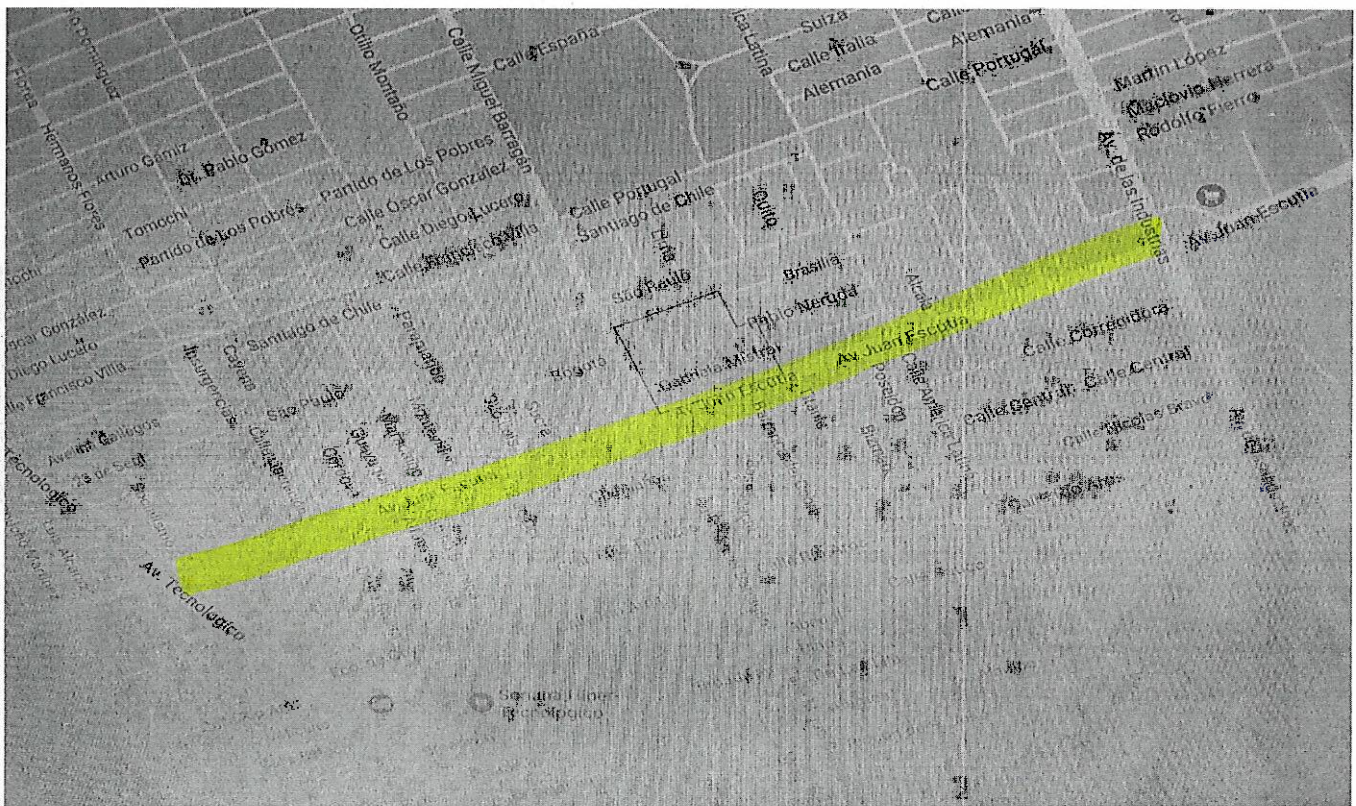

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'D. J.', is written across the bottom of the page. To the right of the signature, there is a small, curved blue mark.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	CALLE MIGUEL BARRAGAN TRAMO DE JUAN ESCUTIA A CALLE PINO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	0	X5	0
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	1365.7		1365.7
			TOTAL DE ML	1365.7




2

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	TECNOLOGICO TRAMO DE LOS ARCOS A CALLE DESARROLLO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	258	X5	1290
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	2054		2054
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
			TOTAL DE ML	3344

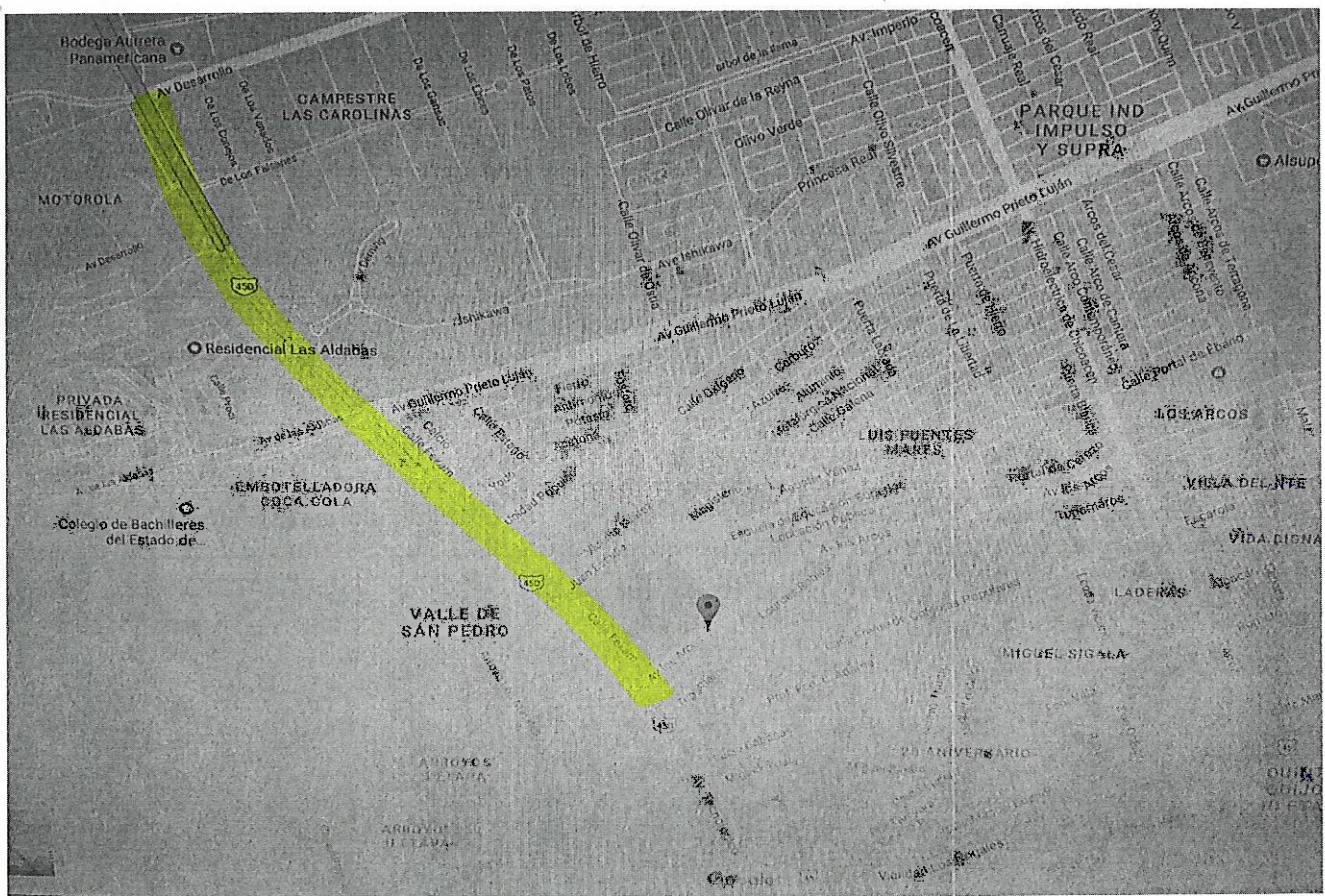


2

[Handwritten signature]

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. TECNOLÓGICO TRAMO DE CALLE DESARROLLO A LOS ARCOS			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	256	X5	1280
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	1534.5		1534.5
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
			TOTAL DE ML	2814.5

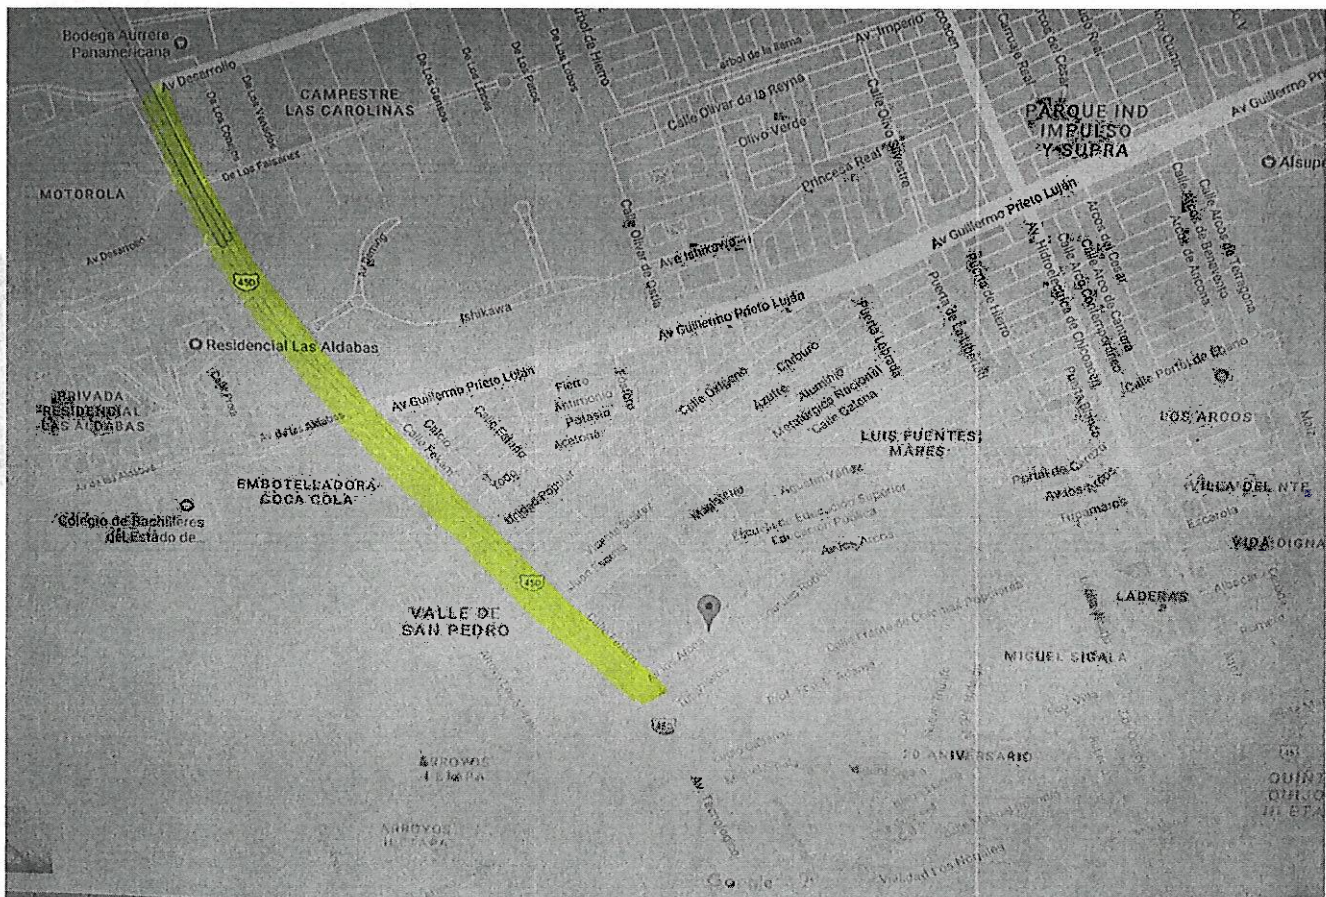

2

[Handwritten signature]

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.

PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. TECNOLÓGICO TRAMO DE MERCURIO A BROADWAY			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	0	X5	0
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
VIALETAS	PZA	2500		2500
			TOTAL DE PZS	2500




2

[Handwritten signature]

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S. DE R.L. DE C.V.



PINTURA TRAFICO HULE CLORADO

CALLE	AV. INDUSTRIAS TRAMO DE AV. JUAN ESCUTIA A AV. HOMERO			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		TOTAL
GUIONES DE CARRILES	PZS	552	X0.0015	2760.852
LINEA CONTINUA BLANCA	ML	0		0
LINEA CONTINUA AMARILLA	ML	0		0
			TOTAL DE ML	2760.852

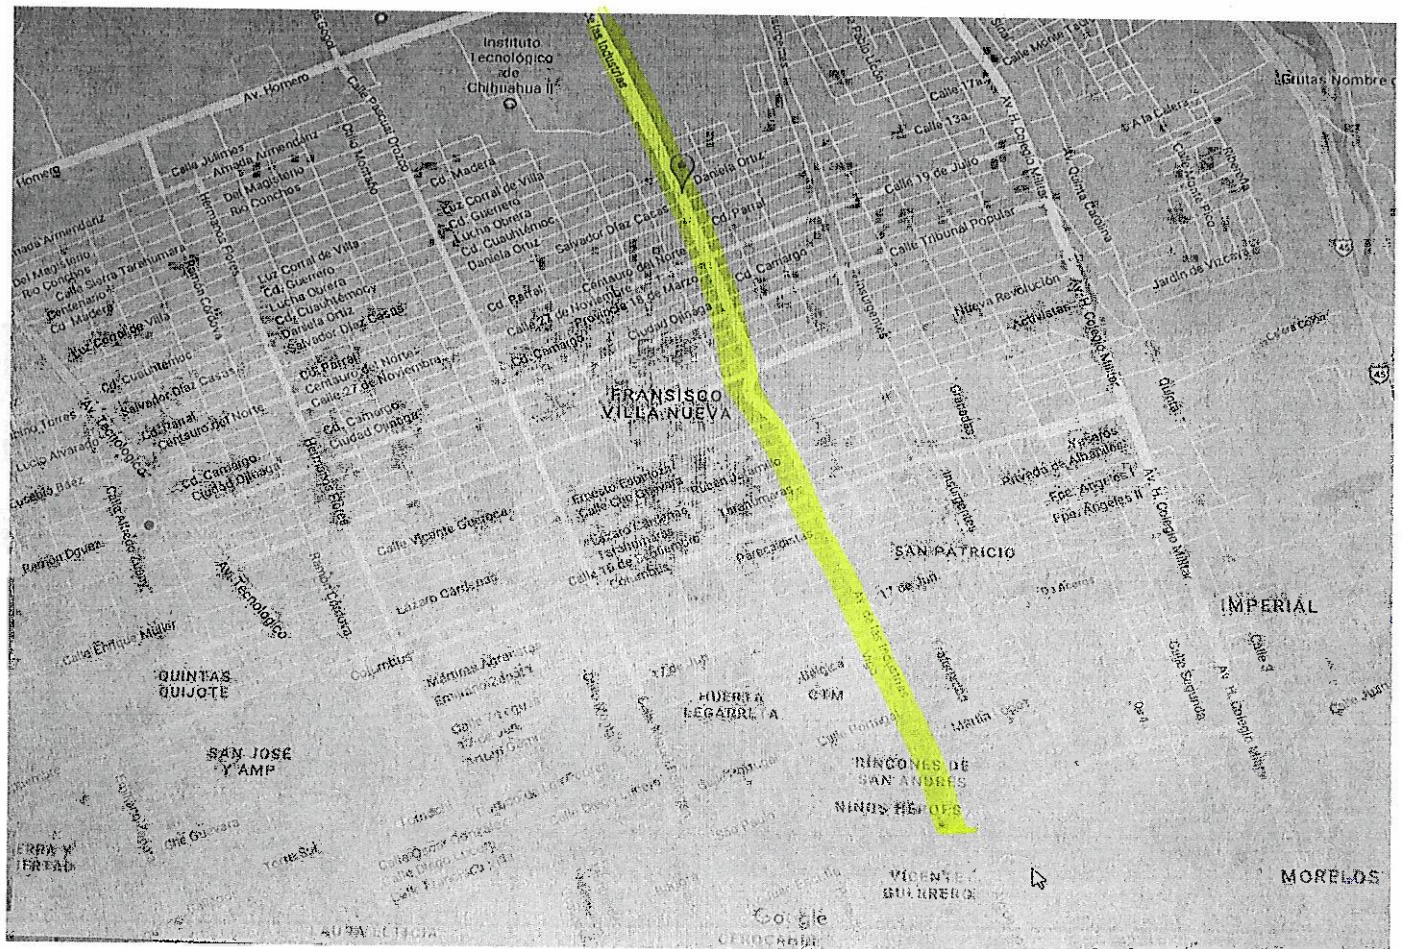

Handwritten signature or mark in blue ink.

31 DE OCTUBRE DE 2017

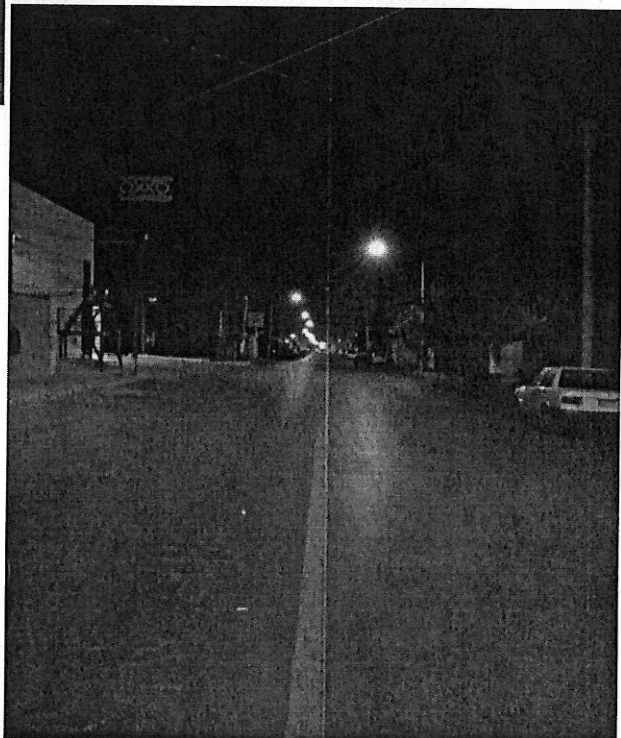
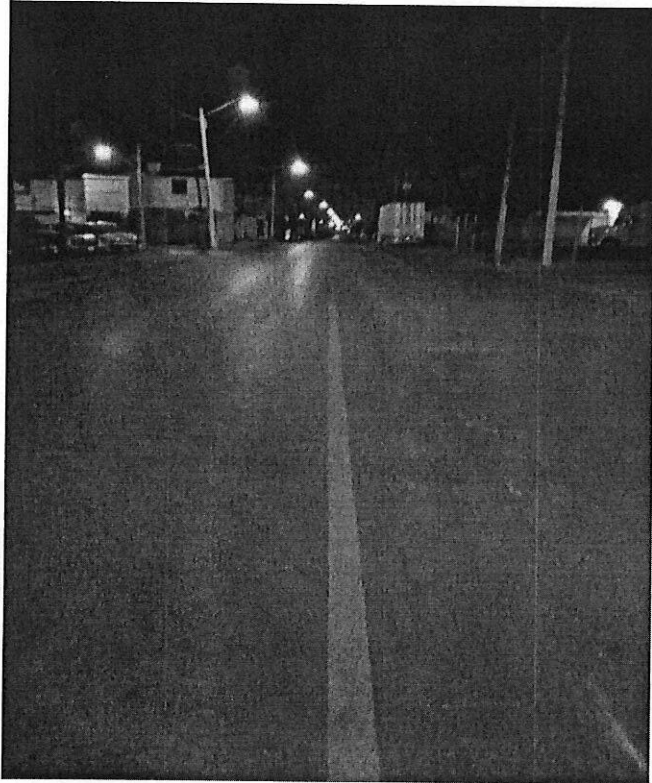


CALLE MIGUEL BARRAGAN TRAMO DE AV. JUAN ESCUTIA A CALLE PINO

2
Q

CONMAAC
CONSTRUCCIONES Y MANUFACTURAS DE ACERO
REPORTE FOTOGRAFICO ESTIMACION 2 Y ULTIMA

31 DE OCTUBRE DE 2017

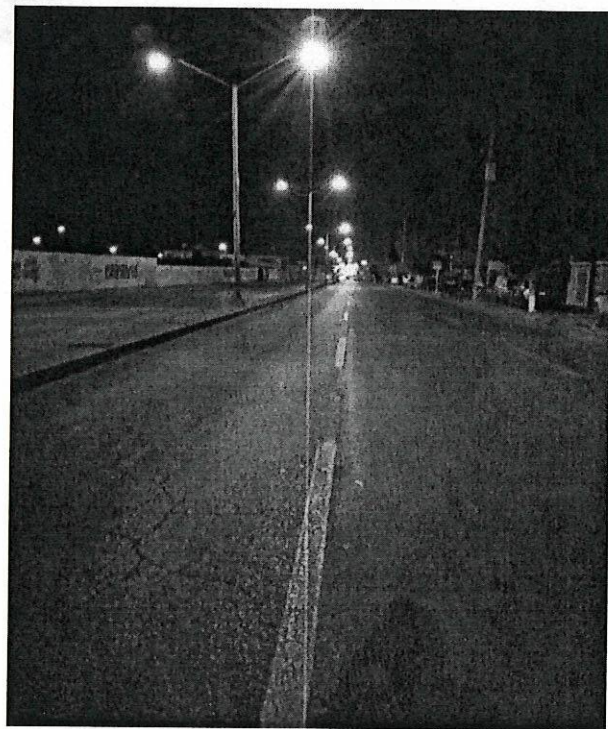
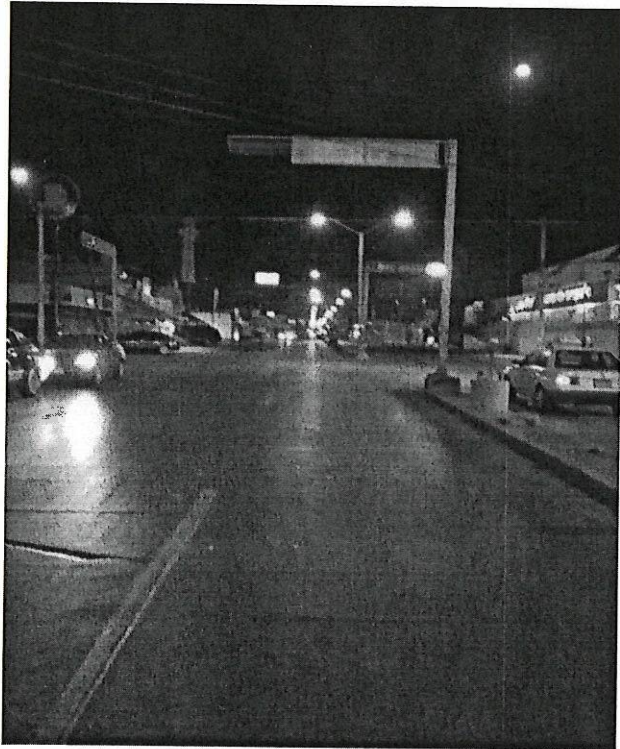


AV. JUAN ESCUTIA TRAMO DE AV. TECNOLOGICO A AV. INDUSTRIAS

2

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'Q' or similar shape.



31 DE OCTUBRE DE 2017

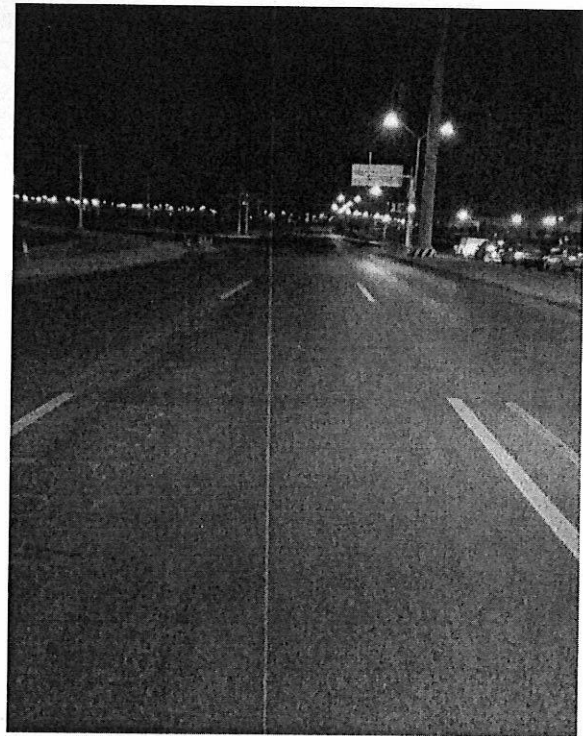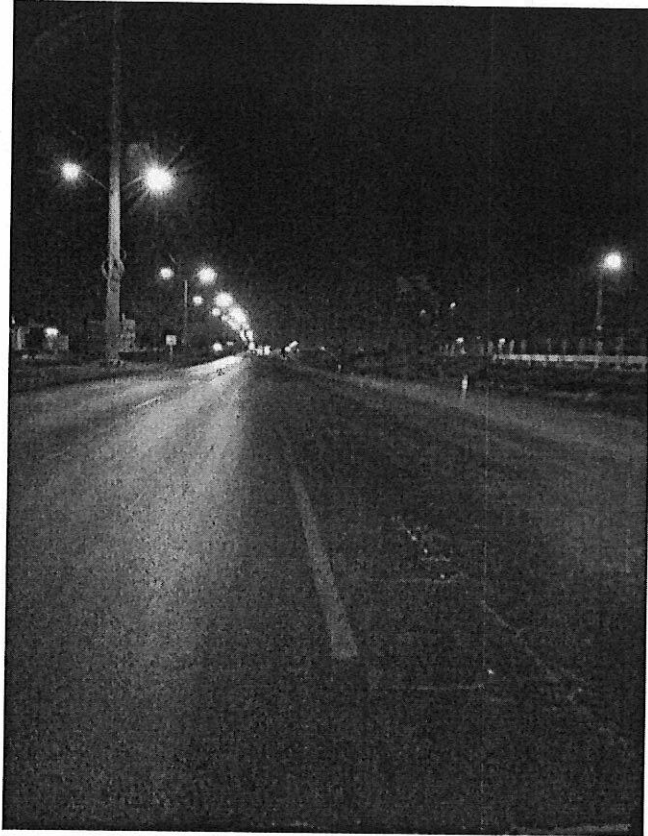

CALLE TECNOLOGICO TRAMO CALLE DESARROLLO A CALLE LOS ARCOS



[Handwritten signature]

31 DE OCTUBRE DE 2017

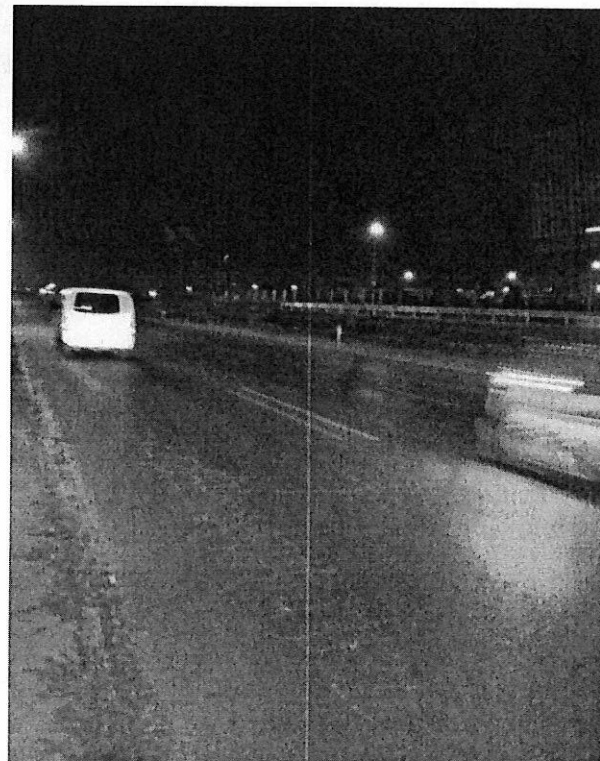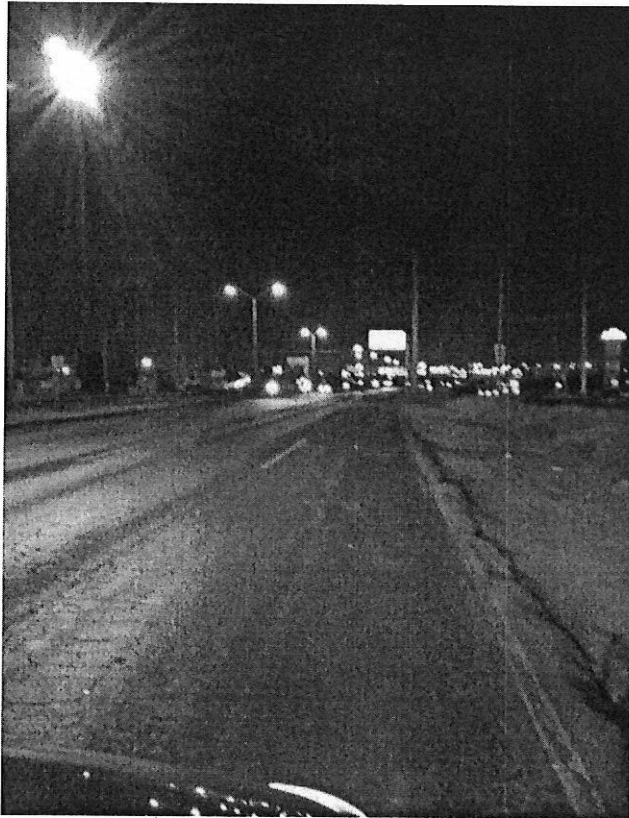

CALLE TECNOLOGICO TRAMO CALLE LOS ARCOS A CALLE DESARROLLO

31 DE OCTUBRE DE 2017

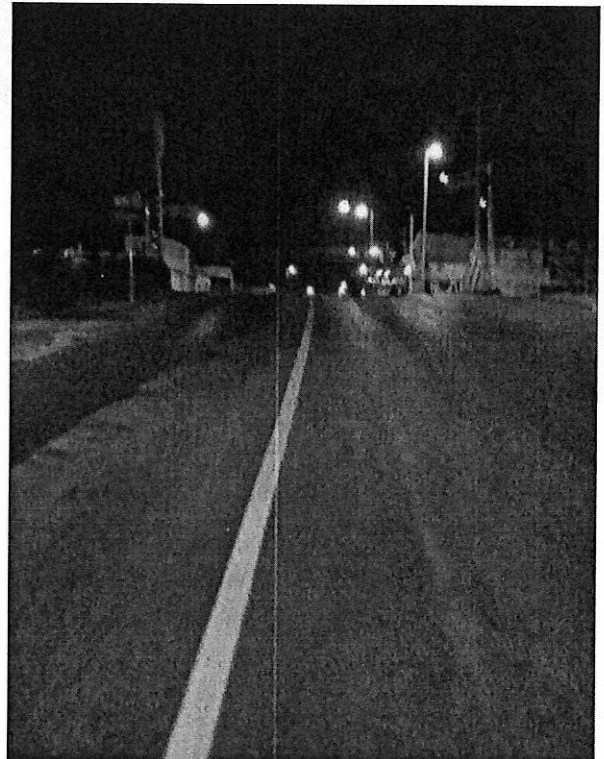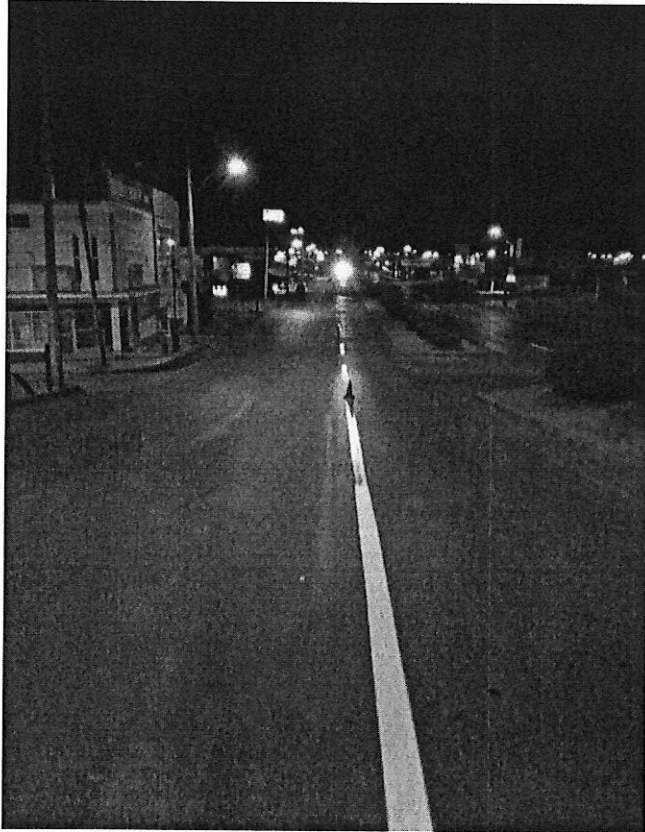

CALLE MONTEALBAN TRAMO H. COLEGIO MILITAR A AV. SACRAMENTO

Handwritten signature or mark.

22 OCT - 2017

FOLIO 009

SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO EN CALLE TECNOLÓGICO DE NORTE
A SUR CALLE DESARROLLO A CALLE LOS ARCOS.
DONDE SE PINTARON GUIONES BAYONETAS Y DE
BLANCO CAMELLONES EN AMARILLO. JUAN ESCUTIA
SE PINTARON GUIONES DE TECNOLÓGICO A AV.
INDUSTRIAS


23 OCT - 2017

CALLE MONTEALBAN GUIONES Y BAYONETAS DE
AV. HEROICO COLEGIO MILITAR A VIALIDAD SACRAMENTO

23-OCT-2017


FOLIO No 010

LINEA CENTRAL EN CALLE MIGUEL BARRAGAN
EN COLOR AMARILLO DE CALLE JUAN ESCUTIA
A CALLE PINO





24-OCT-2017

GUIONES Y BAYONETAS EN AV. TECNOLÓGICO DE
SUR A NORTE DE CALLE LOS ARBOS A CALLE
DESARROLLO



24, 25 y 26 OCT DE 2017

COLOCACION DE VIALETAS EN AV. TECNOLÓGICO
DE CALLE MERCURIO A CALLE BROADWAY EN
AMBOS SENTIDOS



26-OCT-2017

QUIONES EN AV. INDUSTRIAS DE AV. JUAN
ESUTIA A AV. HOMERO

