



OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

R.F.C: HEFO710611J88 Domicilio: 4A No. 6901-A
Colonia: NOMBRE DE DIOS C.P. 31110
Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA
SERIE: A
FOLIO: 40
FECHA: 15/11/2017 10:53:50

Documento Válido

Cliente: Municipio de Chihuahua
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: Calle Mina No. 408
Colonia: Col. Centro
Ciudad: Chihuahua

C.P.: 31000,
Estado: Chihuahua

Localidad: Chihuahua
País: Mexico

Cantidad	Descripción	Concepto	Presupuesto	Importe
1.00	No aplica	PAGO DE ESTIMACION PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 DEL CONTRATO 167/2017 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTO DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD DE ESTA CIUDAD	887,435.00	887,435.00
1.00	No aplica	0.2% DIF (AL MILLAR) ... \$ 1,774.87 0.2% CMIC (AL MILLAR) ... \$ 1,774.87 SUMA DE DESCUENTO ... \$ 3,549.74 SUMA DE ESTIMACION ... \$ 97,435.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 660 DESCUENTOS ... \$ 3,549.74 SUB-TOTAL ... \$ 883,685.26 I.V.A ... \$ 141,989.60 IMPORTE NETO A RECIBIR ... \$ 1,025,674.86	0.00	0.00

IMPORTE CON LETRA
UN MILLON VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL:	887,435.00
I.V.A.:	141,989.60
TOTAL:	1,029,424.60



✓ Efectos fiscales al pago

☐

FIRMA DE CONFORMIDAD

111.017315P473-A040-373D-9130-720180,900012017-11-15011163:051P1a5N018J 02/11/17
Nº de Póliza: 0000100000040-100000
Nº de Contrato: 0000100000040-100000
Nº de Factura: 0000100000040-100000
Nº de Cuenta: 0000100000040-100000
Nº de Cliente: 0000100000040-100000
Nº de Emisor: 0000100000040-100000
Nº de Destinatario: 0000100000040-100000
Nº de Fecha: 0000100000040-100000
Nº de Hora: 0000100000040-100000
Nº de Lugar: 0000100000040-100000
Nº de País: 0000100000040-100000
Nº de Ciudad: 0000100000040-100000
Nº de Estado: 0000100000040-100000
Nº de País: 0000100000040-100000

Serie de Certificados: 0000100000040-100000
P1a5N018J 02/11/17 0000100000040-100000
Nº de Póliza: 0000100000040-100000
Nº de Contrato: 0000100000040-100000
Nº de Factura: 0000100000040-100000
Nº de Cuenta: 0000100000040-100000
Nº de Cliente: 0000100000040-100000
Nº de Emisor: 0000100000040-100000
Nº de Destinatario: 0000100000040-100000
Nº de Fecha: 0000100000040-100000
Nº de Hora: 0000100000040-100000
Nº de Lugar: 0000100000040-100000
Nº de País: 0000100000040-100000
Nº de Ciudad: 0000100000040-100000
Nº de Estado: 0000100000040-100000
Nº de País: 0000100000040-100000

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT


Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



* Datos obligatorios



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEFO710611J88	OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7315F473-A040-473D-91A0-7A60F8019E60	2017-11-15T10:53:50	2017-11-15T11:53:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,029,424.60	ingreso	Vigente	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

HOJA DE RESUMEN FINAL

No. 1

PROGRAMA:
OBRA: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTO DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD DE
ESTA CIUDAD
OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
R.F.C. HEFO710611-J88

CONTRATO No. 167/2017 CONTRATADO \$ 1,104,425.00
ESTIMACION No. 1
PERIODO : DEL 06 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2017.
IMPORTE ESTIMADO \$ 887,435.00
IMPORTE ACUMULADO \$ 887,435.00

C O N C E P T O	I M P O R T E	O B S E R V A C I O N E S
PINTURA TRAFICO		

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION

\$ 887,435.00

DESCUENTOS:

0.2 % DIF (AL MILLAR).	\$ 1,774.87
0.2 % CMIC (AL MILLAR).	\$ 1,774.87
SUMA DESCUENTOS	\$ 3,549.74

RESUMEN:



SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 887,435.00
AMORTIZACION ANTICIPO (%)	
DESCUENTOS	\$ 3,549.74
SUB - TOTAL	\$ 883,885.26
I.V.A.	\$ 141,989.60
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 1,025,874.86

CON LETRA:
(UN MILLON VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.)

FORMULO: RESIDENTE DE OBRA ING. JESUS GARCIA REVISO JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON	ACEPTO: CONTRATISTA OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS Vo.Bo.: SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA AUTORIZO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
--	--

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL		CONTRATO No. 167 /2017 DEL 05 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2017. OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIAL. ZONA PERIFERICO DE LA JUVENTUD CONTRATISTA: OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS			Km. A Km. EST. No. 1 HOJA No. 1 DE 1		ORIGEN: PERIODO : DEL 06 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2017.		
O B R A (ESTACION Y DESCRIPCION)	C O N C E P T O			C A N T I D A D E S				RECIO UNITARIO (\$)	IMPORTE (\$)
	INCISO	DESCRIPCION	UNI	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA EST. ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION		
	1.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO VIAL DE 11 CM. DE ANCHO COLOR BLANCO Y AMARILLO.	ML.	47,850.64	47,850.64	-	47,850.64	\$ 7.41	\$ 354,573.23
	2.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO PARA PASOS PEATONALES	M2	938.14	938.14	-	938.14	\$ 110.00	\$ 103,195.40
	3.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMOPLASTICA EN LINEAS DE CARRIL	ML.	11,457.77	11,457.77	-	11,457.77	\$ 37.50	\$ 429,666.38
	4.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS BLANCAS Y AMARILLAS	PIEZA	4,131.00		-	-	\$ 40.00	\$ 0.00
	5.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA PASOS PEATONALES	M2	138.00		-	-	\$ 375.00	\$ 0.00
S U M A S									\$ 887,435.00
N O T A S				(OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)					
				LUGAR: CHIHUAHUA, CHIH.		ACEPTO:			
				FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2017		Contratista			
				ESTIMO:		OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS			
				ING. JESUS GARAY RUIZ		Vo.Bo.			
				REVISO:		Subdirector:			
				Jefe Depto. ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON		ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA			

PERIFERICO DE LA JUVENTUD

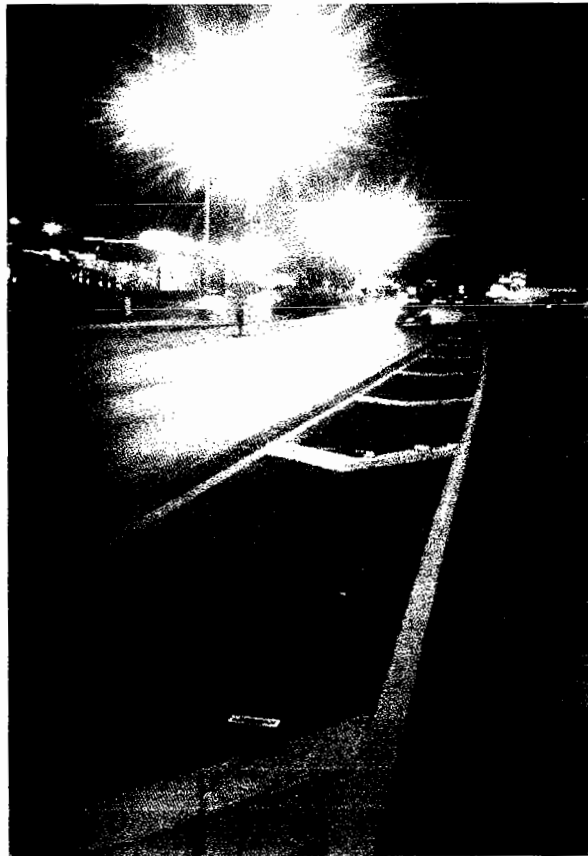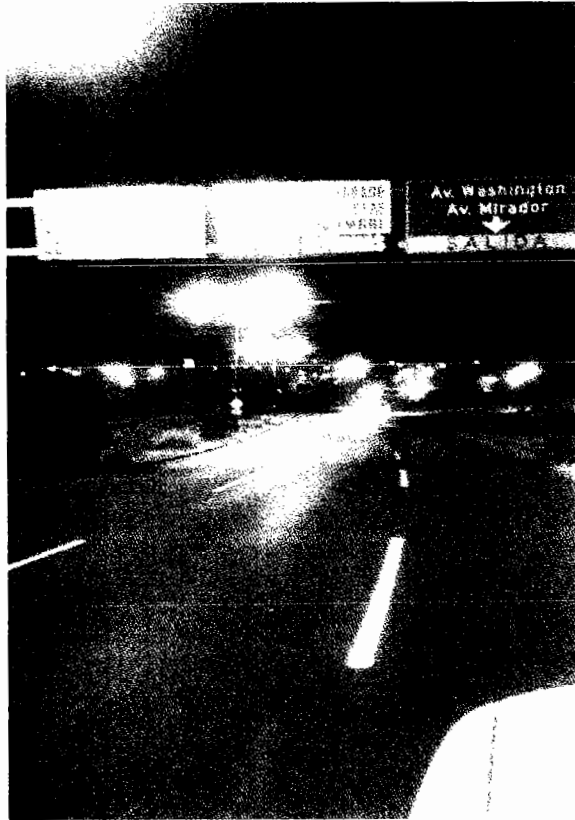


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]







[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

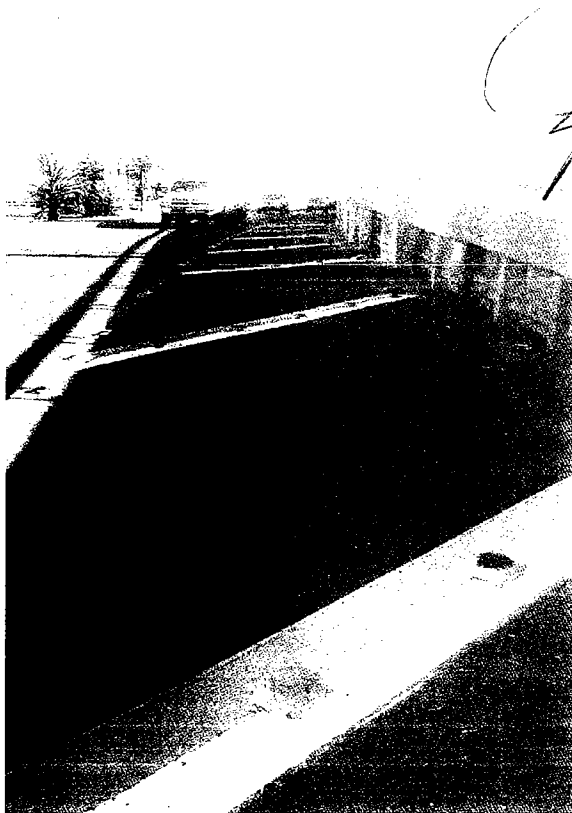

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

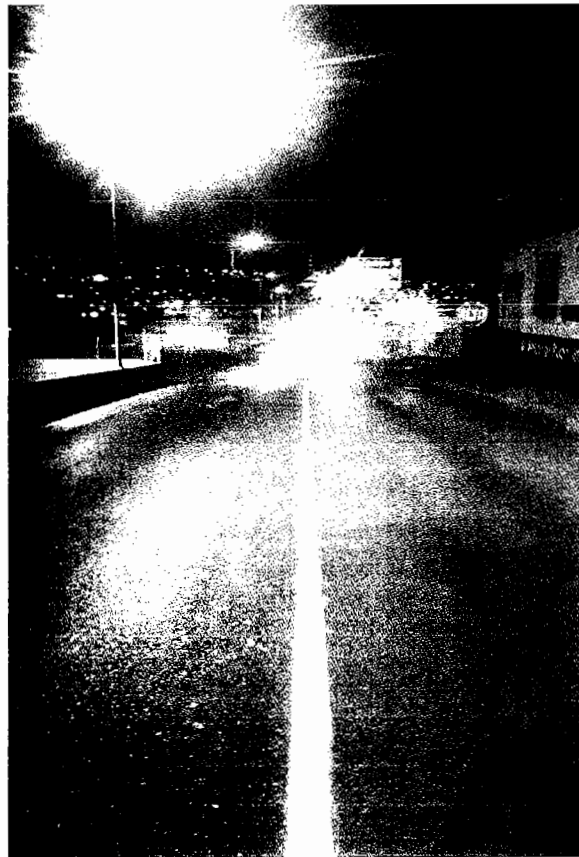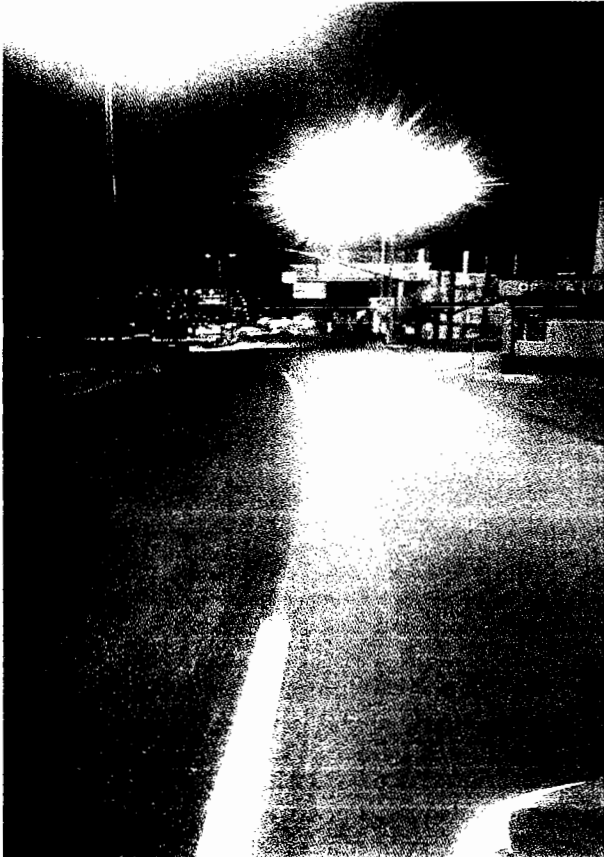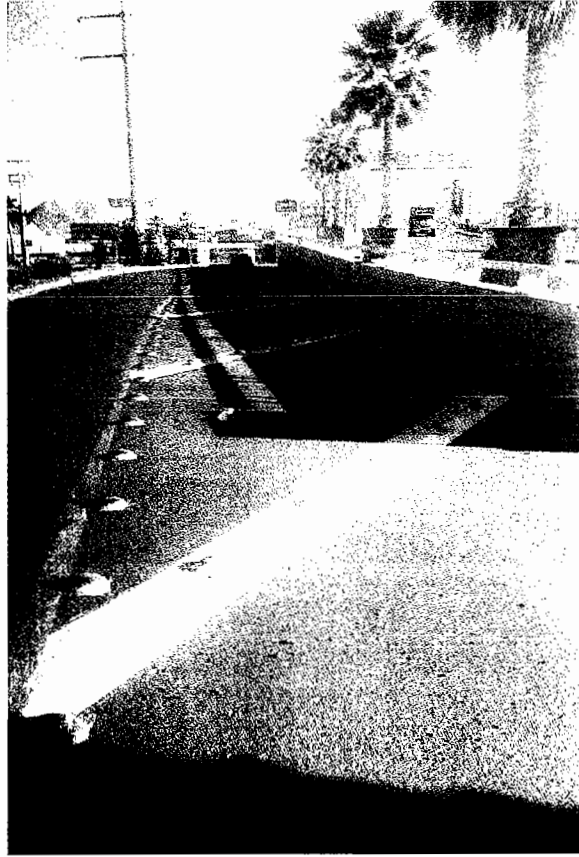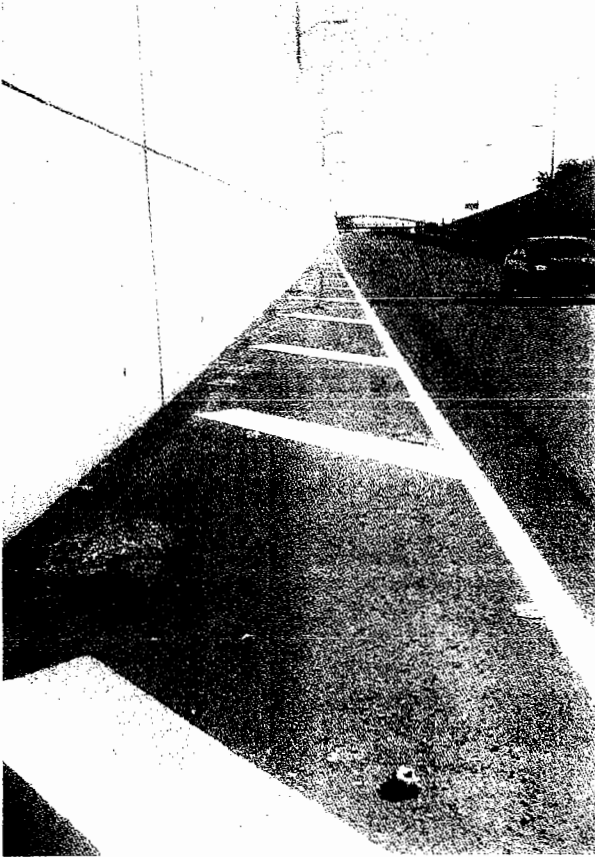

Handwritten signature

Handwritten signature

PERIFERICO DE LA JUVENTUD



8-OCTUBRE-2017

10:30 PM.

SE INICIA CON TRABAJOS DE PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE PARA
CARRILES EN INTERSECCION DE PERIFERICO Y CIRCUITO UNIVERSITARIO
HASTA LA FRANCISCO VILLA EN AMBOS SENTIDOS SOBRE EL CUERPO
CENTRAL.

SE APLICA PINTURA PARA PEATONAL TABLETADO EN CRUCE DE
PERIFERICO Y CIRCUITO UNIVERSITARIO, BAJO EL PUENTE.

TERMINANDO ACTIVIDADES 4:00 AM.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop followed by several smaller loops and a long horizontal stroke.

10:20 PM.

9-OCTUBRE-2017

SE REANUDAN ACTIVIDADES DE PINTURA VIAL DE FCD VILLA A HACENDAS
DEL VALLE EN CUERPO CENTRAL EN AMBOS SENTIDOS ASI COMO SE
COMIENZA CON EL REFIJADO DE ISLETAS DE NORTE A SUR HASTA
LA AVE. J. FRUTIN

3:00 AM



10:30PM.



10-OCTUBRE-2017

SE CONTINUA EL TRABAJO DE APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO
BASE SOLVENTE PARA LINEAS DE CARRETERA DE HACIENDAS DEL VALLE
A GLORIETA DE INTERSECCION CON AVE. TARCÓ.

4:50PM

SE AVANZA CON EL REPINTADO DE ISLETAS HASTA AVE DE LA CAJON
SE PINTA CANALIZADORAS DE PEATONAL DE JUNO ESCUTIA Y SE COMIENZA
CON EL PEATONAL DE Fco. Villa CON CANALIZADORAS

SE INICIA CON APLICACION DE PINTURA TERMOPlastica DE ESTADIO VALVER-
SITARIO A JUNO ESCUTIA CON COLOR BLANCO



11-OCTUBRE-2017

④

SE CONTINUA CON APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA DE LA
ESCALA A HACIENDAS DEL VALLE





12-OCTUBRE-2017

CONTINUA LA APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO AMARILLA EN LINEAS
CONTINUAS DE HACIENDAS DEL VALLE A CALLE EGIPTO

SE CONTINUA CON REPINTADO DE ISLETAS DE POLITECNICO NACIONAL A
CALLE GERMANOS

SE APLICA PINTURA TERMOPLASTICA EN QUILONES DE HACIENDAS DEL VALLE
A ORTIZ MENA.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

15-OCTUBRE-2017

SE CONTINUA CON EL PINTADO DE LINEAS CONTINUAS AMARILLAS DE CALLE
EGIPTO A ESTADIO UNIVERSITARIO.



REPINTADO DE ISLETA EN TUNEL EN CALLE GERMANOS

SE APLICA PINTURA TERMO PLASTICA EN LATERAL SUR- NORTE



16 OCTUBRE - 2017

SE CONTINUA CON EL REPINTADO DE ISLETAS EN SENTIDO SUR- NORTE
HASTA FCO. VILLA.

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'O' or 'G' shape followed by several sharp, intersecting strokes.A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, loopy 'B' or 'P' shape with multiple overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.
