



OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

R.F.C.: HEFO710611J88 Domicilio: 4A No. 6901-A
Colonia: NOMBRE DE DIOS, C.P. 31110
Ciudad: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA

SERIE: A

FOLIO: 44

FECHA: 23/11/2017 11:56:16

Documento Válido

Cliente: Municipio de Chihuahua
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio: Calle Mina No. 408
Colonia: Col. Centro
Ciudad: Chihuahua

C.P.: 31000,
Estado: Chihuahua

Localidad: Chihuahua
País: Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	PAGO DE ESTIMACION PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 DEL CONTRATO 167/2017 DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTO DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD DE ESTA CIUDAD	216,990.00	216,990.00
1.00	No aplica	0.2% D.T.F. (AL MILLAR)..... \$ 433.98 0.2% C.M.I.C. (AL MILLAR)..... \$ 433.98 SUMA DE DESCUENTO..... \$ 867.96 SUMA DE ESTIMACION..... \$ 216,990.00 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 0.00 DESCUENTOS..... \$ 867.96 SUB-TOTAL..... \$ 216,122.04 I.V.A..... \$ 34,718.40 IMPORTE NETO A RECIBIR..... \$ 250,840.44	0.00	0.00

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 40/100 M.N.

SUBTOTAL:	216,990.00
I.V.A.:	34,718.40
TOTAL:	251,708.40



☒

FIRMA DE CONFORMIDAD

111.61F58187A-2150-44E6-A7e1-8109500960B712017-11-23T17:56:16Z0172017VpDP12q5B0uT
p0D1DVK9d3pW70rem4MwHqpc0APR4TPT5015aUDnhtzE8H50x01VgVUy9krNYXvP
JuAk0966PDrAp-a2m1gN1c0503+cl71-5n27MVMS/dRcaTLwlgqTzQFENa9an+9ZPodzk9s03
604augacxwTlg1e12evf1PnSgAG1au4sC0ny1QYeRRKZvhE8TID+DrA9zw+nTAQbA/PhiaIHJDBSnjx
r5nPh3D/Gh4rN1jBnSam7w0yWRAK1A2qm+YD17H5tQnaK1PzoF/ap3/vyZyLT19sGaJacPU188S4Duy1WZw==
y1WZw==[000010000004041860741]

Serie de Certificado: 00001000000406199622
Y20TrVpDP12q5B0uTpcD10JkEbzp0Nkren4HwVlqpmx0ARNeKIPTz50f5aUDnhtzE8H50x01VgVUy9krNYXvP
+5Ym16u046YJuAk0966EDnYAp6m8m1gN1c0GUX+uYS1c5n27MVMS/dRcaTLwlgqTzQFENa9an+9ZPodzk9s03
1DPxn804augacxwTlg1e12evf1PnSgAG1au4sC0ny1QYeRRKZvhE8TID+DrA9zw+nTAQbA/PhiaIHJDBSnjx
5nPh3D/Gh4rN1jBnSam7w0yWRAK1A2qm+YD17H5tQnaK1PzoF/ap3/vyZyLT19sGaJacPU188S4Duy1WZw==

✓ Efectos fiscales al pago


Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal *

RFC emisor *

RFC receptor *




Proporcione los dígitos de la imagen *

* Datos obligatorios

Verificar CFDI


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HEFO710611J88	OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS	MCI651010V22	Municipio de Chihuahua
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5816B7A-2150-43B6-A761-910950D96DB7	20172311T11:56:16	2017-11-23T12:56:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$251,708.40	ingreso	Vigente	



Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- Política de privacidad (<https://www.gob.mx/privacidad>)
- Términos y Condiciones (<https://www.gob.mx/terminos>)



HOJA DE RESUMEN FINAL

No. 1

[illegible]

[illegible]

VALIDACION JUVENTUD

PEATONALES


CALLE DE LA EDUCACION

	LONGITUD		
CANALIZADORA	117.6	0.4	47.04
FRENAJE	41.3	0.4	16.52
			<u>63.56</u>




POLITECNICO NAL.

	LONGITUD	PZAS.	ML		
FRENAJE	31	1	31		
TABLON	0.5	2	1		
	1.1	2	2.2		
	1.9	1	1.9		
	2.5	18	45		
	2.2	1	2.2		
	1.5	1	1.5		
	2.5	17	42.5		
	2.8	21	58.8		
			<u>186.1</u>	0.4	74.44

RESUMEN	
METRO CUADRADO	138.004




PEATONAL TERMOPLASTICO EN JUVENTUD
CON CALLE DE LA EDUCACION

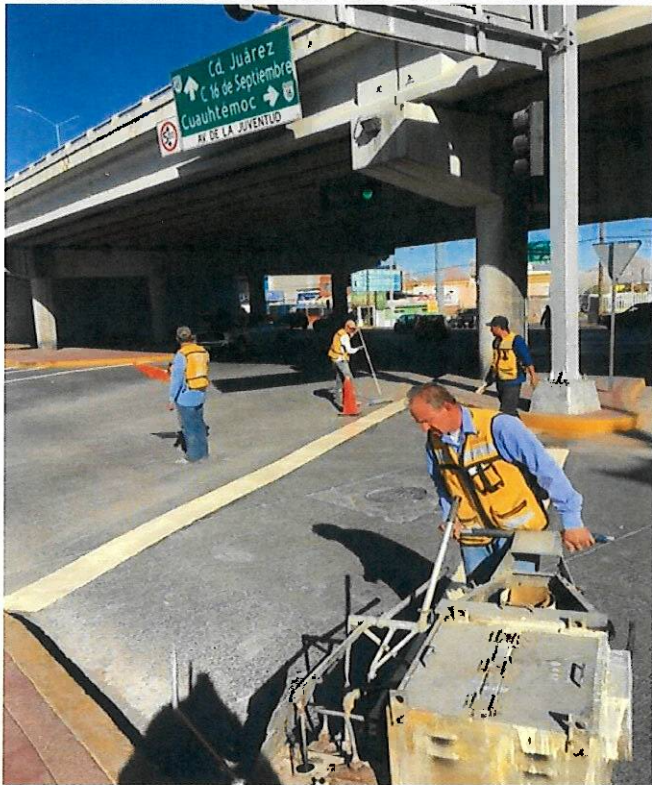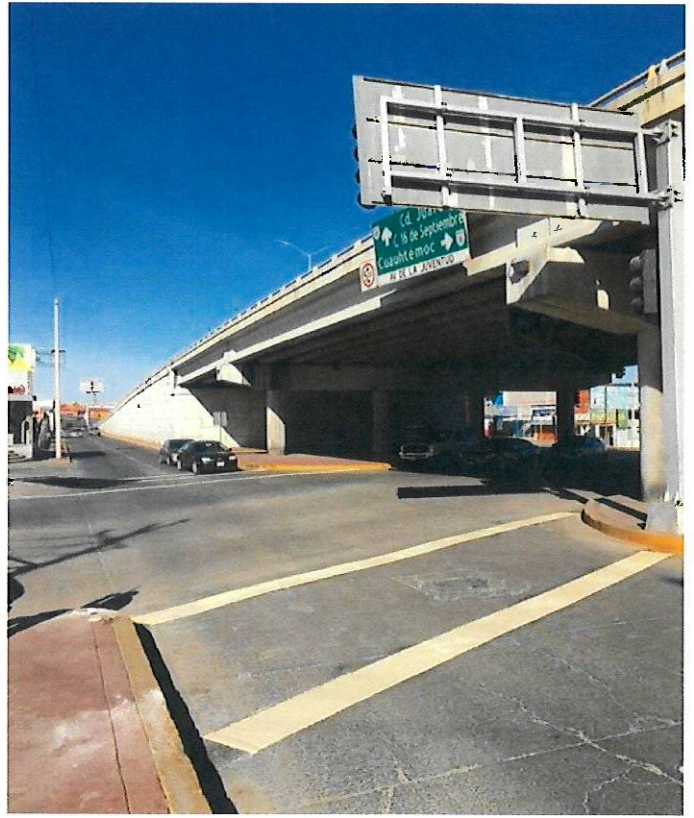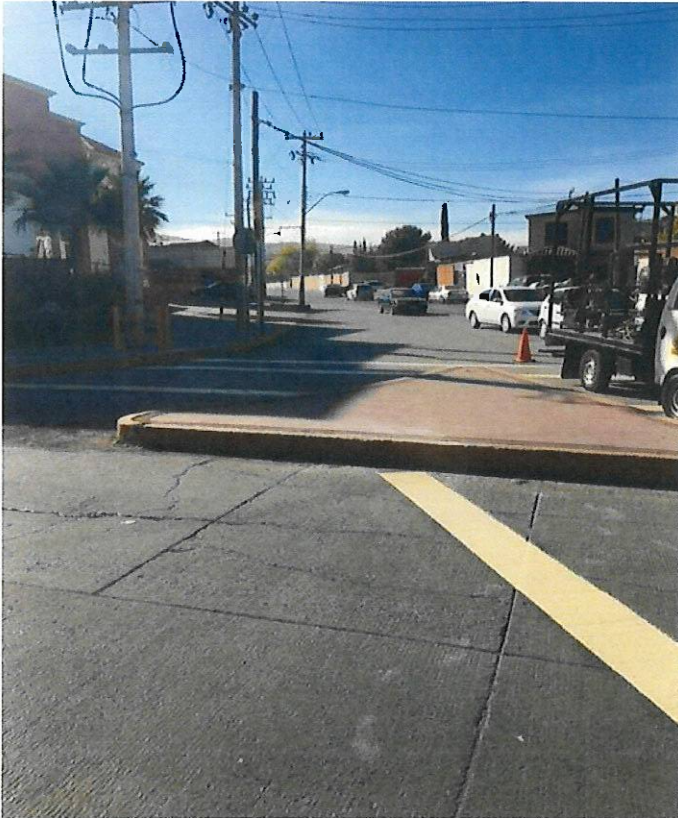

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




PEATONAL CON TERMOPLASTICO EN JUVENTUD
Y POLITECNICO NACIONAL

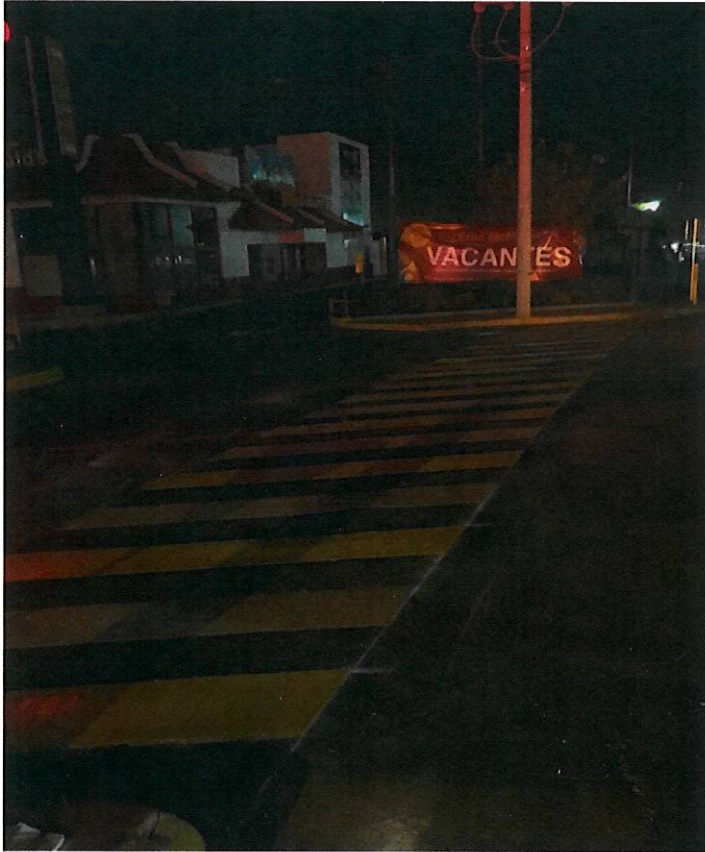

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VIALETAS EN JUVENTUD

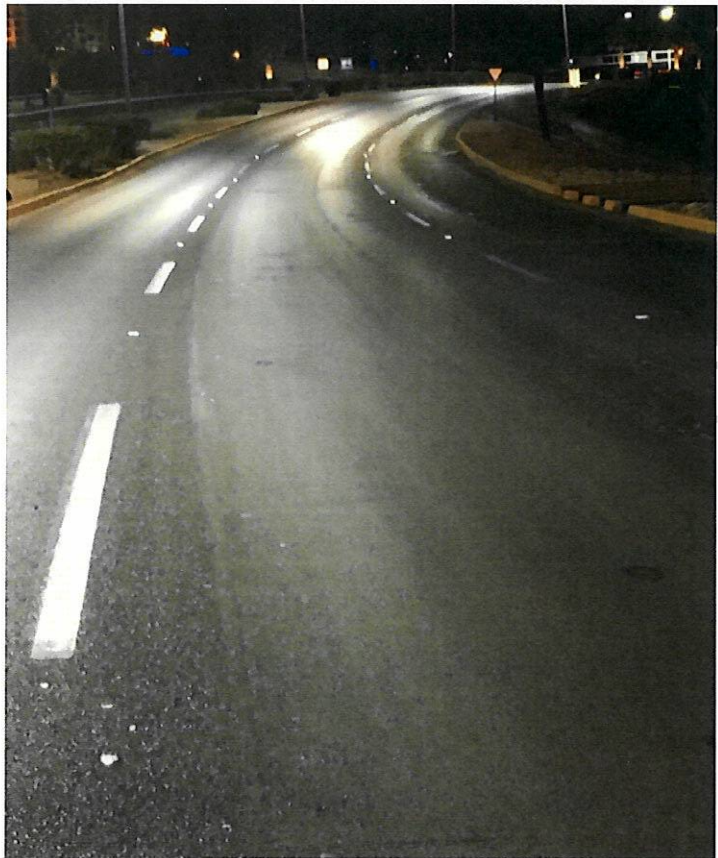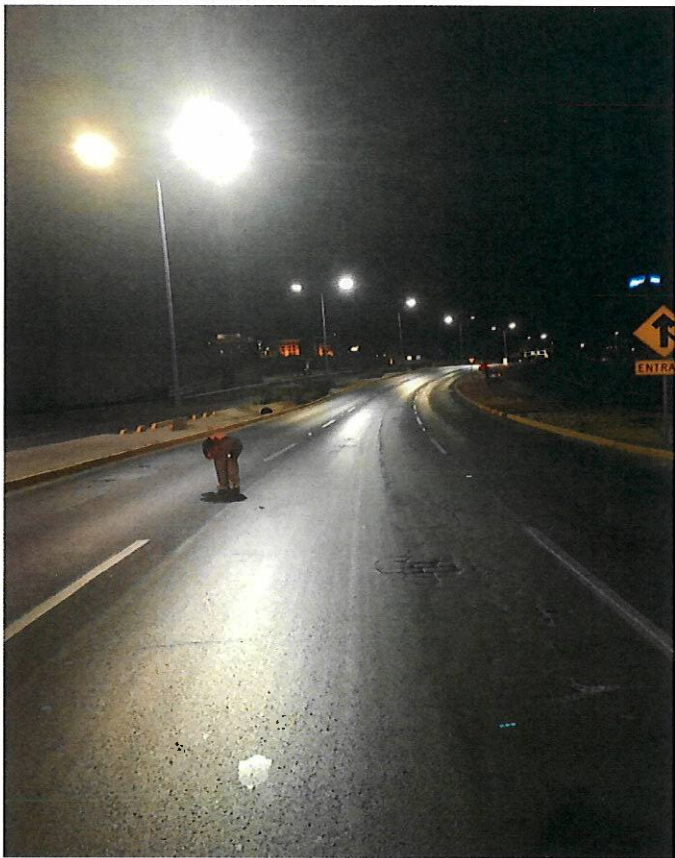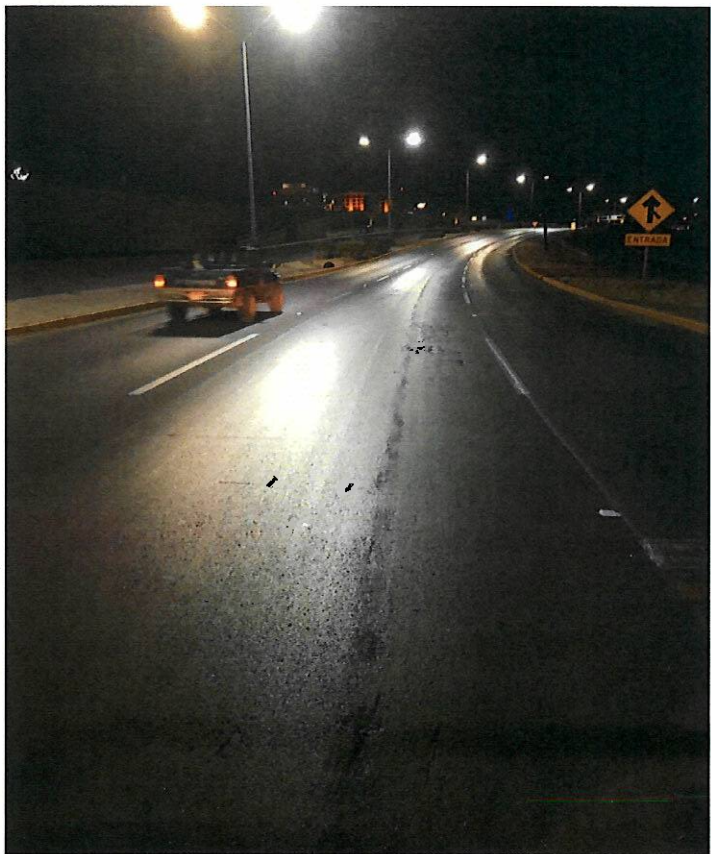



[Handwritten signature]

7:15 AM.

19-OCTUBRE-2017

SE INICIA TRABAJO PARA APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN
LINEAS CANALIZADORAS PEATONALES EN CONCRETO PERIFERICO DEL JUVENIL Y
CALLE DE LA EDUCACION.

3:15 PM. SE TERMINA CRUCERO





6:45 am.

20-NOVIEMBRE

20-OCTUBRE-2013



SE INICIA TRABAJO PARA TRAZO Y APLICACION DE PINTURA
TERMOPLASTICA EN PERIODO DE PERFECCION DE LA INGENIERIA Y POLITECNICO
NACIONAL

3:00 PM.



22-OCTUBRE-17

SE INICIA CON INSTALACION DE VINJETAS REFLECTANTES COLOR BLANCO
DE UN REFLECTANTE EN SENTIDO NORTE-SUR EN CUERPO CENTRAL DE
PERIFERICO



30-OCTUBRE-17

SE TERMINA CON LA INSTALACION DE VINJETAS EN PERIFERICO DE LA
INTERSECCION, DANDO POR CONCLUIDO LOS TRABAJOS

