

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN ESCUELA PRIMARIA**
 CARACTERÍSTICAS: CONSISTE EN LO SIGUIENTE. ESTRUCTURA CONFORMADA CON 10 ZAPATAS /
 CIMENTACIONES DE CONCRETO ARMADO Y 10 COLUMNAS DE ACERO DE TIPO DE 6" X
 CONTRATO: 090/2018
 MONTO DE CONTRATO: \$1,080,428.50
 CONTRATISTA: INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 10/10/2018
 FECHA DE INICIO REAL: 10/10/2018
 FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 10/12/2018
 FECHA DE TERMINO REAL: 03/12/2018

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

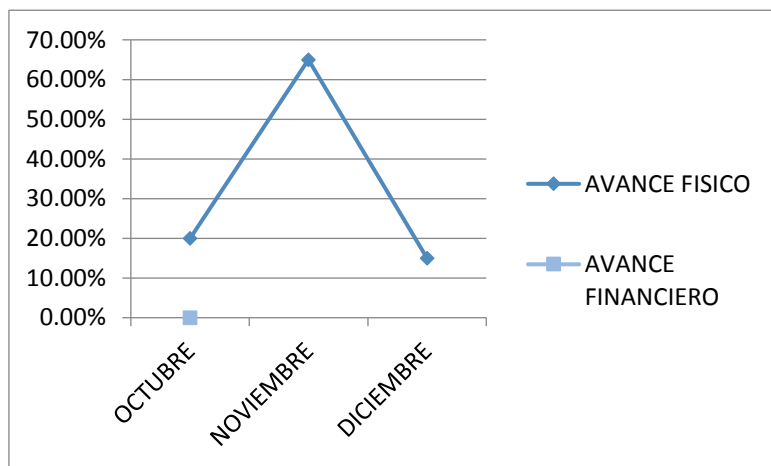

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	20.00%
NOVIEMBRE	65.00%
DICIEMBRE	15.00%
TOTAL:	100.00%



A FEDERAL
AISLADAS Y 20
3/16" Y 2 FIES



AVANCE FINANCIERO
30%
45%
25%
100%
