

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COLONIA AEROPUERTO I Y II No CONTRATO 102/2018
OFICIO DE AUTORIZACION No.
CARACTERISTICAS: CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS

MONTO DE CONTRATO: \$1,789,687.79 CON IVA

CONVENIO CON IVA

CONTRATISTA: STAHAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 22 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 14 DE DICIEMBRE DE 2018

AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ - 0.00%
REAL: \$ - 0.00%
PROGR. REAL

POR PARTIDA


1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	

POR PARTIDA

PROGR. REAL

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

13%

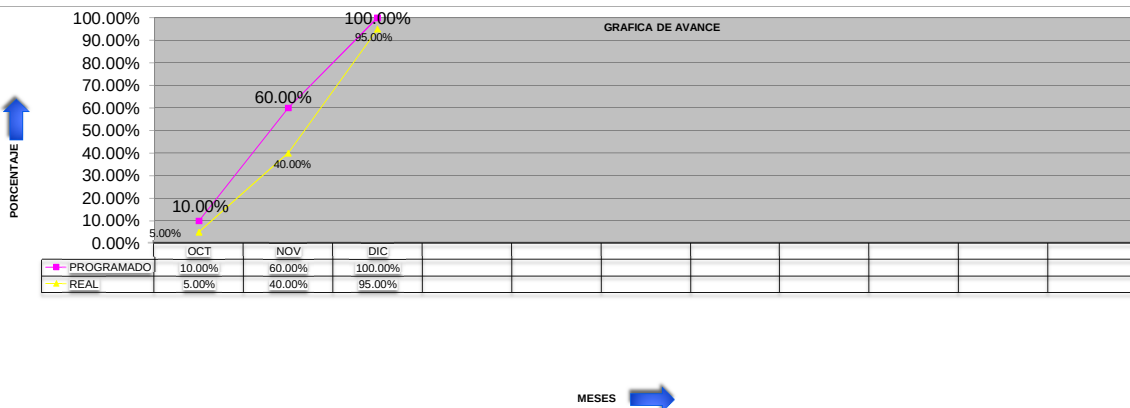

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

OBSERVACIONES: SE TERMINA TRAMO DEL PERIF LOMBARDO TOLEDANO ENTRE VIAS DEL FFCC Y C 1A. SE AMPLIAN METAS POR SUFICIENCIA DE RECURSO

