

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA


OBRA: **ESC. PRIM. FEDERAL VICENTE SUAREZ CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA**
 CARACTERÍSTICAS: **ESC. VICENTE SUAREZ:** CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL
 2 EJES, CON 10 ZAPATAS AISLADAS Y 20 DADOS DE CONCRETO ARMADO, 10 C
 ACERO, VIGAS TIPO IPR Y CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA AUTOSOPORTANTE
 AREA 627.76 M2) **ESC. 24 DE FEBRERO:** ESTRIBO
 CONFORMADA CON 10 ZAPATAS AISLADAS Y 20 DADOS DE CONCRETO ARMADO
 COLUMNAS DE ACERO DE TUBO DE 6" X 3/16" Y 2 EJES DE VIGA IPR EN 54 M.L
 CONEXIÓN DE 1/2" Y LAMINA GALVANIZADA AUTOSOPORTANTE CAL. 22 Y EL
 LAMINA DE REFUERZO CAL. 20 EN UN ANCHO DE 1.50 M. EN CADA UNO. (AREA

CONTRATO:	108/2018
MONTO DE CONTRATO:	\$2,406,963.14
CONTRATISTA:	OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTRATO:	26/10/2018
FECHA DE INICIO REAL:	26/10/2018
FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTRATO:	04/12/2018
FECHA DE TERMINO REAL:	04/12/2018

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

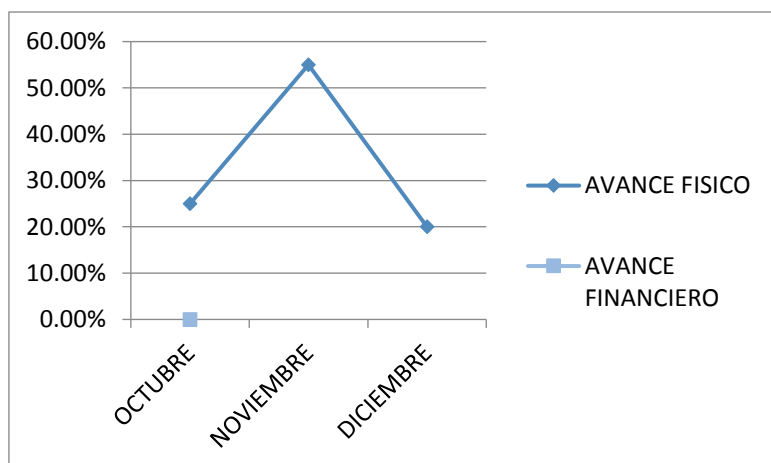

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	25.00%
NOVIEMBRE	55.00%
DICIEMBRE	20.00%
TOTAL:	100.00%



A TIPO DOMO

OL, A BASE DE
COLUMNAS DE
ANTE CAL 20 (
UCTURA
IMADO, Y 10
.., PLACAS DE
N EXTREMOS
(DE 492.75 M2)



AVANCE FINANCIERO
30%
42%
28%
100%
