

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN BÁSICA

OBRA: **PRIM. IGNACIO ZARAGOZA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO**

CARACTERÍSTICAS: **ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA:** 728.85 KG DE ACERO PARA CIMENTACIÓN [1,915.00 KG DE TUBO DE ACERO EN COLUMNAS
444.55 M2 DE LAMINA AUTOSOPORTANTE

ESC. TECNICA N. 96: CONSTRUCCION DE DOMO (462.00 m2) Y EXPLANADA CIV
, EL DOMO A BASE DE 2 EJES, CON 10 ZAPATAS AISLADAS Y 20 DADOS DE
ARMADO, 10 COLUMNAS DE ACERO, VIGAS TIPO IPR Y CUBIERTA DE LAMINA
AUTOSOPORTANTE CAL 22.

CONTRATO: 109/2018

MONTO DE CONTRATO: \$2,059,863.33

CONTRATISTA: STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALENDARIZACIÓN


FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: 27/10/2018

FECHA DE INICIO REAL: 27/10/2018

FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: 05/12/2018

FECHA DE TERMINO REAL: OBRA EN PROCESO

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

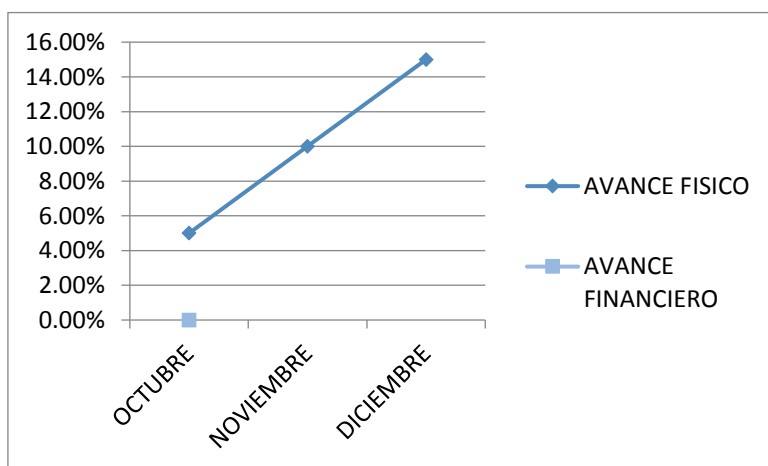

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	5.00%
NOVIEMBRE	10.00%
DICIEMBRE	15.00%
TOTAL:	30.00%



D 17.00 X 26.15

DEL No 3,4 y 5

ICA (504.78 m2
CONCRETO
GALVANIZADA



AVANCE FINANCIERO	
	30%
	18%
	0%
	48%
