

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

INFORMACIÓN BÁSICA


OBRA: **PINTURA EN BARDAS Y CONEXIÓN A DRENAJE EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 6**
 CARACTERÍSTICAS: **PINTURA EN BARDAS Y CONEXIÓN A DRENAJE EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 6**
UBICADA EN C. 74 DE LA COL. VISTAS CERRO GRANDE

CONTRATO: **110/2018**
 MONTO DE CONTRATO: **\$109,837.82**
 CONTRATISTA: **JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ**

CALENDARIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO, SEGÚN CONTATO: **29/10/2018**
 FECHA DE INICIO REAL: **29/10/2018**
 FECHA DE TERMINO , SEGÚN CONTATO: **05/11/2018**
 FECHA DE TERMINO REAL: **05/11/2018**

AVANCE FISICO Y FINANCIERO

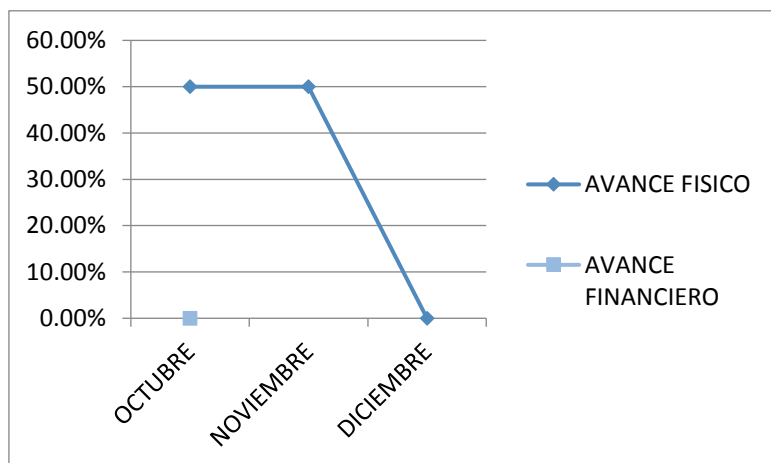

MES	AVANCE FISICO
OCTUBRE	50.00%
NOVIEMBRE	50.00%
DICIEMBRE	0.00%
TOTAL:	100.00%

[Redacted]

5227, UBICADA

RIA NO. 6227,

[Redacted]

[Redacted]

AVANCE FINANCIERO	
	1%
	1%
	1%
	3%
