

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LATERAL NORTE EN AV. LA CANTERA-PARQUE INDUSTRIAL AMERICAS" No CONTRATO 018/2017
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-029

CARACTERISTICAS: SE TRABAJARA CON ESTRUCTURAS, SUBESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA Y LOSAS DE ACCESO

MONTO DE CONTRATO: \$3,527,705.94 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 10 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 24 DE JUNIO DE 2017
DIFERIMENTO EN TIEMPO DE TERMINACION POR REPROGRAMACION:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FISICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: \$ 1,411,082.38 40.00%
REAL: \$ 2,017,903.43 57.20%

POR PARTIDA		PROGR.	REAL	POR PARTIDA		PROGR.	REAL
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8							

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %

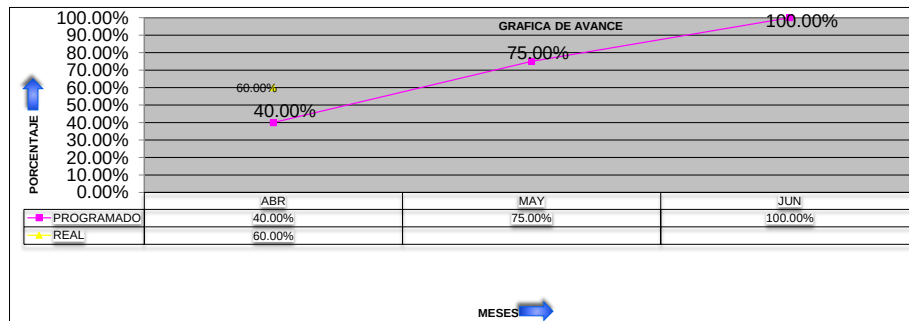

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

DEMOLICIONES
TERRACERIAS
CONCRETO HIDRAULICO
TRABAJOS DIVERSOS
SUB BASES Y BASES
MATERIALES ASFALTICOS
SEÑALAMIENTO
OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS

