

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA No CONTRATO 057/2017
OFICIO DE AUTORIZACION No.

CARACTERÍSTICAS: SE TRABAJARA CON LA CONSTRUCCION DE SUB ESTRUCTURA Y ESTRUCTURA DE GAZA (ZAPATA, COLUMNA, MARCOS, CABEZAL, LOSA Y GUARNICION) CON UN ANCHO TOTAL DE 9.80 DE ANCHO, TIERRA ARMADA, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO Y RED ELECTRICA.

MONTO DE CONTRATO: \$69,770,176.67 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO**

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MERP Y EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 22 DE MAYO 2017
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 30 DE MAYO 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 17 DE DICIEMBRE DE 2017
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTECIPADO:
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCION

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO: 84.96%
REAL: 60%

POR PARTIDA			POR PARTIDA		
	PROGR.	REAL		PROGR.	REAL
1			9		
2			10		
3			11		
4			12		
5			13		
6			14		
7			15		
8					

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN % 60

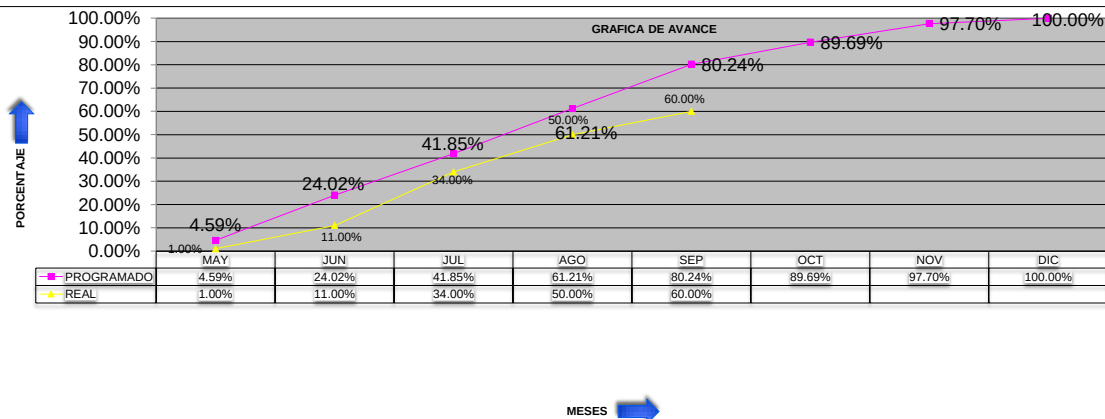

ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

OBSERVACIONES:

- 21 de Septiembre del 2017** Se colaron 2 trabes tipo AASTHO 5, para el tramo Ampliacion del punto A al B Y B al marco 1.
- 22 de Septiembre del 2017** Se realiza el colado de guarnicion zona norte punta de bala en inicio de ampliacion de carril.
Se colo dala de desplante para escamas lado derecho en tierra armada.
- 23 de Septiembre del 2017** Llegan trabes metalicas para el tramo 2- 3 VIGA 1 por separadas para hacer la conexi3n en campo.
Se realiza el colado del cabezal prefabricado del marco 1.
- 25 de Septiembre del 2017** Se realiza el colado de dala de desplante para escamas lado izquierdo.
Se colaron los muros de proteccion de tubos en tierra armada.
- 26 de Septiembre del 2017** Se colo dala de desplante para escamas lado izquierdo en escalon.
Se colo zapata para parapeto ubicado en la pila 4.
- 27 de Septiembre del 2017** Se colo guarnicion de parapeto ubicado en la pila 4.
Se colaron los diafragmas del tramo (7 - 8).
Se inicia con la colocacion de escamas lado derecho.
- 28 de Septiembre del 2017** Se inicia con la colocacion de metalosa en el tramo (7-8).
Se trabaja en la conexi3n en campo de la trabe metalica tramo (2-3) Viga 1.

COLOCACION DE ESCAMAS.



COLADO DE CABEZAL PREFABRICADO DEL MARCO 1



CONEXIÓN EN CAMPO DE VIGA 1 TRAMO 2-3.



CIMBRADO DE DIAFRAGMAS.

