



Luis Manuel Gonzalez Ituarte

RFC: GOIL530621B50

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: A-1205

Fecha: 2023-03-14T08:46:21

Versión: 3.3

Tipo De Comprobante: 1 - Ingreso

Control.
001/2023

RECEPTOR: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22

No. Certificado: 00001000000510924913 Lugar de Expedición: 31350 Uso CFDI: I01 - Construcciones Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00	NA	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN. ESTIMACIÓN NUMERO 1 (UNO) SEGÚN CONTRATO NUM. 001/2023 ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN \$153,363.50 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$0.00 RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO 0.2% C.M.I.C. \$306.73 0.2% D.I.F. \$306.73 SUMA \$613.46 NETO A RECIBIR \$177,288.20 ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio Noidentificación: 49632 ClaveProdServ: 72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios	\$ 153,363.50	\$ 153,363.50

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	153363.50	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 24,538.16

Importe en letra: Ciento Setenta y Siete Mil Novecientos Un Pesos 66/100 M.N.

SubTotal:	\$ 153,363.50
IVA 16%	\$ 24,538.16
Total:	\$ 177,901.66



Número de Serie del Certificado:
00001000000509846663

Fecha y hora de Certificación:
2023-03-14T09:48:13

RFC Proveedor de Certificación:
LSO1306189R5

UUID:
03d4c1a1-8c47-4691-a85d-fb4c75555d15

Sello CFD:

J3jBTREU30OhjsdVilqaJ2M8ZfoGBBt10poLcbmqwvqlHTQ2ewW3vHJs5nEYh57pV17Xd3+xxQZWDvgE3hLLbp1Lo1kZ+q/LKp/w554sUiU66bbu69F/ZvPxs68Ce7HE9RILhdukD5u0HsO0lqunilyNPI4QOxHopR8pUC1R4uiQJ4pwiHSD45EdYYAP29cp1t34jCzdSHghZS6A3A9xRmKxhWjfg/GbR8VPI5i32PGCCA7qDMeqU7+ukVQNiXG9zf5qw3l48wOxZCn6Nd+hQhm04xHasf15nlnsGv+TV+sS7qYBtEIO/szTk/P0poh5C8XYgHD9DI+PA8JvA==

Sello SAT:

nRTT95UwDT9TetiqrADBmfuNX7ZYX54+KZcY+FvsN/P64gMspRKWfKpBmekH1NHqeJfT103AF+kZyr1/8CuSROLg79qv9fd5RjgRvhsoABhbVZg/ANqwjDg/O0LEvKh0PIDXYDqBL0QGH+3RfoVfr1D2/eG3ts10Hzo+vc6soZ5w5srR0HFRxTpR66Se0f6hgdk+1ypQNzGcemlbFD1cn06GF3lznbnvIQCsWDATRXdF8CBdiPju5NuAK/T8P2Pue6sa7z+keFMqoNdcqxruxUeAJNWK0WNLz9YRM0HAuUQHLEQ6AEwF3NU3ZSJ1ZGG8h1f6hiN9SKKcFEYsXb/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03d4c1a1-8c47-4691-a85d-fb4c75555d15|2023-03-14T09:48:13|LSO1306189R5|J3jBTREU30OhjsdVilqaJ2M8ZfoGBBt10poLcbmqwvqlHTQ2ewW3vHJs5nEYh57pV17Xd3+xxQZWDvgE3hLLbp1Lo1kZ+q/LKp/w554sUiU66bbu69F/ZvPxs68Ce7HE9RILhdukD5u0HsO0lqunilyNPI4QOxHopR8pUC1R4uiQJ4pwiHSD45EdYYAP29cp1t34jCzdSHghZS6A3A9xRmKxhWjfg/GbR8VPI5i32PGCCA7qDMeqU7+ukVQNiXG9zf5qw3l48wOxZCn6Nd+hQhm04xHasf15nlnsGv+TV+sS7qYBtEIO/szTk/P0poh5C8XYgHD9DI+PA8JvA=|00001000000509846663||

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 2023-PDMREF/22-DE-011	CONTRATO No. 001/2023	CONTRATADOS
OBRA: MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	\$ 262,223.29 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 177,901.66 CON IVA
CONTRATISTA: ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC RFC: GOIL-530621 B50	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 177,901.66 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
NORMALES	\$ 153,363.50	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 153,363.50

DESCUENTOS		
	\$	
0.2% C.M.I.C.	\$	306.73
0.2% D.I.F.	\$	306.73
SUMA DESCUENTOS	\$	613.46
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	153,363.50
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	153,363.50
I.V.A.	\$	24,538.16
TOTAL	\$	177,901.66
(CON LETRA)		
(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 66/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	613.46
SALDO NETO A RECIBIR	\$	177,288.20

ANTORIZO	ELABORO
ING. JUAN EMILIO JAIME HERNÁNDEZ	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ	ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
Jefa del DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Vo. Bo.	



CHIHUAHUA, CHIH.,

14 DE MARZO DEL 2023

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, LA CANTIDAD DE: \$ 177,288.20
(CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) CONTRATO No. 001/2023 POR LA CANTIDAD DE : \$ 262,223.29
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 29/100 M.N.) POR TRABAJOS EN LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	153,363.50
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	
	SUBTOTAL	\$	153,363.50
	IVA	\$	24,538.16
	TOTAL	\$	177,901.66
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO			
C.M.I.C. 0.2%	306.73		
D.I.F. 0.2%	306.73		
SUMA	613.46		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 262,223.29
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 177,901.66
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 177,901.66
POR EJERCER	\$ 84,321.63

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 306.73	\$ 306.73
ACUMULADO ACTUAL	\$ 306.73	\$ 306.73

R E C I B I M O S

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE
RFC: GOIL-530621 B50



OBRA: MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA: ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE
PERÍODO: 13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
No. CONTRATO: 001/2023

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
-----	-----------------------------	---------

NORMALES	\$	153,363.50
-----------------	----	------------

SUBTOTAL	\$	153,363.50
I.V.A.	\$	24,538.16
TOTAL	\$	177,901.66

POR EL DPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA DE LA DOPM.

ING. JUAN LAURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

ING LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE



CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		

OBRA NORMAL											\$ 153,363.50
1	RETIRO DE PISO DE MADERA Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	m2	300.00	193.50	0.00	193.50			\$	94.38	\$ 18,262.53
2	ELABORACION DE FRANJA DE ABSORCION PARA HUMEDAD DE 25 CM DE ANCHO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE COLOCACION DE GRAVA Y PIEDRA ORNAMENTAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m	74.00	51.50	0.00	51.50			\$	212.96	\$ 10,967.44
3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 95%	m3	40.00	39.85	0.00	39.85			\$	441.65	\$ 17,599.75
4	PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON COLOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10	m2	264.00	168.25	0.00	168.25			\$	485.52	\$ 81,688.74
5	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO EN FORMA ARTESANAL AL FRESCO, DE 25 CM DE ANCHO, INCLUYE DISEÑO ARQUITECTONICO POLICROMATICO Y SELLADOR TRANSPARENTE.	m	72.00	49.50	0.00	49.50			\$	501.92	\$ 24,845.04

SUBTOTAL	\$	153,363.50
IVA	\$	24,538.16
TOTAL	\$	177,901.66

POR EL DPTO. DE CONSTRUCCIÓN URBANA DE LA DOPM.
ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

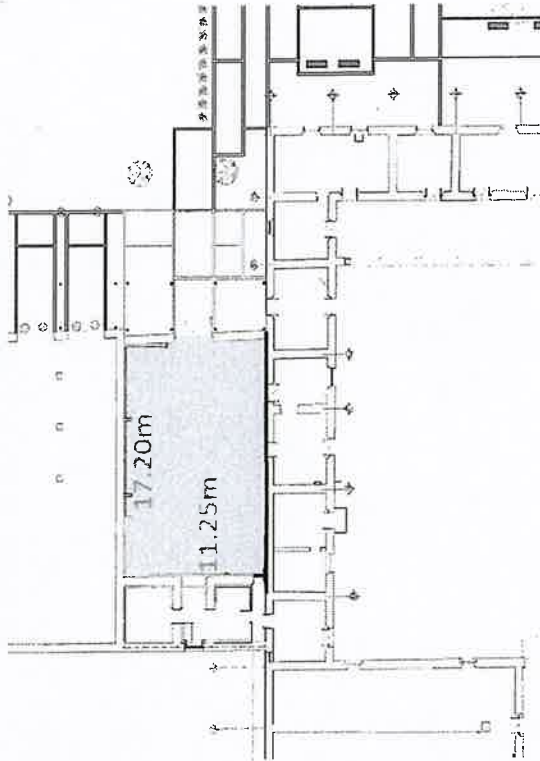
Ing. Luis Miguel González Ituarte
CONTRATISTA

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

CROQUIS DE LA ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	1.00	
RETIRO DE PISO DE MADERA Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA		
		

RESIDENTE

ING. JUAN AUREANO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

Nº. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	1.00
RETIRO DE PISO DE MADERA Y ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA	
	

RESIDENTE
ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

Nº. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				VOLUMEN A PAGAR	
	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
ELABORACION DE FRANJA DE ABSORCION PARA HUMEDAD DE 25 CM DE ANCHO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE COLOCACION DE GRAVA Y PIEDRA ORNAMENTAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		17.20				17.20
		17.20				17.20
		10.75				10.75
		10.75				10.75
PUERTAS		2.90				2.90
		1.50				1.50
Total						51.50
SE ANEXA CROQUIS						
TOTAL						61.50
TOTAL						51.50

RESIDENTE

CONTRATISTA

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

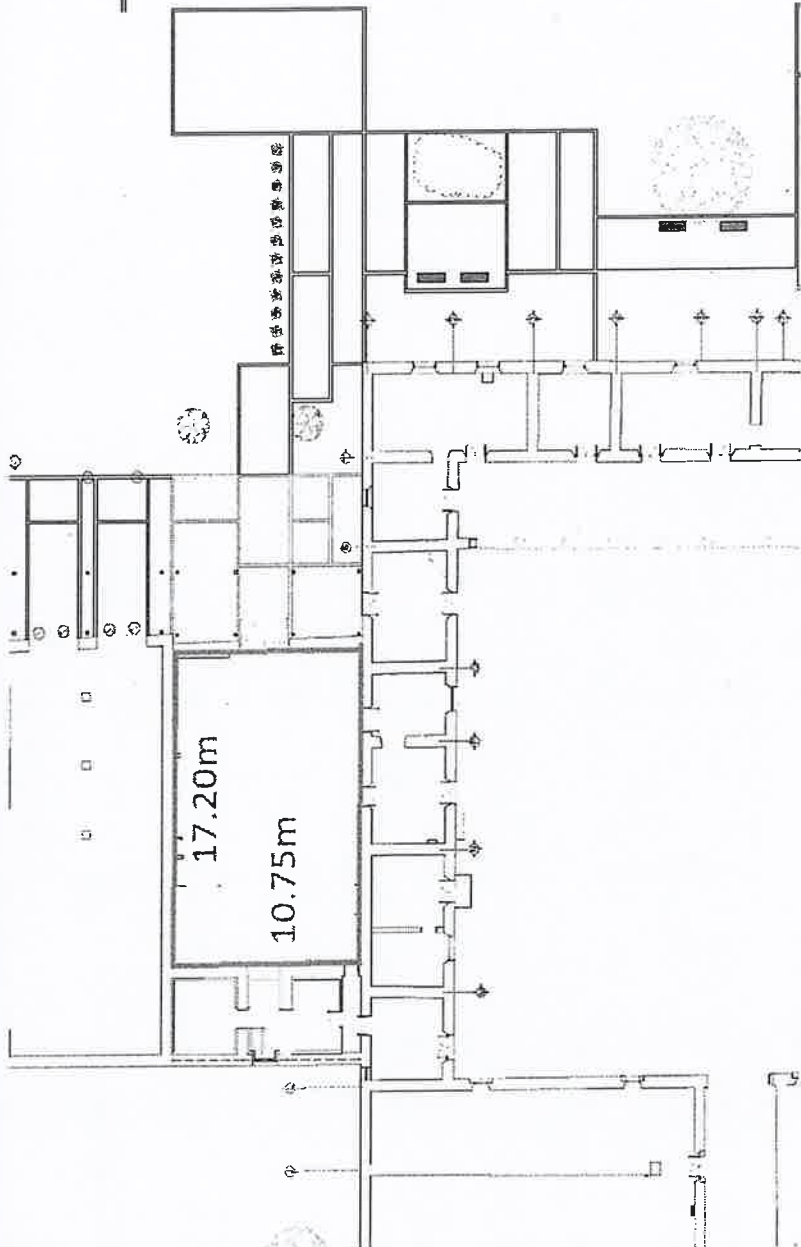
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

CROQUIS DE LA ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	2.00	 ELABORACION DE FRANJA DE ABSORCION PARA HUMEDAD DE 25 CM DE ANCHO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE COLOCACION DE GRAVA Y PIEDRA ORNAMENTAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
----------	------	---

RESIDENTE

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

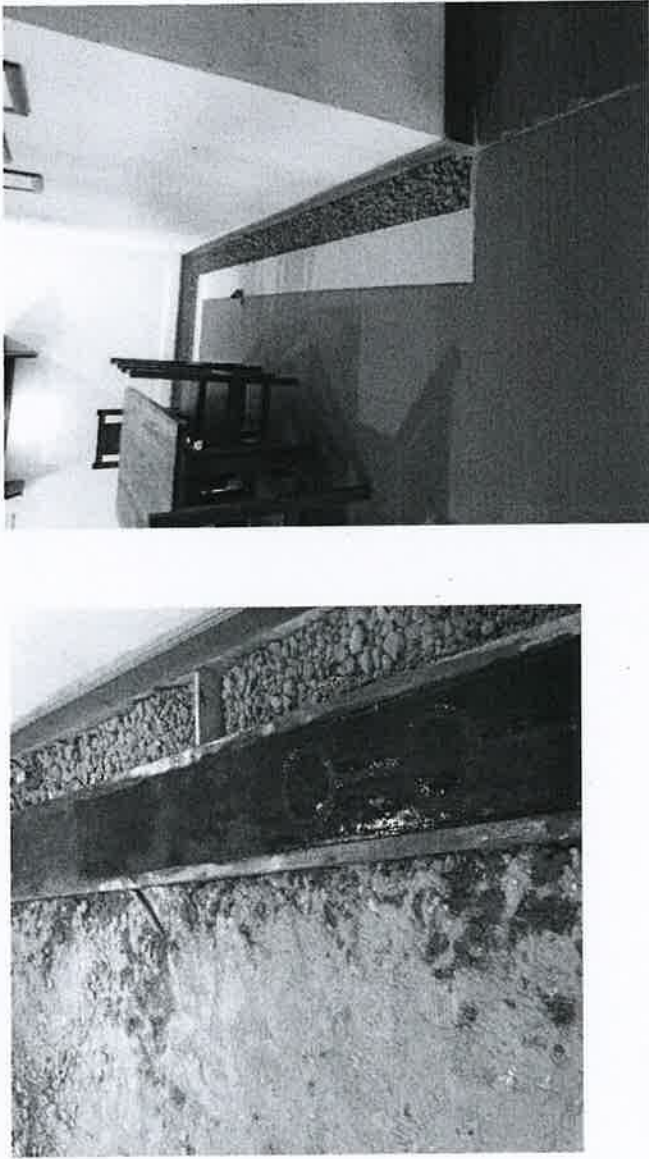
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	2.00	
ELABORACION DE FRANJA DE ABSORCION PARA HUMEDAD DE 25 CM DE ANCHO Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE COLOCACION DE GRAVA Y PIEDRA ORNAMENTAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.		
		

RESIDENTE
ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

Nº. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	3.00	OPERACIONES ARITMETICAS				VOLUMEN A PAGAR	
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD		
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 95%	16.20	10.25	0.24		39.85 0.00 0.00 0.00		TOTAL m3 39.85
						SE ANEXA CROQUIS	
					TOTAL	39.85	

RESIDENTE

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

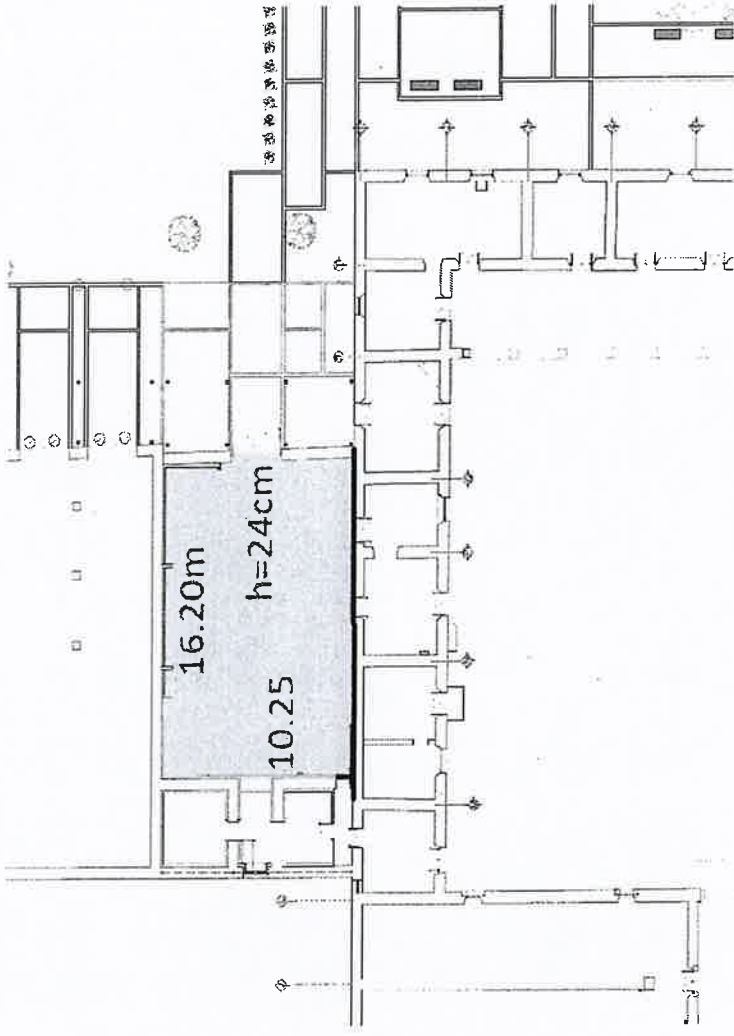
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

CROQUIS DE LA ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 95%	3.00
		

CONTRATISTA
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

RESIDENTE
ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

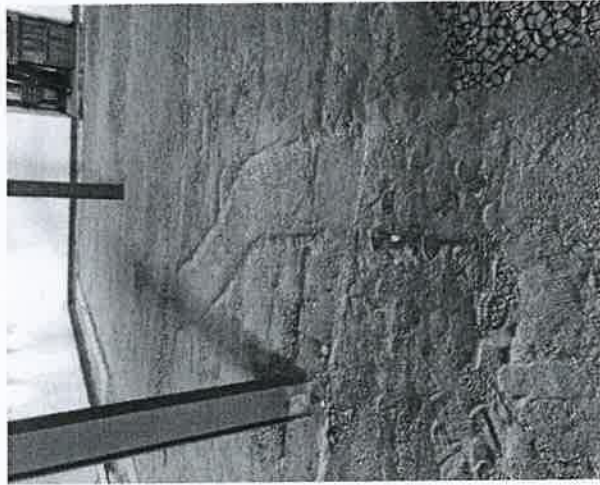
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	3.00
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 95%	CON



RESIDENTE

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

Nº. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS				CANTIDAD	VOLUMEN A PAGAR
	UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO		
PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON COLOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10		16.20	10.25		166.05	TOTAL m2 168.25
		2.90	0.50		1.45	
		1.50	0.50		0.75	
					TOTAL	168.25
SE ANEXA CROQUIS						

RESIDENTE

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

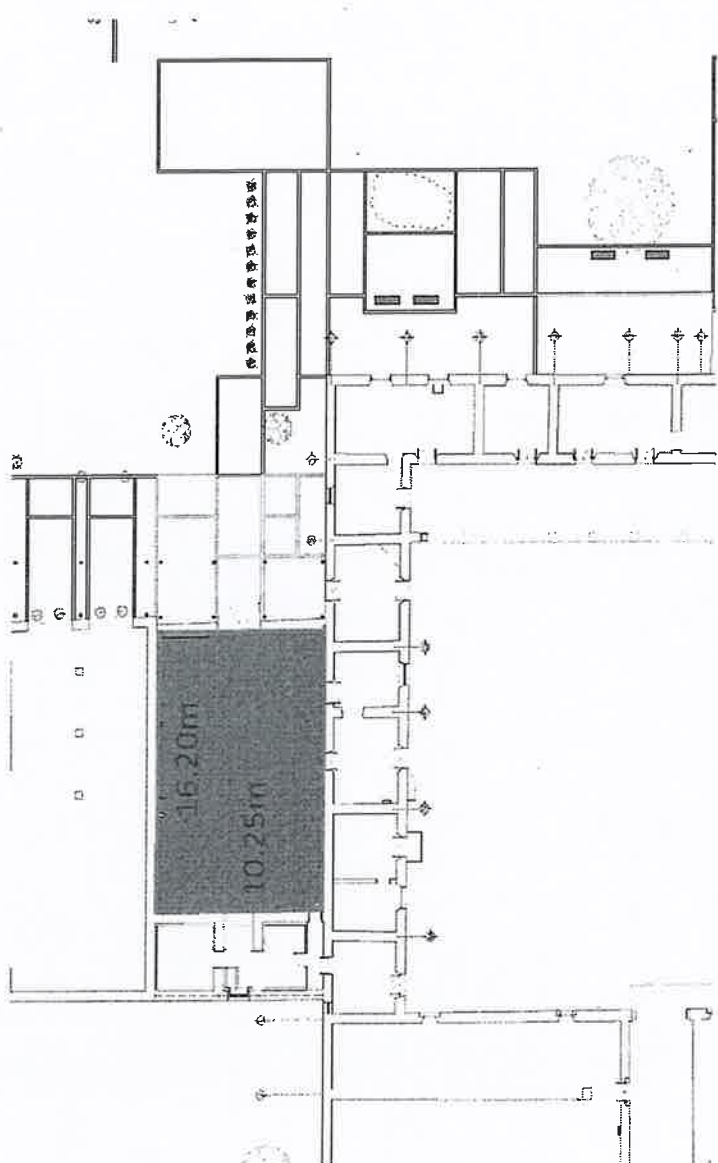
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

CROQUIS DE LA ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

Nº. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	4.00	
PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON COLOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10		
		

RESIDENTE

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

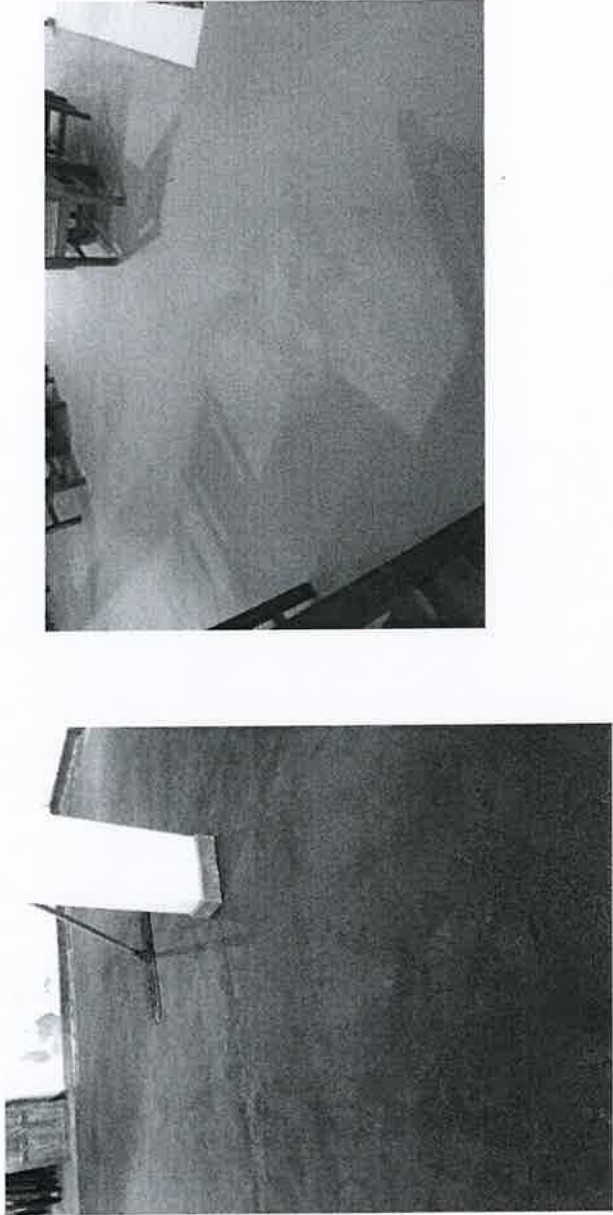
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	4.00	
PISO DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON COLOR, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10		
		

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

RESIDENTE

CONTRATISTA

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	5.00	OPERACIONES ARITMETICAS			VOLUMEN A PAGAR	
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD	
PISO DE CEMENTO ESTAMPADO EN FORMA ARTESANAL AL FRESCO, DE 25 CM DE ANCHO, INCLUYE DISEÑO ARQUITECTONICO POLICROMATICO Y SELLADOR TRANSPARENTE.	16.70				16.70	TOTAL m 49.50
	16.70				16.70	
	10.25				10.25	
	10.25				10.25	
PUERTAS	2.90				2.90	
	1.50				1.50	
TOTAL					49.50	

RESIDENTE

ING. JUAN ALBERTO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

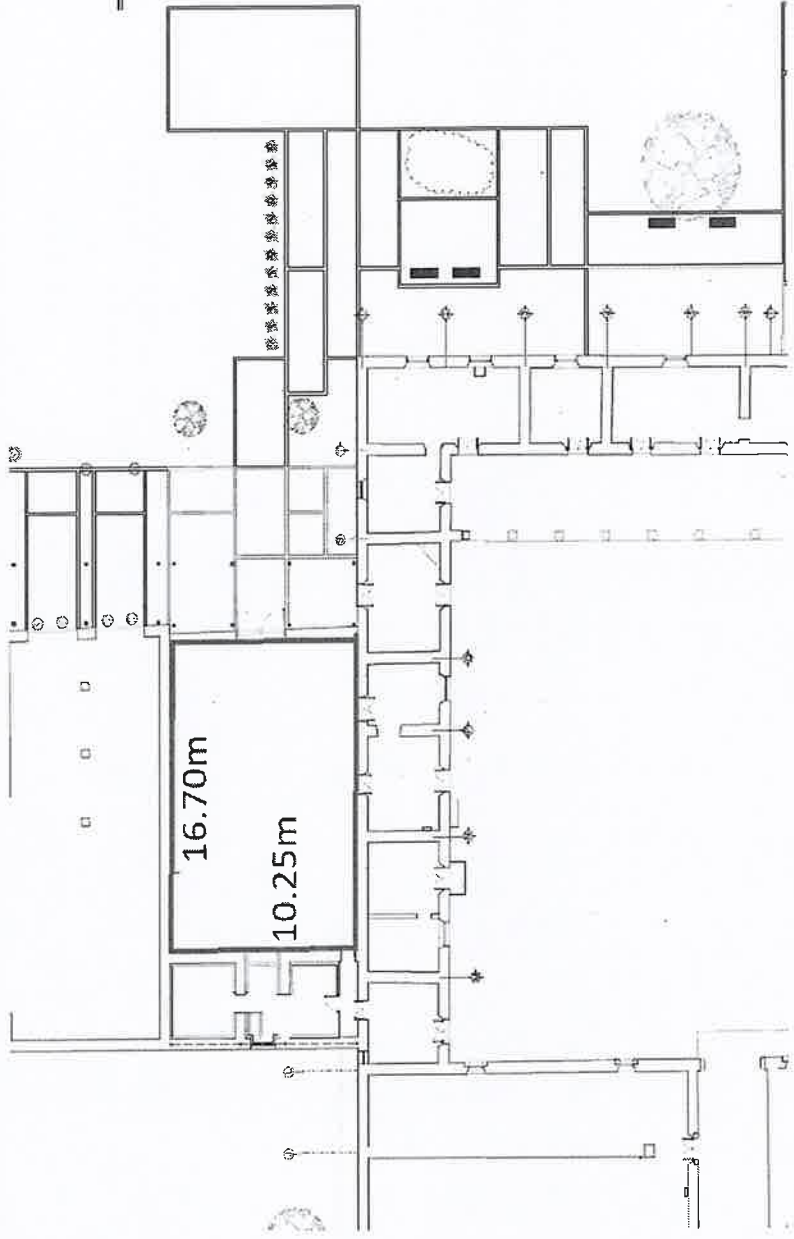
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

CROQUIS DE LA ESTIMACION

CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO	5.00	
PISO DE CEMENTO ESTAMPADO EN FORMA ARTESANAL AL FRESCO, DE 25 CM DE ANCHO, INCLUYE DISEÑO ARQUITECTONICO POLICROMATICO Y SELLADOR TRANSPARENTE.		
		

RESIDENTE
ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA
ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

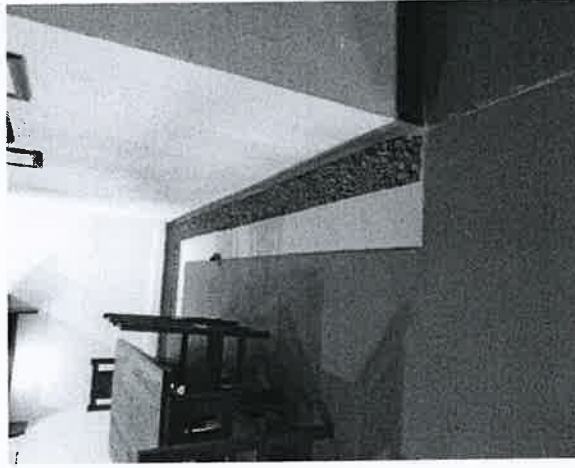
CONTRATO:	001/2023	TRAMO:	
OBRA:	MANTENIMIENTO DE LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN.	CONTRATISTA	ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE

No. DE ESTIMACION:	1 (UNO)	PERIODO	13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 14 DE MARZO DEL 2023
--------------------	---------	---------	--

CONCEPTO

5.00

PISO DE CEMENTO ESTAMPADO EN FORMA ARTESANAL AL FRESCO, DE 25 CM DE ANCHO, INCLUYE DISEÑO ARQUITECTONICO POLICROMATICO Y SELLADOR TRANSPARENTE.



RESIDENTE

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNANDEZ

CONTRATISTA

ING. LUIS MANUEL GONZALEZ ITUARTE
