



Oficio No. D-4398/2023  
14 de agosto de 2023.

C. OSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCTORA D.O.S. S.A DE C.V

**P R E S E N T E S . -**

Con relación a la Obra: "REPOSICIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR NO. 8418/8422 (FOLIO P.P 2023 196)", que al amparo del Contrato No. 067/2023 ejecuta su representada, al respecto, anexo al presente, me permito enviar a Ud., copia del Acuerdo de reprogramación por Plazo del contrato aludido, por lo que la nueva fecha de terminación autorizada es el día 19 de noviembre de 2023; de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

Agradeceré que, a la brevedad posible, presente a esta Dependencia el programa de obra de acuerdo a la Reprogramación autorizada.

Sin otro particular, quedo de Ud.

**A T E N T A M E N T E**

  
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CC.p.-ING. HILARIO TORRES QUEZADA.



"2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA"  
"2023, CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA"

**Dirección de Obras Públicas**

C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua  
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | [municipiochihuahua.gob.mx](http://municipiochihuahua.gob.mx)



ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO  
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 067/2023  
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

ACUERDO QUE EMITE EL ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SIENDO ASISTIDO POR EL ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y EL ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL, PARA HACER CONSTAR EL CONVENIO MODIFICATORIO PLAZO DEL CONTRATO 067/2023, CONSISTENTE EN: "REPOSICIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR NO. 8418/8422 (FOLIO P.P 2023 196)."

En Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas del día 8 de agosto del 2023, el suscrito Director de Obras Públicas, asistido por el encargado de la Subdirección de Infraestructura Social y el encargado del Departamento de Construcción Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 71 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y 50 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza la reprogramación del plazo del contrato 067/2023, con base en los siguientes:

#### ANTECEDENTES:

- I. Con fecha 11 de julio de 2023, se celebró con la persona moral **CONSTRUCTORA D.O.S., S.A DE C.V** representada legalmente por el C. **OSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS**, el Contrato de Obra Pública No. **067/2023**, el cual tiene como objeto los trabajos de: "REPOSICIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR NO. 8418/8422 (FOLIO P.P 2023 196).", por un monto de \$2,687,116.58 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 58/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 120 días naturales, debiendo iniciarlos el día 18 de julio de 2023 y terminarlos a más tardar el día 14 de noviembre de 2023, otorgando el 30% de anticipo del total del contrato.
- II. Mediante escrito S/N de fecha 7 de agosto del año en curso, recibido el mismo día por el Departamento de Construcción de Infraestructura Social, el contratista solicita una ampliación plazo de ejecución de la obra para la conclusión de los trabajos, debido a las inclemencias del clima, las cuales impidieron el colado de la plantilla, ya que las lluvias causaron inundaciones en las excavaciones.

Por lo anteriormente citado se hace un análisis por parte de la dependencia a efecto de considerar la reprogramación.

Página 1 de 2

**Dirección de Obras Públicas**



ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN DEL PLAZO  
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 067/2023  
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Por lo que se dicta lo siguiente:

**PRIMERO.** – Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, **Reprogramación de Plazo del contrato de obra 067/2023**, y estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 19 de noviembre de 2023.

**SEGUNDO.** – Notifíquese a la persona, el C. OSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA D.O.S. SA. DE CV., el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

**ACUERDO** que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los ocho días del mes de agosto del dos mil veintitrés.

  
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

  
ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

  
ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO  
RESIDENTE DE OBRA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE LA REPROGRAMACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA 067/2023, RELATIVO A: "REPOSICIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR NO. 8418/8422 (FOLIO DE P.P 2023 196)". /Jta\*  
"2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA"  
"2023, CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA"

Página 2 de 2

**Dirección de Obras Públicas**



**DICTAMEN TÉCNICO DE REPROGRAMACIÓN  
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 067/2023**

**DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN QUE EMITE EL ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 067/2022 EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA OBRA: "REPOSICIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR NO. 8418/8422 (FOLIO P.P 2023 196)."**

**En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, al 8 de agosto de 2023, constituidos en la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, ubicada en calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 de la colonia Campesina Nueva, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y artículo 131 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se procede a la emisión del presente Dictamen de conformidad con lo siguiente:**

**ANTECEDENTES**

- I. Con fecha 11 de julio de 2023, se celebró con la persona moral CONSTRUCTORA D.O.S., S.A DE C.V representada legalmente por el C. OSCAR LUIS GONZÁLEZ VILLALOBOS, el Contrato de Obra Pública No. 067/2023, el cual tiene como objeto los trabajos de: "REPOSICIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE SALÓN EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR NO. 8418/8422 (FOLIO P.P 2023 196).", por un monto de \$2,687,116.58 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 58/100 M.N.) más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 120 días naturales, debiendo iniciarlos el día 18 de julio de 2023 y terminarlos a más tardar el día 14 de noviembre de 2023, otorgando el 30% de anticipo del total del contrato.**

**Dichos trabajos no cambian la naturaleza y características esenciales de la obra.**



**DICTAMEN TÉCNICO DE REPROGRAMACIÓN  
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 067/2023**

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.** – Es viable la reprogramación derivada de que se encuentra dentro del periodo de vigencia del contrato número **067/2023**, ya que la fecha de terminación es el **14 de noviembre de 2023**.

**SEGUNDO.** – Que en términos de lo establecido por el artículo 80 de la ley de Obras públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua, los entes públicos podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y mediante un dictamen en el que se expresen las razones fundadas, motivadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios y/o adicionales, siempre y cuando los convenios modificatorios, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley o los tratados; el dictamen correspondiente y los convenios modificatorios serán publicados en el sistema electrónico de contrataciones al día siguiente de su firma.

**TERCERO.** – Que las modificaciones no implican variaciones sustanciales al proyecto original.

**CUARTO.** – Que no se pretende eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley o los tratados.

**QUINTO.** – Mediante escrito S/N de fecha **7 de agosto** del año en curso, recibido el mismo día por el Departamento de Construcción de Infraestructura Social, el contratista solicita una ampliación plazo de ejecución de la obra para la conclusión de los trabajos, debido a las inclemencias del clima, las cuales impidieron el colado de la plantilla, ya que las lluvias causaron inundaciones en las excavaciones.

Por lo anteriormente citado se hace un análisis por parte del Departamento de Construcción de Infraestructura Social a efecto de considerar la reprogramación.

**-Inclemencias climatológicas:** debido a las lluvias que tuvieron lugar en la Ciudad de Chihuahua, mismas que inundaron las excavaciones, imposibilitando así el colado de la plantilla, ya que se tuvo que drenar el agua alojada en la zanja y esperar 3 días a que el terreno se encontrara en condiciones de colocar la plantilla de concreto; después del colado de la plantilla y en proceso de cimbrado, nuevamente llovió y se inundó de nuevo, teniendo



**DICTAMEN TÉCNICO DE REPROGRAMACIÓN  
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 067/2023**

así que esperar unos días para el colado correspondiente. Dichas situaciones causaron 5 días de retraso en los trabajos de obra.


**DICTAMEN:**

- I. Es procedente la suscripción de la **reprogramación por plazo** de ejecución del Contrato de Obra **067/2023**, fijándose como nuevo plazo de terminación de la obra el **19 de noviembre de 2023**.  
Con base en los antecedentes, los motivos expuestos y con fundamento en lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se autoriza la celebración del **Acuerdo por Reprogramación del plazo** al Contrato de Obra Pública No. **067/2022**.
- II. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el **Programa de Inversión Directa para 2023**, como afectación a los recursos municipales correspondientes al de la Participación Ciudadana Aportación Municipal, mediante oficio de autorización **NO.2023-PDM-PCAM-OP-028**, de fecha **04 de mayo de 2023**, emitido por la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental del Municipio de Chihuahua.
- III. La modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni elude el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia.



**DICTAMEN TÉCNICO DE REPROGRAMACIÓN  
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 067/2023**

Se dicta el presente Acuerdo y se firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., al octavo día del mes de agosto del año dos mil veintitrés.



**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**  
**ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**



**ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**  
**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**



**ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO**  
**RESIDENTE DE OBRA**

jta\*

D2797

# CONSTRUCTORA D. O. S. S.A. DE C.V.



Chihuahua, Chih., a 7 de Agosto del 2023

**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**P R E S E N T E**

Con referencia al Contrato **067/2023** relacionado a la **REPOSICION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE SALON EN ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR No.8418/8422 (FOLIO DE P.P. 2023 196).**

Al respecto, me permito solicitar a usted la autorización de ampliación en plazo de contrato referido para 5 días naturales, correspondiente a los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Agosto del 2023, sustentado en los reportes de clima, evidencia fotográfica y notas de bitácora debido a las lluvias que tuvieron lugar en estos días, mismas que inundaron las excavaciones, imposibilitando así el colado de la plantilla, ya que nos vimos en la necesidad de drenar el agua alojada en la zanja y esperar 3 días a que el terreno se encontrara en condiciones de colocar la plantilla de concreto; después del colado de la plantilla y en proceso de cimbrado de zapatas nuevamente se inundó la zona viéndonos en la necesidad de posponer el colado del concreto 2 días más lo cual nos generó un atraso no imputable a nosotros de 5 días naturales.

Adjunto al presente oficio, reporte la siguiente documentación:

- Reporte de clima de precipitaciones pluviales del Servicio Meteorológico Nacional, Red: SMN-ESMA, en el Municipio de Chihuahua, en el cual se observa que se presentaron precipitaciones pluviales en la zona)
- Reporte fotográfico de las inundaciones en las excavaciones entre los días 31 de Julio al 4 de Agosto del 2023.
- Notas de bitácora.

Sin otro asunto de momento, agradecemos la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente

  
**ING. OSCAR LUIS GONZALEZ VILLALOBOS**

Representante Legal



## REPORTE FOTOGRAFICO

No. CONT. 067/2023

1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2023

OBRA:

REPOSICION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE  
SALON



*Handwritten signature*



## REPORTE FOTOGRAFICO

No. CONT. 067/2023

1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2023

OBRA:

REPOSICION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE  
SALON

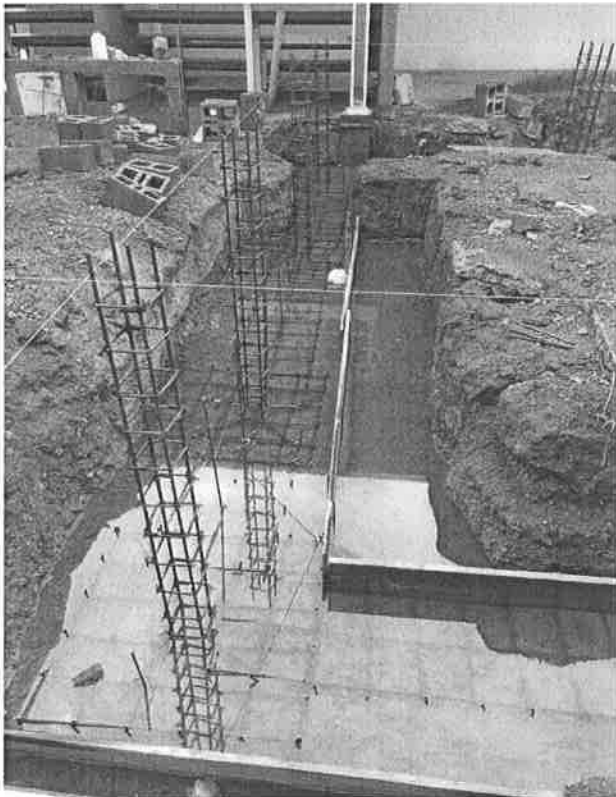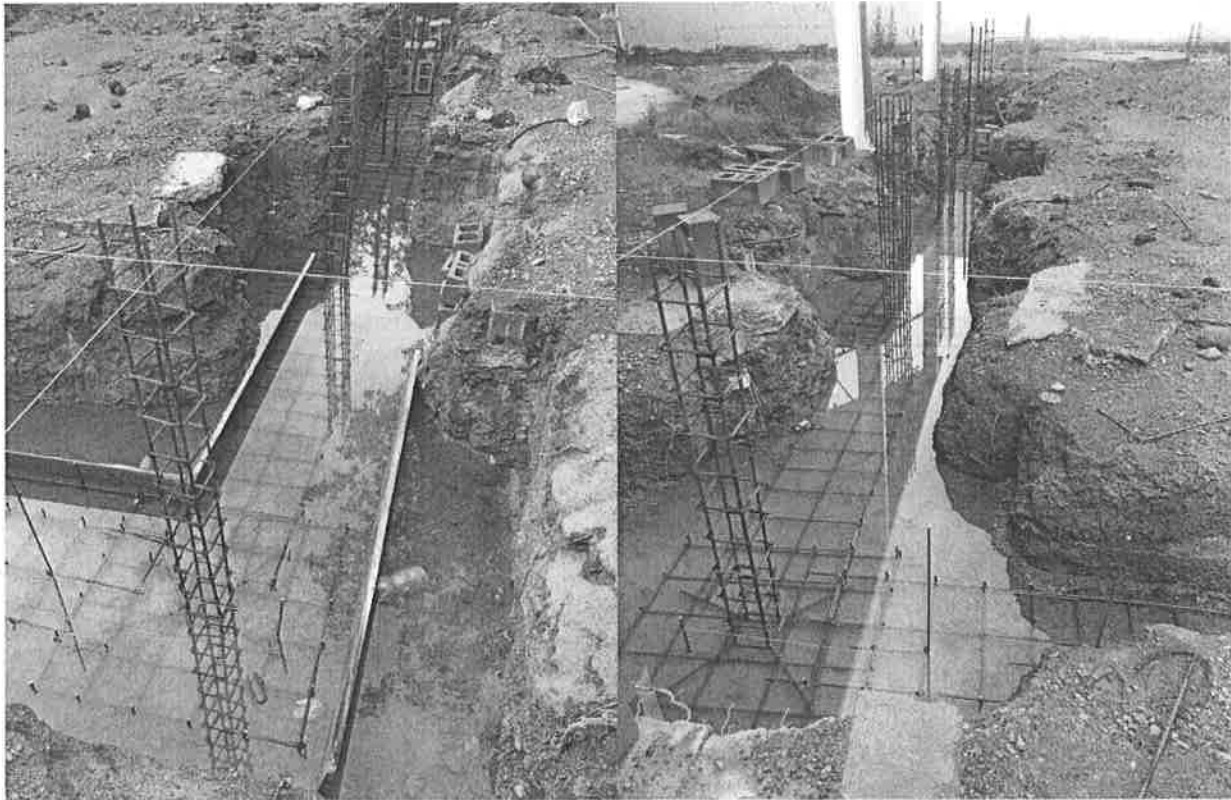

*M*

CONT. 06/1/2023

1- AGOSTO - 2023 (LUNIA)



013

NOTA NO. 12 - CON ESTA FECHA SE REGISTRARON INTENSAS LLUVIAS DURANTE LA MADRUGADA MISMAS QUE INUNDARON LAS EXCAVACIONES IMPOSIBILITANDO EL COLADO DE PLANTILLA POR LO QUE NOS VIMOS EN LA NECESIDAD DE POSPONER EL COLADO.

~~M. J. M.~~

~~[Signature]~~

2- AGOSTO - 2023

NOTA NO. 13 - CON ESTA FECHA CONTINUAMOS POSPONIENDO EL COLADO DE LA PLANTILLA DEBIDO A LA HUMEDAD DEL AREA DE DEBANTE DE LAS ZAPATAS

~~M. J. M.~~

~~[Signature]~~

Servicio Meteorológico Nacional

Red: SMN

Estación: CHIHUAHUA

Estación: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Latitud (N): 28.67055556

Longitud (O): -106.0302778

Altitud: 1397

| Fecha Local      | Fecha UTC        | Dirección del | Temperatura | Humedad rel: | Presión Atmo | Precipitación |
|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 04/07/2023 17:00 | 04/08/2023 23:00 | 71            | 31.4        | 15           | 793          | 0             |
| 04/07/2023 16:50 | 04/08/2023 22:50 | 58            | 32          | 15           | 793.1        | 0             |
| 04/07/2023 16:40 | 04/08/2023 22:40 | 94            | 32.3        | 15           | 793.2        | 0             |
| 04/07/2023 16:30 | 04/08/2023 22:30 | 84            | 31.4        | 16           | 793.3        | 0             |
| 04/07/2023 16:20 | 04/08/2023 22:20 | 60            | 31.2        | 15           | 793.4        | 0             |
| 04/07/2023 16:10 | 04/08/2023 22:10 | 79            | 31.4        | 16           | 793.5        | 0             |
| 04/07/2023 16:00 | 04/08/2023 22:00 | 83            | 31.7        | 16           | 793.5        | 0             |
| 04/07/2023 15:50 | 04/08/2023 21:50 | 114           | 31.9        | 17           | 793.6        | 0             |
| 04/07/2023 15:40 | 04/08/2023 21:40 | 84            | 31.6        | 18           | 793.6        | 0             |
| 04/07/2023 15:30 | 04/08/2023 21:30 | 10            | 31.1        | 18           | 793.7        | 0             |
| 04/07/2023 15:20 | 04/08/2023 21:20 | 67            | 30.8        | 18           | 793.9        | 0             |
| 04/07/2023 15:10 | 04/08/2023 21:10 | 53            | 31.1        | 17           | 793.9        | 0             |
| 04/08/2023 15:00 | 04/08/2023 21:00 | 103           | 30.9        | 18           | 793.9        | 0             |
| 04/08/2023 14:50 | 04/08/2023 20:50 | 60            | 30.7        | 18           | 794          | 0             |
| 04/08/2023 14:40 | 04/08/2023 20:40 | 61            | 30.7        | 19           | 794.1        | 0             |
| 04/08/2023 14:30 | 04/08/2023 20:30 | 92            | 30.8        | 18           | 794.2        | 0             |
| 04/08/2023 14:20 | 04/08/2023 20:20 | 84            | 31.1        | 18           | 794.3        | 0             |
| 04/08/2023 14:10 | 04/08/2023 20:10 | 104           | 30.9        | 18           | 794.3        | 0             |
| 04/08/2023 14:00 | 04/08/2023 20:00 | 74            | 30.1        | 19           | 794.3        | 0             |
| 04/08/2023 13:50 | 04/08/2023 19:50 | 67            | 30          | 19           | 794.4        | 0             |
| 04/08/2023 13:40 | 04/08/2023 19:40 | 59            | 30.3        | 19           | 794.5        | 0             |
| 04/08/2023 13:30 | 04/08/2023 19:30 | 122           | 30.6        | 19           | 794.5        | 0             |
| 04/08/2023 13:20 | 04/08/2023 19:20 | 91            | 29.8        | 20           | 794.5        | 0             |
| 04/08/2023 13:10 | 04/08/2023 19:10 | 106           | 29.4        | 20           | 794.6        | 0             |
| 04/08/2023 13:00 | 04/08/2023 19:00 | 57            | 30.1        | 19           | 794.7        | 0             |
| 04/08/2023 12:50 | 04/08/2023 18:50 | 84            | 30.6        | 20           | 794.7        | 0             |
| 04/08/2023 12:40 | 04/08/2023 18:40 | 137           | 30.3        | 22           | 794.7        | 0             |
| 04/08/2023 12:30 | 04/08/2023 18:30 | 106           | 29.9        | 21           | 794.8        | 0             |
| 04/08/2023 12:20 | 04/08/2023 18:20 | 82            | 29.1        | 22           | 794.9        | 0             |
| 04/08/2023 12:10 | 04/08/2023 18:10 | 80            | 29.1        | 22           | 794.9        | 0             |
| 04/08/2023 09:00 | 04/08/2023 15:00 | 228           | 20.6        | 36           | 795.3        | 0             |
| 04/08/2023 08:50 | 04/08/2023 14:50 | 116           | 19.5        | 38           | 795.2        | 0             |
| 04/08/2023 08:40 | 04/08/2023 14:40 | 165           | 18.4        | 41           | 795.2        | 0             |
| 04/08/2023 08:30 | 04/08/2023 14:30 | 200           | 17.6        | 43           | 795.2        | 0             |
| 04/08/2023 08:20 | 04/08/2023 14:20 | 111           | 16.7        | 45           | 795.2        | 0             |
| 04/08/2023 08:10 | 04/08/2023 14:10 | 129           | 15.5        | 48           | 795.2        | 0             |
| 04/08/2023 08:00 | 04/08/2023 14:00 | 58            | 14.2        | 52           | 795.1        | 0             |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 04/08/2023 07:50 | 04/08/2023 13:50 | 103 | 12.9 | 56 | 795.2 | 0 |
| 04/08/2023 07:40 | 04/08/2023 13:40 | 289 | 11.7 | 59 | 795.1 | 0 |
| 04/08/2023 07:30 | 04/08/2023 13:30 | 257 | 11.2 | 61 | 794.9 | 0 |
| 04/08/2023 07:20 | 04/08/2023 13:20 | 301 | 10.9 | 61 | 794.8 | 0 |
| 04/08/2023 07:10 | 04/08/2023 13:10 | 37  | 10.6 | 61 | 794.7 | 0 |
| 04/08/2023 07:00 | 04/08/2023 13:00 | 227 | 10.3 | 62 | 794.6 | 0 |
| 04/08/2023 06:50 | 04/08/2023 12:50 | 144 | 10.3 | 62 | 794.5 | 0 |
| 04/08/2023 06:40 | 04/08/2023 12:40 | 242 | 10.3 | 62 | 794.5 | 0 |
| 04/08/2023 06:30 | 04/08/2023 12:30 | 120 | 10.5 | 61 | 794.3 | 0 |
| 04/08/2023 06:20 | 04/08/2023 12:20 | 196 | 10.6 | 60 | 794.3 | 0 |
| 04/08/2023 06:10 | 04/08/2023 12:10 | 61  | 10.7 | 60 | 794.3 | 0 |
| 04/08/2023 06:00 | 04/08/2023 12:00 | 239 | 10.8 | 60 | 794.2 | 0 |
| 04/08/2023 05:50 | 04/08/2023 11:50 | 30  | 11   | 60 | 794.1 | 0 |
| 04/08/2023 05:40 | 04/08/2023 11:40 | 76  | 11.1 | 59 | 794   | 0 |
| 04/08/2023 05:30 | 04/08/2023 11:30 | 179 | 11.1 | 60 | 793.9 | 0 |
| 04/08/2023 05:20 | 04/08/2023 11:20 | 144 | 11.4 | 59 | 793.7 | 0 |
| 04/08/2023 05:10 | 04/08/2023 11:10 | 4   | 11.7 | 58 | 793.6 | 0 |
| 04/08/2023 05:00 | 04/08/2023 11:00 | 105 | 11.8 | 58 | 793.5 | 0 |
| 04/08/2023 04:50 | 04/08/2023 10:50 | 221 | 12   | 56 | 793.4 | 0 |
| 04/08/2023 04:40 | 04/08/2023 10:40 | 89  | 12.3 | 56 | 793.3 | 0 |
| 04/08/2023 04:30 | 04/08/2023 10:30 | 201 | 12.7 | 54 | 793.4 | 0 |
| 04/08/2023 04:20 | 04/08/2023 10:20 | 81  | 13   | 53 | 793.4 | 0 |
| 04/08/2023 04:10 | 04/08/2023 10:10 | 16  | 13.3 | 52 | 793.4 | 0 |
| 04/08/2023 04:00 | 04/08/2023 10:00 | 198 | 13.7 | 50 | 793.4 | 0 |
| 04/08/2023 03:50 | 04/08/2023 09:50 | 66  | 13.9 | 49 | 793.6 | 0 |
| 04/08/2023 03:40 | 04/08/2023 09:40 | 67  | 14   | 50 | 793.6 | 0 |
| 04/08/2023 03:30 | 04/08/2023 09:30 | 208 | 14.3 | 49 | 793.7 | 0 |
| 04/08/2023 03:20 | 04/08/2023 09:20 | 261 | 14.8 | 47 | 793.8 | 0 |
| 04/08/2023 03:10 | 04/08/2023 09:10 | 78  | 15.2 | 46 | 793.9 | 0 |
| 04/08/2023 03:00 | 04/08/2023 09:00 | 137 | 15.5 | 46 | 794.1 | 0 |
| 04/08/2023 02:50 | 04/08/2023 08:50 | 255 | 16.1 | 44 | 794.1 | 0 |
| 04/08/2023 02:40 | 04/08/2023 08:40 | 84  | 16.7 | 42 | 794.1 | 0 |
| 04/08/2023 02:30 | 04/08/2023 08:30 | 53  | 17.1 | 41 | 794.1 | 0 |
| 04/08/2023 02:20 | 04/08/2023 08:20 | 290 | 17.9 | 39 | 794.2 | 0 |
| 04/08/2023 02:10 | 04/08/2023 08:10 | 57  | 18.3 | 37 | 794.2 | 0 |
| 04/08/2023 02:00 | 04/08/2023 08:00 | 219 | 18.3 | 37 | 794.2 | 0 |
| 04/08/2023 01:50 | 04/08/2023 07:50 | 208 | 19.1 | 38 | 794   | 0 |
| 04/08/2023 01:40 | 04/08/2023 07:40 | 58  | 19.4 | 33 | 793.9 | 0 |
| 04/08/2023 01:30 | 04/08/2023 07:30 | 63  | 18.6 | 37 | 794.2 | 0 |
| 04/08/2023 01:20 | 04/08/2023 07:20 | 68  | 18.4 | 38 | 794.2 | 0 |
| 04/08/2023 01:10 | 04/08/2023 07:10 | 60  | 18   | 39 | 794.3 | 0 |
| 04/08/2023 01:00 | 04/08/2023 07:00 | 53  | 18.2 | 40 | 794.2 | 0 |
| 04/08/2023 00:50 | 04/08/2023 06:50 | 56  | 18.7 | 39 | 794.3 | 0 |
| 04/08/2023 00:40 | 04/08/2023 06:40 | 50  | 19   | 38 | 794.4 | 0 |
| 04/08/2023 00:30 | 04/08/2023 06:30 | 51  | 19.6 | 37 | 794.5 | 0 |
| 04/08/2023 00:20 | 04/08/2023 06:20 | 27  | 20.3 | 35 | 794.4 | 0 |
| 04/08/2023 00:10 | 04/08/2023 06:10 | 81  | 21   | 33 | 794.4 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |     |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|-----|
| 04/08/2023 00:00 | 04/08/2023 06:00 | 64  | 21.3 | 32 | 794.4 | 0   |
| 03/08/2023 23:50 | 04/08/2023 05:50 | 77  | 21.8 | 31 | 794.5 | 0   |
| 03/08/2023 23:40 | 04/08/2023 05:40 | 69  | 20.7 | 30 | 794.5 | 0   |
| 03/08/2023 23:30 | 04/08/2023 05:30 | 64  | 17.2 | 39 | 794.4 | 0   |
| 03/08/2023 23:20 | 04/08/2023 05:20 | 122 | 16.5 | 43 | 794.3 | 0   |
| 03/08/2023 23:10 | 04/08/2023 05:10 | 62  | 16.6 | 43 | 794.1 | 0   |
| 03/08/2023 23:00 | 04/08/2023 05:00 | 69  | 16.9 | 42 | 794   | 0   |
| 03/08/2023 22:50 | 04/08/2023 04:50 | 54  | 17.1 | 42 | 793.9 | 0.2 |
| 03/08/2023 22:40 | 04/08/2023 04:40 | 228 | 17.5 | 40 | 793.7 | 0.2 |
| 03/08/2023 22:30 | 04/08/2023 04:30 | 248 | 17.9 | 39 | 793.5 | 0.2 |
| 03/08/2023 22:20 | 04/08/2023 04:20 | 72  | 18.4 | 38 | 793.4 | 0   |
| 03/08/2023 22:10 | 04/08/2023 04:10 | 209 | 18.8 | 37 | 793.3 | 0   |
| 03/08/2023 22:00 | 04/08/2023 04:00 | 33  | 19.4 | 36 | 793.2 | 0   |
| 03/08/2023 21:50 | 04/08/2023 03:50 | 64  | 19.9 | 34 | 793.1 | 0   |
| 03/08/2023 21:40 | 04/08/2023 03:40 | 52  | 20.5 | 33 | 792.9 | 0   |
| 03/08/2023 21:30 | 04/08/2023 03:30 | 45  | 21.1 | 31 | 792.7 | 0   |
| 03/08/2023 21:20 | 04/08/2023 03:20 | 51  | 21.8 | 30 | 792.7 | 0   |
| 03/08/2023 21:10 | 04/08/2023 03:10 | 129 | 22.6 | 28 | 792.6 | 0   |
| 03/08/2023 21:00 | 04/08/2023 03:00 | 77  | 23.4 | 27 | 792.6 | 0   |
| 03/08/2023 20:50 | 04/08/2023 02:50 | 72  | 24.3 | 25 | 792.5 | 0   |
| 03/08/2023 20:40 | 04/08/2023 02:40 | 49  | 25   | 24 | 792.5 | 0   |
| 03/08/2023 20:30 | 04/08/2023 02:30 | 66  | 25.6 | 23 | 792.5 | 0   |
| 03/08/2023 20:20 | 04/08/2023 02:20 | 70  | 25.6 | 22 | 792.4 | 0   |
| 03/08/2023 20:10 | 04/08/2023 02:10 | 53  | 25.7 | 22 | 792.4 | 0   |
| 03/08/2023 20:00 | 04/08/2023 02:00 | 67  | 26.4 | 21 | 792.3 | 0   |
| 03/08/2023 19:50 | 04/08/2023 01:50 | 54  | 27   | 19 | 792.1 | 0   |
| 03/08/2023 19:40 | 04/08/2023 01:40 | 52  | 27.2 | 19 | 792.1 | 0   |
| 03/08/2023 19:30 | 04/08/2023 01:30 | 54  | 27.4 | 20 | 792   | 0   |
| 03/08/2023 19:20 | 04/08/2023 01:20 | 77  | 27.8 | 20 | 792   | 0   |
| 03/08/2023 19:10 | 04/08/2023 01:10 | 67  | 28.1 | 20 | 791.9 | 0   |
| 03/08/2023 19:00 | 04/08/2023 01:00 | 55  | 28.4 | 20 | 791.9 | 0   |
| 03/08/2023 18:50 | 04/08/2023 00:50 | 80  | 28.8 | 20 | 791.9 | 0   |
| 03/08/2023 18:40 | 04/08/2023 00:40 | 76  | 29.2 | 19 | 791.8 | 0   |
| 03/08/2023 18:30 | 04/08/2023 00:30 | 51  | 29.5 | 19 | 791.7 | 0   |
| 03/08/2023 18:20 | 04/08/2023 00:20 | 66  | 29.9 | 19 | 791.7 | 0   |
| 03/08/2023 18:10 | 04/08/2023 00:10 | 72  | 30.6 | 18 | 791.8 | 0   |
| 03/08/2023 18:00 | 04/08/2023 00:00 | 80  | 31.5 | 18 | 791.8 | 0   |
| 03/08/2023 17:50 | 03/08/2023 23:50 | 88  | 31.4 | 19 | 791.8 | 0   |
| 03/08/2023 17:40 | 03/08/2023 23:40 | 70  | 31.7 | 18 | 791.8 | 0   |
| 03/08/2023 17:30 | 03/08/2023 23:30 | 41  | 32   | 16 | 792   | 0   |
| 03/08/2023 17:20 | 03/08/2023 23:20 | 57  | 31.5 | 16 | 792   | 0   |
| 03/08/2023 17:10 | 03/08/2023 23:10 | 30  | 31.9 | 16 | 792.1 | 0   |
| 03/08/2023 17:00 | 03/08/2023 23:00 | 36  | 31.9 | 16 | 792.3 | 0   |
| 03/08/2023 16:50 | 03/08/2023 22:50 | 54  | 32   | 16 | 792.4 | 0   |
| 03/08/2023 16:40 | 03/08/2023 22:40 | 51  | 32.5 | 15 | 792.4 | 0   |
| 03/08/2023 16:30 | 03/08/2023 22:30 | 53  | 32.5 | 15 | 792.4 | 0   |
| 03/08/2023 16:20 | 03/08/2023 22:20 | 68  | 32.9 | 15 | 792.4 | 0   |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 03/08/2023 16:10 | 03/08/2023 22:10 | 26  | 32.8 | 15 | 792.5 | 0 |
| 03/08/2023 16:00 | 03/08/2023 22:00 | 51  | 32.6 | 14 | 792.6 | 0 |
| 03/08/2023 15:50 | 03/08/2023 21:50 | 57  | 32.9 | 14 | 792.7 | 0 |
| 03/08/2023 15:40 | 03/08/2023 21:40 | 33  | 32.8 | 14 | 792.8 | 0 |
| 03/08/2023 15:30 | 03/08/2023 21:30 | 62  | 32.2 | 14 | 792.9 | 0 |
| 03/08/2023 15:20 | 03/08/2023 21:20 | 51  | 32.6 | 13 | 793   | 0 |
| 03/08/2023 15:10 | 03/08/2023 21:10 | 64  | 32.7 | 14 | 793   | 0 |
| 03/08/2023 15:00 | 03/08/2023 21:00 | 93  | 32.5 | 14 | 793.1 | 0 |
| 03/08/2023 14:50 | 03/08/2023 20:50 | 103 | 32.4 | 14 | 793.2 | 0 |
| 03/08/2023 14:40 | 03/08/2023 20:40 | 60  | 32.6 | 14 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 14:30 | 03/08/2023 20:30 | 68  | 32.3 | 15 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 14:20 | 03/08/2023 20:20 | 63  | 32.2 | 17 | 793.5 | 0 |
| 03/08/2023 14:10 | 03/08/2023 20:10 | 57  | 32.2 | 17 | 793.5 | 0 |
| 03/08/2023 14:00 | 03/08/2023 20:00 | 71  | 31.9 | 18 | 793.6 | 0 |
| 03/08/2023 13:50 | 03/08/2023 19:50 | 75  | 31.8 | 18 | 793.6 | 0 |
| 03/08/2023 13:40 | 03/08/2023 19:40 | 48  | 31.6 | 17 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 13:30 | 03/08/2023 19:30 | 73  | 31.8 | 18 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 13:20 | 03/08/2023 19:20 | 71  | 31.3 | 17 | 793.9 | 0 |
| 03/08/2023 13:10 | 03/08/2023 19:10 | 75  | 31.3 | 17 | 794   | 0 |
| 03/08/2023 13:00 | 03/08/2023 19:00 | 29  | 30.6 | 18 | 794   | 0 |
| 03/08/2023 12:50 | 03/08/2023 18:50 | 62  | 31   | 18 | 794.2 | 0 |
| 03/08/2023 12:40 | 03/08/2023 18:40 | 68  | 31   | 19 | 794.1 | 0 |
| 03/08/2023 12:30 | 03/08/2023 18:30 | 62  | 30.7 | 19 | 794.2 | 0 |
| 03/08/2023 12:20 | 03/08/2023 18:20 | 57  | 30.2 | 19 | 794.2 | 0 |
| 03/08/2023 12:10 | 03/08/2023 18:10 | 74  | 30   | 20 | 794.2 | 0 |
| 03/08/2023 12:00 | 03/08/2023 18:00 | 64  | 30.3 | 19 | 794.3 | 0 |
| 03/08/2023 11:50 | 03/08/2023 17:50 | 53  | 30.2 | 20 | 794.3 | 0 |
| 03/08/2023 11:40 | 03/08/2023 17:40 | 47  | 29.9 | 21 | 794.3 | 0 |
| 03/08/2023 11:30 | 03/08/2023 17:30 | 57  | 29.5 | 21 | 794.3 | 0 |
| 03/08/2023 11:20 | 03/08/2023 17:20 | 77  | 29.3 | 22 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 11:10 | 03/08/2023 17:10 | 28  | 29.4 | 21 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 11:00 | 03/08/2023 17:00 | 47  | 29.4 | 22 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 10:50 | 03/08/2023 16:50 | 79  | 29.4 | 23 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 10:40 | 03/08/2023 16:40 | 89  | 28.9 | 23 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 10:30 | 03/08/2023 16:30 | 82  | 29   | 23 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 10:20 | 03/08/2023 16:20 | 59  | 28.8 | 23 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 10:10 | 03/08/2023 16:10 | 68  | 28.7 | 23 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 10:00 | 03/08/2023 16:00 | 55  | 28.1 | 24 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 09:50 | 03/08/2023 15:50 | 74  | 27.8 | 24 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 09:40 | 03/08/2023 15:40 | 106 | 26.8 | 24 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 09:30 | 03/08/2023 15:30 | 93  | 25.6 | 26 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 09:20 | 03/08/2023 15:20 | 107 | 23.9 | 30 | 794.5 | 0 |
| 03/08/2023 09:10 | 03/08/2023 15:10 | 260 | 22.4 | 35 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 09:00 | 03/08/2023 15:00 | 193 | 20.9 | 37 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 08:50 | 03/08/2023 14:50 | 120 | 19.6 | 41 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 08:40 | 03/08/2023 14:40 | 175 | 18.6 | 44 | 794.3 | 0 |
| 03/08/2023 08:30 | 03/08/2023 14:30 | 187 | 17.6 | 44 | 794.3 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 03/08/2023 08:20 | 03/08/2023 14:20 | 218 | 16.4 | 46 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 08:10 | 03/08/2023 14:10 | 216 | 14.8 | 48 | 794.4 | 0 |
| 03/08/2023 08:00 | 03/08/2023 14:00 | 192 | 13.2 | 52 | 794.3 | 0 |
| 03/08/2023 07:50 | 03/08/2023 13:50 | 97  | 11.9 | 56 | 794.3 | 0 |
| 03/08/2023 07:40 | 03/08/2023 13:40 | 97  | 10.7 | 59 | 794.2 | 0 |
| 03/08/2023 07:30 | 03/08/2023 13:30 | 257 | 9.9  | 60 | 794.1 | 0 |
| 03/08/2023 07:20 | 03/08/2023 13:20 | 246 | 9.5  | 60 | 794   | 0 |
| 03/08/2023 07:10 | 03/08/2023 13:10 | 118 | 9.3  | 61 | 793.9 | 0 |
| 03/08/2023 07:00 | 03/08/2023 13:00 | 122 | 9.2  | 60 | 794   | 0 |
| 03/08/2023 06:50 | 03/08/2023 12:50 | 117 | 9    | 60 | 793.9 | 0 |
| 03/08/2023 06:40 | 03/08/2023 12:40 | 86  | 9    | 59 | 793.9 | 0 |
| 03/08/2023 06:30 | 03/08/2023 12:30 | 111 | 8.9  | 59 | 793.8 | 0 |
| 03/08/2023 06:20 | 03/08/2023 12:20 | 72  | 8.9  | 59 | 793.8 | 0 |
| 03/08/2023 06:10 | 03/08/2023 12:10 | 17  | 9    | 60 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 06:00 | 03/08/2023 12:00 | 186 | 9.1  | 60 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 05:50 | 03/08/2023 11:50 | 28  | 9.2  | 59 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 05:40 | 03/08/2023 11:40 | 137 | 9.4  | 58 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 05:30 | 03/08/2023 11:30 | 181 | 9.6  | 57 | 793.6 | 0 |
| 03/08/2023 05:20 | 03/08/2023 11:20 | 61  | 9.8  | 56 | 793.6 | 0 |
| 03/08/2023 05:10 | 03/08/2023 11:10 | 80  | 9.9  | 56 | 793.5 | 0 |
| 03/08/2023 05:00 | 03/08/2023 11:00 | 167 | 10   | 55 | 793.4 | 0 |
| 03/08/2023 04:50 | 03/08/2023 10:50 | 75  | 10   | 55 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 04:40 | 03/08/2023 10:40 | 231 | 10.1 | 54 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 04:30 | 03/08/2023 10:30 | 65  | 10   | 54 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 04:20 | 03/08/2023 10:20 | 46  | 10   | 55 | 793.4 | 0 |
| 03/08/2023 04:10 | 03/08/2023 10:10 | 194 | 9.9  | 55 | 793.4 | 0 |
| 03/08/2023 04:00 | 03/08/2023 10:00 | 61  | 10.2 | 55 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 03:50 | 03/08/2023 09:50 | 79  | 10.3 | 54 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 03:40 | 03/08/2023 09:40 | 94  | 10.6 | 52 | 793.2 | 0 |
| 03/08/2023 03:30 | 03/08/2023 09:30 | 230 | 10.8 | 51 | 793.2 | 0 |
| 03/08/2023 03:20 | 03/08/2023 09:20 | 63  | 10.9 | 50 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 03:10 | 03/08/2023 09:10 | 69  | 10.9 | 50 | 793.3 | 0 |
| 03/08/2023 03:00 | 03/08/2023 09:00 | 45  | 10.7 | 52 | 793.4 | 0 |
| 03/08/2023 02:50 | 03/08/2023 08:50 | 216 | 10.7 | 53 | 793.4 | 0 |
| 03/08/2023 02:40 | 03/08/2023 08:40 | 161 | 11   | 52 | 793.4 | 0 |
| 03/08/2023 02:30 | 03/08/2023 08:30 | 62  | 11.2 | 51 | 793.5 | 0 |
| 03/08/2023 02:20 | 03/08/2023 08:20 | 82  | 11.4 | 50 | 793.5 | 0 |
| 03/08/2023 02:10 | 03/08/2023 08:10 | 47  | 11.5 | 49 | 793.5 | 0 |
| 03/08/2023 02:00 | 03/08/2023 08:00 | 192 | 11.7 | 49 | 793.6 | 0 |
| 03/08/2023 01:50 | 03/08/2023 07:50 | 132 | 12   | 48 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 01:40 | 03/08/2023 07:40 | 52  | 12.1 | 47 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 01:30 | 03/08/2023 07:30 | 50  | 12.2 | 48 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 01:20 | 03/08/2023 07:20 | 124 | 12.2 | 48 | 793.7 | 0 |
| 03/08/2023 01:10 | 03/08/2023 07:10 | 198 | 12.5 | 47 | 793.8 | 0 |
| 03/08/2023 01:00 | 03/08/2023 07:00 | 79  | 12.6 | 46 | 793.8 | 0 |
| 03/08/2023 00:50 | 03/08/2023 06:50 | 61  | 12.9 | 46 | 793.9 | 0 |
| 03/08/2023 00:40 | 03/08/2023 06:40 | 90  | 13   | 45 | 793.9 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 03/08/2023 00:30 | 03/08/2023 06:30 | 78  | 13.2 | 45 | 793.9 | 0 |
| 03/08/2023 00:20 | 03/08/2023 06:20 | 66  | 13.4 | 44 | 794   | 0 |
| 03/08/2023 00:10 | 03/08/2023 06:10 | 106 | 13.6 | 43 | 794   | 0 |
| 03/08/2023 00:00 | 03/08/2023 06:00 | 5   | 13.5 | 45 | 794   | 0 |
| 02/08/2023 23:50 | 03/08/2023 05:50 | 95  | 13.5 | 45 | 794   | 0 |
| 02/08/2023 23:40 | 03/08/2023 05:40 | 211 | 13.8 | 44 | 793.9 | 0 |
| 02/08/2023 23:30 | 03/08/2023 05:30 | 79  | 14   | 44 | 793.9 | 0 |
| 02/08/2023 23:20 | 03/08/2023 05:20 | 67  | 14.1 | 43 | 793.8 | 0 |
| 02/08/2023 23:10 | 03/08/2023 05:10 | 97  | 14.2 | 43 | 793.8 | 0 |
| 02/08/2023 23:00 | 03/08/2023 05:00 | 265 | 14.6 | 43 | 793.7 | 0 |
| 02/08/2023 22:50 | 03/08/2023 04:50 | 60  | 15   | 42 | 793.7 | 0 |
| 02/08/2023 22:40 | 03/08/2023 04:40 | 70  | 15.3 | 41 | 793.6 | 0 |
| 02/08/2023 22:30 | 03/08/2023 04:30 | 121 | 15.5 | 40 | 793.6 | 0 |
| 02/08/2023 22:20 | 03/08/2023 04:20 | 177 | 15.9 | 40 | 793.5 | 0 |
| 02/08/2023 22:10 | 03/08/2023 04:10 | 19  | 16.3 | 39 | 793.4 | 0 |
| 02/08/2023 22:00 | 03/08/2023 04:00 | 90  | 16.6 | 39 | 793.4 | 0 |
| 02/08/2023 21:50 | 03/08/2023 03:50 | 60  | 17.2 | 38 | 793.3 | 0 |
| 02/08/2023 21:40 | 03/08/2023 03:40 | 50  | 17.7 | 36 | 793.3 | 0 |
| 02/08/2023 21:30 | 03/08/2023 03:30 | 170 | 18.2 | 35 | 793.2 | 0 |
| 02/08/2023 21:20 | 03/08/2023 03:20 | 22  | 18.7 | 34 | 793.1 | 0 |
| 02/08/2023 21:10 | 03/08/2023 03:10 | 96  | 19.3 | 33 | 793   | 0 |
| 02/08/2023 21:00 | 03/08/2023 03:00 | 51  | 20   | 31 | 792.9 | 0 |
| 02/08/2023 20:50 | 03/08/2023 02:50 | 59  | 20.8 | 30 | 792.8 | 0 |
| 02/08/2023 20:40 | 03/08/2023 02:40 | 59  | 21.7 | 27 | 792.7 | 0 |
| 02/08/2023 20:30 | 03/08/2023 02:30 | 65  | 22.4 | 26 | 792.7 | 0 |
| 02/08/2023 20:20 | 03/08/2023 02:20 | 62  | 23.3 | 25 | 792.7 | 0 |
| 02/08/2023 20:10 | 03/08/2023 02:10 | 56  | 24.5 | 23 | 792.7 | 0 |
| 02/08/2023 20:00 | 03/08/2023 02:00 | 51  | 25.7 | 21 | 792.6 | 0 |
| 02/08/2023 19:50 | 03/08/2023 01:50 | 57  | 26.4 | 19 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 19:40 | 03/08/2023 01:40 | 44  | 27.1 | 18 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 19:30 | 03/08/2023 01:30 | 56  | 27.4 | 18 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 19:20 | 03/08/2023 01:20 | 40  | 27.7 | 18 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 19:10 | 03/08/2023 01:10 | 68  | 27.9 | 18 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 19:00 | 03/08/2023 01:00 | 57  | 28.3 | 17 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 18:50 | 03/08/2023 00:50 | 38  | 28.6 | 17 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 18:40 | 03/08/2023 00:40 | 80  | 28.8 | 17 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 18:30 | 03/08/2023 00:30 | 62  | 29.2 | 17 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 18:20 | 03/08/2023 00:20 | 83  | 29.7 | 18 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 18:10 | 03/08/2023 00:10 | 85  | 30.3 | 17 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 18:00 | 03/08/2023 00:00 | 72  | 30.8 | 17 | 792.5 | 0 |
| 02/08/2023 17:50 | 02/08/2023 23:50 | 66  | 31.1 | 16 | 792.6 | 0 |
| 02/08/2023 17:40 | 02/08/2023 23:40 | 78  | 31.4 | 16 | 792.7 | 0 |
| 02/08/2023 17:30 | 02/08/2023 23:30 | 72  | 31.6 | 16 | 792.7 | 0 |
| 02/08/2023 17:20 | 02/08/2023 23:20 | 66  | 31.6 | 16 | 792.9 | 0 |
| 02/08/2023 17:10 | 02/08/2023 23:10 | 72  | 31.8 | 16 | 793.1 | 0 |
| 02/08/2023 17:00 | 02/08/2023 23:00 | 73  | 32.1 | 16 | 793.2 | 0 |
| 02/08/2023 16:50 | 02/08/2023 22:50 | 86  | 32.3 | 16 | 793.1 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 02/08/2023 16:40 | 02/08/2023 22:40 | 96  | 32.3 | 15 | 793.2 | 0 |
| 02/08/2023 16:30 | 02/08/2023 22:30 | 54  | 32.6 | 15 | 793.2 | 0 |
| 02/08/2023 16:20 | 02/08/2023 22:20 | 70  | 32.9 | 14 | 793.3 | 0 |
| 02/08/2023 16:10 | 02/08/2023 22:10 | 71  | 32.7 | 14 | 793.4 | 0 |
| 02/08/2023 16:00 | 02/08/2023 22:00 | 45  | 32.2 | 14 | 793.4 | 0 |
| 02/08/2023 15:50 | 02/08/2023 21:50 | 49  | 32   | 14 | 793.4 | 0 |
| 02/08/2023 15:40 | 02/08/2023 21:40 | 59  | 32.7 | 14 | 793.5 | 0 |
| 02/08/2023 15:30 | 02/08/2023 21:30 | 88  | 32.6 | 14 | 793.6 | 0 |
| 02/08/2023 15:20 | 02/08/2023 21:20 | 106 | 32.4 | 14 | 793.7 | 0 |
| 02/08/2023 15:10 | 02/08/2023 21:10 | 96  | 32.1 | 14 | 793.7 | 0 |
| 02/08/2023 15:00 | 02/08/2023 21:00 | 71  | 32.7 | 14 | 793.8 | 0 |
| 02/08/2023 14:50 | 02/08/2023 20:50 | 116 | 32.4 | 15 | 793.8 | 0 |
| 02/08/2023 14:40 | 02/08/2023 20:40 | 63  | 32   | 17 | 793.9 | 0 |
| 02/08/2023 14:30 | 02/08/2023 20:30 | 85  | 31.8 | 17 | 794.1 | 0 |
| 02/08/2023 14:20 | 02/08/2023 20:20 | 55  | 31.2 | 18 | 794.2 | 0 |
| 02/08/2023 14:10 | 02/08/2023 20:10 | 53  | 30.9 | 18 | 794.3 | 0 |
| 02/08/2023 14:00 | 02/08/2023 20:00 | 39  | 31.1 | 18 | 794.4 | 0 |
| 02/08/2023 13:50 | 02/08/2023 19:50 | 63  | 31.7 | 17 | 794.6 | 0 |
| 02/08/2023 13:40 | 02/08/2023 19:40 | 79  | 31.8 | 17 | 794.6 | 0 |
| 02/08/2023 13:30 | 02/08/2023 19:30 | 76  | 31.6 | 17 | 794.7 | 0 |
| 02/08/2023 13:20 | 02/08/2023 19:20 | 54  | 31.1 | 16 | 794.7 | 0 |
| 02/08/2023 13:10 | 02/08/2023 19:10 | 56  | 31.2 | 16 | 794.8 | 0 |
| 02/08/2023 13:00 | 02/08/2023 19:00 | 105 | 30.9 | 17 | 794.9 | 0 |
| 02/08/2023 12:50 | 02/08/2023 18:50 | 73  | 31   | 16 | 795   | 0 |
| 02/08/2023 12:40 | 02/08/2023 18:40 | 58  | 30.7 | 16 | 795.1 | 0 |
| 02/08/2023 12:30 | 02/08/2023 18:30 | 83  | 31.1 | 15 | 795.1 | 0 |
| 02/08/2023 12:20 | 02/08/2023 18:20 | 110 | 30.6 | 14 | 795.2 | 0 |
| 02/08/2023 12:10 | 02/08/2023 18:10 | 80  | 29.8 | 15 | 795.3 | 0 |
| 02/08/2023 12:00 | 02/08/2023 18:00 | 65  | 29.5 | 15 | 795.3 | 0 |
| 02/08/2023 11:50 | 02/08/2023 17:50 | 57  | 29.4 | 15 | 795.4 | 0 |
| 02/08/2023 11:40 | 02/08/2023 17:40 | 29  | 29.6 | 16 | 795.5 | 0 |
| 02/08/2023 11:30 | 02/08/2023 17:30 | 60  | 29.5 | 16 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 11:20 | 02/08/2023 17:20 | 31  | 29.3 | 18 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 11:10 | 02/08/2023 17:10 | 96  | 29.4 | 17 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 11:00 | 02/08/2023 17:00 | 142 | 29.1 | 19 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 10:50 | 02/08/2023 16:50 | 82  | 28.8 | 18 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 10:40 | 02/08/2023 16:40 | 93  | 29   | 19 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 10:30 | 02/08/2023 16:30 | 89  | 28.9 | 21 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 10:20 | 02/08/2023 16:20 | 100 | 28.9 | 21 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 10:10 | 02/08/2023 16:10 | 144 | 28.5 | 22 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 10:00 | 02/08/2023 16:00 | 135 | 27.8 | 23 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 09:50 | 02/08/2023 15:50 | 68  | 27   | 25 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 09:40 | 02/08/2023 15:40 | 356 | 26.4 | 25 | 795.9 | 0 |
| 02/08/2023 09:30 | 02/08/2023 15:30 | 80  | 25.4 | 27 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 09:20 | 02/08/2023 15:20 | 81  | 23.9 | 29 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 09:10 | 02/08/2023 15:10 | 342 | 22.4 | 32 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 09:00 | 02/08/2023 15:00 | 100 | 20.7 | 34 | 795.8 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 02/08/2023 08:50 | 02/08/2023 14:50 | 101 | 19.4 | 39 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 08:40 | 02/08/2023 14:40 | 160 | 18.4 | 42 | 795.9 | 0 |
| 02/08/2023 08:30 | 02/08/2023 14:30 | 163 | 17.3 | 43 | 795.9 | 0 |
| 02/08/2023 08:20 | 02/08/2023 14:20 | 219 | 15.9 | 47 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 08:10 | 02/08/2023 14:10 | 226 | 14.4 | 52 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 08:00 | 02/08/2023 14:00 | 241 | 12.9 | 57 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 07:50 | 02/08/2023 13:50 | 244 | 11.5 | 62 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 07:40 | 02/08/2023 13:40 | 206 | 10.3 | 66 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 07:30 | 02/08/2023 13:30 | 45  | 9.4  | 70 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 07:20 | 02/08/2023 13:20 | 87  | 8.9  | 70 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 07:10 | 02/08/2023 13:10 | 68  | 8.7  | 69 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 07:00 | 02/08/2023 13:00 | 57  | 8.6  | 69 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 06:50 | 02/08/2023 12:50 | 173 | 8.6  | 67 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 06:40 | 02/08/2023 12:40 | 28  | 8.6  | 67 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 06:30 | 02/08/2023 12:30 | 113 | 8.6  | 67 | 795.5 | 0 |
| 02/08/2023 06:20 | 02/08/2023 12:20 | 61  | 8.7  | 67 | 795.4 | 0 |
| 02/08/2023 06:10 | 02/08/2023 12:10 | 161 | 8.7  | 68 | 795.3 | 0 |
| 02/08/2023 06:00 | 02/08/2023 12:00 | 139 | 8.8  | 68 | 795.3 | 0 |
| 02/08/2023 05:50 | 02/08/2023 11:50 | 210 | 9    | 67 | 795.3 | 0 |
| 02/08/2023 05:40 | 02/08/2023 11:40 | 32  | 9.1  | 67 | 795.2 | 0 |
| 02/08/2023 05:30 | 02/08/2023 11:30 | 210 | 9.1  | 67 | 795.1 | 0 |
| 02/08/2023 05:20 | 02/08/2023 11:20 | 174 | 9.2  | 67 | 795.1 | 0 |
| 02/08/2023 05:10 | 02/08/2023 11:10 | 142 | 9.4  | 66 | 795   | 0 |
| 02/08/2023 05:00 | 02/08/2023 11:00 | 85  | 9.6  | 65 | 794.8 | 0 |
| 02/08/2023 04:50 | 02/08/2023 10:50 | 29  | 9.6  | 65 | 794.8 | 0 |
| 02/08/2023 04:40 | 02/08/2023 10:40 | 72  | 9.6  | 65 | 794.7 | 0 |
| 02/08/2023 04:30 | 02/08/2023 10:30 | 143 | 9.6  | 66 | 794.7 | 0 |
| 02/08/2023 04:20 | 02/08/2023 10:20 | 122 | 9.8  | 65 | 794.7 | 0 |
| 02/08/2023 04:10 | 02/08/2023 10:10 | 63  | 10   | 64 | 794.7 | 0 |
| 02/08/2023 04:00 | 02/08/2023 10:00 | 47  | 10.1 | 64 | 794.6 | 0 |
| 02/08/2023 03:50 | 02/08/2023 09:50 | 75  | 10.2 | 63 | 794.6 | 0 |
| 02/08/2023 03:40 | 02/08/2023 09:40 | 118 | 10.4 | 63 | 794.6 | 0 |
| 02/08/2023 03:30 | 02/08/2023 09:30 | 95  | 10.5 | 62 | 794.6 | 0 |
| 02/08/2023 03:20 | 02/08/2023 09:20 | 95  | 10.7 | 62 | 794.7 | 0 |
| 02/08/2023 03:10 | 02/08/2023 09:10 | 130 | 10.9 | 60 | 794.8 | 0 |
| 02/08/2023 03:00 | 02/08/2023 09:00 | 64  | 11   | 61 | 794.8 | 0 |
| 02/08/2023 02:50 | 02/08/2023 08:50 | 106 | 11.1 | 60 | 794.9 | 0 |
| 02/08/2023 02:40 | 02/08/2023 08:40 | 187 | 11.3 | 59 | 794.9 | 0 |
| 02/08/2023 02:30 | 02/08/2023 08:30 | 57  | 11.5 | 58 | 795   | 0 |
| 02/08/2023 02:20 | 02/08/2023 08:20 | 115 | 11.7 | 58 | 795.1 | 0 |
| 02/08/2023 02:10 | 02/08/2023 08:10 | 83  | 11.7 | 58 | 795.3 | 0 |
| 02/08/2023 02:00 | 02/08/2023 08:00 | 277 | 11.9 | 57 | 795.4 | 0 |
| 02/08/2023 01:50 | 02/08/2023 07:50 | 295 | 12   | 58 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 01:40 | 02/08/2023 07:40 | 119 | 12.2 | 57 | 795.6 | 0 |
| 02/08/2023 01:30 | 02/08/2023 07:30 | 133 | 12.4 | 56 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 01:20 | 02/08/2023 07:20 | 239 | 12.5 | 56 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 01:10 | 02/08/2023 07:10 | 102 | 12.7 | 55 | 795.7 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 02/08/2023 01:00 | 02/08/2023 07:00 | 24  | 12.8 | 55 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 00:50 | 02/08/2023 06:50 | 135 | 13   | 54 | 795.7 | 0 |
| 02/08/2023 00:40 | 02/08/2023 06:40 | 57  | 13.1 | 54 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 00:30 | 02/08/2023 06:30 | 273 | 13.2 | 54 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 00:20 | 02/08/2023 06:20 | 115 | 13.4 | 53 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 00:10 | 02/08/2023 06:10 | 83  | 13.5 | 53 | 795.8 | 0 |
| 02/08/2023 00:00 | 02/08/2023 06:00 | 80  | 13.7 | 53 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 23:50 | 02/08/2023 05:50 | 22  | 13.9 | 52 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 23:40 | 02/08/2023 05:40 | 95  | 14.1 | 52 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 23:30 | 02/08/2023 05:30 | 40  | 14.5 | 51 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 23:20 | 02/08/2023 05:20 | 152 | 14.7 | 50 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 23:10 | 02/08/2023 05:10 | 75  | 15.1 | 49 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 23:00 | 02/08/2023 05:00 | 130 | 15.4 | 48 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 22:50 | 02/08/2023 04:50 | 84  | 15.7 | 47 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 22:40 | 02/08/2023 04:40 | 133 | 16.1 | 46 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 22:30 | 02/08/2023 04:30 | 75  | 16.4 | 45 | 795.7 | 0 |
| 01/08/2023 22:20 | 02/08/2023 04:20 | 54  | 16.7 | 44 | 795.7 | 0 |
| 01/08/2023 22:10 | 02/08/2023 04:10 | 95  | 17   | 44 | 795.6 | 0 |
| 01/08/2023 22:00 | 02/08/2023 04:00 | 55  | 17.4 | 43 | 795.6 | 0 |
| 01/08/2023 21:50 | 02/08/2023 03:50 | 95  | 17.8 | 42 | 795.5 | 0 |
| 01/08/2023 21:40 | 02/08/2023 03:40 | 59  | 18.2 | 41 | 795.4 | 0 |
| 01/08/2023 21:30 | 02/08/2023 03:30 | 114 | 18.7 | 40 | 795.4 | 0 |
| 01/08/2023 21:20 | 02/08/2023 03:20 | 84  | 19.4 | 37 | 795.3 | 0 |
| 01/08/2023 21:10 | 02/08/2023 03:10 | 70  | 20   | 36 | 795.3 | 0 |
| 01/08/2023 21:00 | 02/08/2023 03:00 | 98  | 20.6 | 34 | 795.2 | 0 |
| 01/08/2023 20:50 | 02/08/2023 02:50 | 308 | 21.2 | 33 | 795.1 | 0 |
| 01/08/2023 20:40 | 02/08/2023 02:40 | 100 | 21.6 | 31 | 795   | 0 |
| 01/08/2023 20:30 | 02/08/2023 02:30 | 82  | 21.9 | 31 | 795   | 0 |
| 01/08/2023 20:20 | 02/08/2023 02:20 | 99  | 22.6 | 30 | 794.9 | 0 |
| 01/08/2023 20:10 | 02/08/2023 02:10 | 52  | 23.6 | 28 | 794.8 | 0 |
| 01/08/2023 20:00 | 02/08/2023 02:00 | 55  | 24.5 | 26 | 794.7 | 0 |
| 01/08/2023 19:50 | 02/08/2023 01:50 | 51  | 25.4 | 24 | 794.7 | 0 |
| 01/08/2023 19:40 | 02/08/2023 01:40 | 53  | 25.8 | 23 | 794.7 | 0 |
| 01/08/2023 19:30 | 02/08/2023 01:30 | 52  | 26.1 | 22 | 794.6 | 0 |
| 01/08/2023 19:20 | 02/08/2023 01:20 | 51  | 26.3 | 21 | 794.5 | 0 |
| 01/08/2023 19:10 | 02/08/2023 01:10 | 48  | 26.7 | 21 | 794.6 | 0 |
| 01/08/2023 19:00 | 02/08/2023 01:00 | 67  | 27   | 20 | 794.6 | 0 |
| 01/08/2023 18:50 | 02/08/2023 00:50 | 86  | 27.4 | 21 | 794.5 | 0 |
| 01/08/2023 18:40 | 02/08/2023 00:40 | 71  | 27.8 | 20 | 794.4 | 0 |
| 01/08/2023 18:30 | 02/08/2023 00:30 | 90  | 28.3 | 20 | 794.5 | 0 |
| 01/08/2023 18:20 | 02/08/2023 00:20 | 94  | 28.7 | 19 | 794.5 | 0 |
| 01/08/2023 18:10 | 02/08/2023 00:10 | 83  | 29.2 | 18 | 794.5 | 0 |
| 01/08/2023 18:00 | 02/08/2023 00:00 | 58  | 29.5 | 17 | 794.6 | 0 |
| 01/08/2023 17:50 | 01/08/2023 23:50 | 59  | 30.1 | 17 | 794.7 | 0 |
| 01/08/2023 17:40 | 01/08/2023 23:40 | 98  | 30.4 | 17 | 794.7 | 0 |
| 01/08/2023 17:30 | 01/08/2023 23:30 | 53  | 30.1 | 17 | 794.7 | 0 |
| 01/08/2023 17:20 | 01/08/2023 23:20 | 37  | 30.7 | 17 | 794.7 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 01/08/2023 17:10 | 01/08/2023 23:10 | 75  | 30.7 | 17 | 794.8 | 0 |
| 01/08/2023 17:00 | 01/08/2023 23:00 | 36  | 30.7 | 16 | 794.8 | 0 |
| 01/08/2023 16:50 | 01/08/2023 22:50 | 56  | 30.6 | 16 | 794.9 | 0 |
| 01/08/2023 16:40 | 01/08/2023 22:40 | 48  | 30.8 | 17 | 795   | 0 |
| 01/08/2023 16:30 | 01/08/2023 22:30 | 61  | 31.3 | 17 | 794.9 | 0 |
| 01/08/2023 16:20 | 01/08/2023 22:20 | 89  | 31.4 | 17 | 795   | 0 |
| 01/08/2023 16:10 | 01/08/2023 22:10 | 92  | 31.4 | 17 | 795.1 | 0 |
| 01/08/2023 16:00 | 01/08/2023 22:00 | 95  | 31   | 18 | 795.1 | 0 |
| 01/08/2023 15:50 | 01/08/2023 21:50 | 42  | 31.3 | 19 | 795.1 | 0 |
| 01/08/2023 15:40 | 01/08/2023 21:40 | 56  | 30.6 | 19 | 795.2 | 0 |
| 01/08/2023 15:30 | 01/08/2023 21:30 | 61  | 31.4 | 17 | 795.2 | 0 |
| 01/08/2023 15:20 | 01/08/2023 21:20 | 85  | 31.6 | 16 | 795.3 | 0 |
| 01/08/2023 15:10 | 01/08/2023 21:10 | 103 | 31.2 | 17 | 795.4 | 0 |
| 01/08/2023 15:00 | 01/08/2023 21:00 | 88  | 31.1 | 18 | 795.4 | 0 |
| 01/08/2023 14:50 | 01/08/2023 20:50 | 92  | 30.5 | 19 | 795.5 | 0 |
| 01/08/2023 14:40 | 01/08/2023 20:40 | 54  | 30.2 | 20 | 795.6 | 0 |
| 01/08/2023 14:30 | 01/08/2023 20:30 | 68  | 30.8 | 18 | 795.7 | 0 |
| 01/08/2023 14:20 | 01/08/2023 20:20 | 81  | 30.8 | 18 | 795.8 | 0 |
| 01/08/2023 14:10 | 01/08/2023 20:10 | 133 | 30.5 | 18 | 795.9 | 0 |
| 01/08/2023 14:00 | 01/08/2023 20:00 | 82  | 30.2 | 17 | 796   | 0 |
| 01/08/2023 13:50 | 01/08/2023 19:50 | 71  | 30   | 17 | 796   | 0 |
| 01/08/2023 13:40 | 01/08/2023 19:40 | 52  | 29.6 | 19 | 796.1 | 0 |
| 01/08/2023 13:30 | 01/08/2023 19:30 | 38  | 29.3 | 20 | 796.2 | 0 |
| 01/08/2023 13:20 | 01/08/2023 19:20 | 82  | 29.5 | 18 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 13:10 | 01/08/2023 19:10 | 65  | 29.8 | 18 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 13:00 | 01/08/2023 19:00 | 100 | 29.7 | 21 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 12:50 | 01/08/2023 18:50 | 110 | 29.3 | 23 | 796.5 | 0 |
| 01/08/2023 12:40 | 01/08/2023 18:40 | 78  | 29.3 | 22 | 796.5 | 0 |
| 01/08/2023 12:30 | 01/08/2023 18:30 | 96  | 29.6 | 21 | 796.4 | 0 |
| 01/08/2023 12:20 | 01/08/2023 18:20 | 82  | 29   | 22 | 796.5 | 0 |
| 01/08/2023 12:10 | 01/08/2023 18:10 | 67  | 28.8 | 22 | 796.6 | 0 |
| 01/08/2023 12:00 | 01/08/2023 18:00 | 92  | 28.6 | 21 | 796.7 | 0 |
| 01/08/2023 11:50 | 01/08/2023 17:50 | 113 | 28.2 | 24 | 796.8 | 0 |
| 01/08/2023 11:40 | 01/08/2023 17:40 | 57  | 27.8 | 25 | 796.8 | 0 |
| 01/08/2023 11:30 | 01/08/2023 17:30 | 96  | 28.6 | 24 | 796.8 | 0 |
| 01/08/2023 11:20 | 01/08/2023 17:20 | 130 | 28.6 | 24 | 796.8 | 0 |
| 01/08/2023 11:10 | 01/08/2023 17:10 | 86  | 28.2 | 26 | 797   | 0 |
| 01/08/2023 11:00 | 01/08/2023 17:00 | 115 | 28.3 | 25 | 797   | 0 |
| 01/08/2023 10:50 | 01/08/2023 16:50 | 126 | 28.3 | 25 | 797.1 | 0 |
| 01/08/2023 10:40 | 01/08/2023 16:40 | 111 | 27.6 | 27 | 797.1 | 0 |
| 01/08/2023 10:30 | 01/08/2023 16:30 | 78  | 27   | 29 | 797.1 | 0 |
| 01/08/2023 10:20 | 01/08/2023 16:20 | 60  | 26.8 | 30 | 797.2 | 0 |
| 01/08/2023 10:10 | 01/08/2023 16:10 | 78  | 26.4 | 31 | 797.3 | 0 |
| 01/08/2023 10:00 | 01/08/2023 16:00 | 68  | 26.3 | 31 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 09:50 | 01/08/2023 15:50 | 86  | 25.7 | 32 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 09:40 | 01/08/2023 15:40 | 59  | 25.2 | 33 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 09:30 | 01/08/2023 15:30 | 95  | 24.4 | 35 | 797.4 | 0 |

|                  |                  |     |      |    |       |   |
|------------------|------------------|-----|------|----|-------|---|
| 01/08/2023 09:20 | 01/08/2023 15:20 | 179 | 23.1 | 37 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 09:10 | 01/08/2023 15:10 | 182 | 21.7 | 39 | 797.5 | 0 |
| 01/08/2023 09:00 | 01/08/2023 15:00 | 157 | 20.5 | 42 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 08:50 | 01/08/2023 14:50 | 225 | 19.2 | 43 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 08:40 | 01/08/2023 14:40 | 194 | 18.2 | 43 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 08:30 | 01/08/2023 14:30 | 129 | 17.2 | 44 | 797.4 | 0 |
| 01/08/2023 08:20 | 01/08/2023 14:20 | 200 | 15.9 | 44 | 797.3 | 0 |
| 01/08/2023 08:10 | 01/08/2023 14:10 | 252 | 14.2 | 49 | 797.3 | 0 |
| 01/08/2023 08:00 | 01/08/2023 14:00 | 289 | 12.9 | 54 | 797.2 | 0 |
| 01/08/2023 07:50 | 01/08/2023 13:50 | 269 | 11.8 | 56 | 797.2 | 0 |
| 01/08/2023 07:40 | 01/08/2023 13:40 | 264 | 10.9 | 59 | 797.1 | 0 |
| 01/08/2023 07:30 | 01/08/2023 13:30 | 248 | 10.1 | 61 | 797.1 | 0 |
| 01/08/2023 07:20 | 01/08/2023 13:20 | 76  | 9.6  | 62 | 797.1 | 0 |
| 01/08/2023 07:10 | 01/08/2023 13:10 | 315 | 9.2  | 62 | 797   | 0 |
| 01/08/2023 07:00 | 01/08/2023 13:00 | 100 | 8.9  | 63 | 796.9 | 0 |
| 01/08/2023 06:50 | 01/08/2023 12:50 | 243 | 8.9  | 62 | 796.8 | 0 |
| 01/08/2023 06:40 | 01/08/2023 12:40 | 101 | 9    | 62 | 796.7 | 0 |
| 01/08/2023 06:30 | 01/08/2023 12:30 | 62  | 9.1  | 61 | 796.6 | 0 |
| 01/08/2023 06:20 | 01/08/2023 12:20 | 79  | 9.2  | 61 | 796.7 | 0 |
| 01/08/2023 06:10 | 01/08/2023 12:10 | 268 | 9.3  | 61 | 796.6 | 0 |
| 01/08/2023 06:00 | 01/08/2023 12:00 | 73  | 9.5  | 60 | 796.6 | 0 |
| 01/08/2023 05:50 | 01/08/2023 11:50 | 108 | 9.6  | 59 | 796.5 | 0 |
| 01/08/2023 05:40 | 01/08/2023 11:40 | 68  | 9.6  | 59 | 796.5 | 0 |
| 01/08/2023 05:30 | 01/08/2023 11:30 | 201 | 9.4  | 60 | 796.4 | 0 |
| 01/08/2023 05:20 | 01/08/2023 11:20 | 247 | 9.6  | 59 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 05:10 | 01/08/2023 11:10 | 57  | 9.5  | 59 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 05:00 | 01/08/2023 11:00 | 99  | 9.4  | 60 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 04:50 | 01/08/2023 10:50 | 56  | 9.5  | 59 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 04:40 | 01/08/2023 10:40 | 99  | 9.5  | 60 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 04:30 | 01/08/2023 10:30 | 235 | 9.7  | 58 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 04:20 | 01/08/2023 10:20 | 89  | 9.7  | 59 | 796.2 | 0 |
| 01/08/2023 04:10 | 01/08/2023 10:10 | 217 | 9.6  | 60 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 04:00 | 01/08/2023 10:00 | 231 | 9.8  | 59 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 03:50 | 01/08/2023 09:50 | 97  | 10   | 58 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 03:40 | 01/08/2023 09:40 | 82  | 10.2 | 58 | 796.4 | 0 |
| 01/08/2023 03:30 | 01/08/2023 09:30 | 96  | 10.2 | 58 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 03:20 | 01/08/2023 09:20 | 90  | 10.4 | 58 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 03:10 | 01/08/2023 09:10 | 150 | 10.6 | 57 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 03:00 | 01/08/2023 09:00 | 51  | 10.7 | 57 | 796.3 | 0 |
| 01/08/2023 02:50 | 01/08/2023 08:50 | 131 | 10.8 | 57 | 796.4 | 0 |
| 01/08/2023 02:40 | 01/08/2023 08:40 | 111 | 11   | 56 | 796.4 | 0 |
| 01/08/2023 02:30 | 01/08/2023 08:30 | 150 | 11.2 | 55 | 796.5 | 0 |
| 01/08/2023 02:20 | 01/08/2023 08:20 | 87  | 11.3 | 54 | 796.6 | 0 |
| 01/08/2023 02:10 | 01/08/2023 08:10 | 110 | 11.4 | 54 | 796.7 | 0 |
| 01/08/2023 02:00 | 01/08/2023 08:00 | 12  | 11.6 | 54 | 796.7 | 0 |
| 01/08/2023 01:50 | 01/08/2023 07:50 | 120 | 11.8 | 54 | 796.7 | 0 |
| 01/08/2023 01:40 | 01/08/2023 07:40 | 159 | 12   | 53 | 796.7 | 0 |

|                                   |     |      |    |       |     |
|-----------------------------------|-----|------|----|-------|-----|
| 01/08/2023 01:30 01/08/2023 07:30 | 94  | 12.1 | 52 | 796.8 | 0   |
| 01/08/2023 01:20 01/08/2023 07:20 | 30  | 12.1 | 52 | 796.9 | 0   |
| 01/08/2023 01:10 01/08/2023 07:10 | 120 | 12.2 | 53 | 796.8 | 0   |
| 01/08/2023 01:00 01/08/2023 07:00 | 64  | 12.4 | 52 | 796.9 | 0   |
| 01/08/2023 00:50 01/08/2023 06:50 | 66  | 12.6 | 51 | 796.9 | 0   |
| 01/08/2023 00:40 01/08/2023 06:40 | 150 | 12.9 | 50 | 796.9 | 0   |
| 01/08/2023 00:30 01/08/2023 06:30 | 77  | 13.3 | 49 | 796.9 | 0.2 |
| 01/08/2023 00:20 01/08/2023 06:20 | 74  | 13.6 | 48 | 796.9 | 0   |
| 01/08/2023 00:10 01/08/2023 06:10 | 79  | 13.9 | 47 | 797   | 0.2 |
| 01/08/2023 00:00 01/08/2023 06:00 | 59  | 14.2 | 47 | 797   | 0.2 |
